

地方公共団体における平準化の推進

さしすせそ事例集 【第4版】

令和2年4月

土地・建設産業局建設業課
大臣官房技術調査課

- 公共工事においては、年度内の時期に応じて工事量の繁閑に大きな差が生じるため、受注する建設企業の人材や資機材の効率的な活用に支障があるなど、様々な弊害を生じています。
- 政府全体において働き方改革が推進され、令和6年度から建設業にも労働時間規制が本格適用される中、昨年6月に新・担い手3法が成立し、公共工事の品質の確保の促進に関する法律（以下、品確法という。）において施工時期の平準化が発注者責務として明記されるとともに、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下、入契法という。）においても平準化について規定され、平準化の取組が地方公共団体等の努力義務とされました。
- 国土交通省では、これまでも施工時期の平準化に関する取組を推進し、地方公共団体による平準化の好事例を共有するため、平成28年4月、「地方公共団体における平準化の取組事例について ～平準化の先進事例「さしすせそ」～」を作成・公表し、順次改訂を行いながら、地方公共団体の皆様に活用していただいています（平成29年3月（第2版）、平成30年5月（第3版））。
- 全国の地方公共団体に広く平準化の取組が浸透していくためには、入札契約の実務に携わる各地方公共団体の担当者の皆様に、債務負担行為の活用など、先行的に取組がなされている自治体を参考にいただくことが重要です。
- 今回の改訂では、全国の地方公共団体における平準化の取組の「見える化」を行ったことを踏まえ、その内容も踏まえて、さらなる事例等の充実を図りました。
- 国土交通省においては、今後も毎年度、取組状況等の見える化を行いながら、地方公共団体の取組の推進を図る方針です。各地方公共団体におかれましては、発注・施工時期等の平準化に向けた取組を進めるため、この事例集を積極的に活用して頂き、平準化の推進に取り組んでいただければ幸いです。

1. 平準化の概要 3

- 施工時期の平準化 対策の必要性／意義／効果 3
- 平準化の促進に向けた取組(『さ・し・す・せ・そ』の推進) 6
- これまでの経緯／国交省における取組
／対策の進め方／具体的な取組状況 7
- 平準化推進の進め方 11
- 平準化率の状況 (都道府県) 12
- 市区町村における平準化率の分布状況 (地域別／都道府県別) 13

2. 債務負担行為の活用 15

- 工期1年未満の工事における債務負担行為の活用 21
(都道府県・指定都市／市区／町村)
- ゼロ債務負担行為を積極的に活用している地方公共団体 25
(都道府県・指定都市／市区／町村)
- 交付金事業等で積極的に設定している地方公共団体 28
(都道府県・指定都市／市区／町村)

3. 柔軟な工期設定 (余裕期間制度の活用) 30

- 柔軟な工期の設定 (余裕期間制度の活用) 32
(都道府県・指定都市／市区)

4. 速やかな繰越手続 36

- 速やかな繰越手続 38
(都道府県・指定都市／市区／町村)

5. 積算の前倒し 40

- 積算の前倒し 42
(都道府県・指定都市／市区／町村)

6. 早期執行のための目標設定等 43


- 上半期の執行率等の目標設定 44
(都道府県・指定都市／市区)
- 発注見通しの公表 45
(市区)

(参考資料) 46

- 公共工事においては、年度内の時期において、工事量の繁閑に大きな差が生じるため、受注する建設企業の人材や資機材の効率的な活用等に支障が生じています。
- 年度内の工事量を平準化することにより、経営の安定化や、人材・資機材の効率的な運用を図ることが必要です。

(単位：百万円)

公共工事における工事出来高の状況

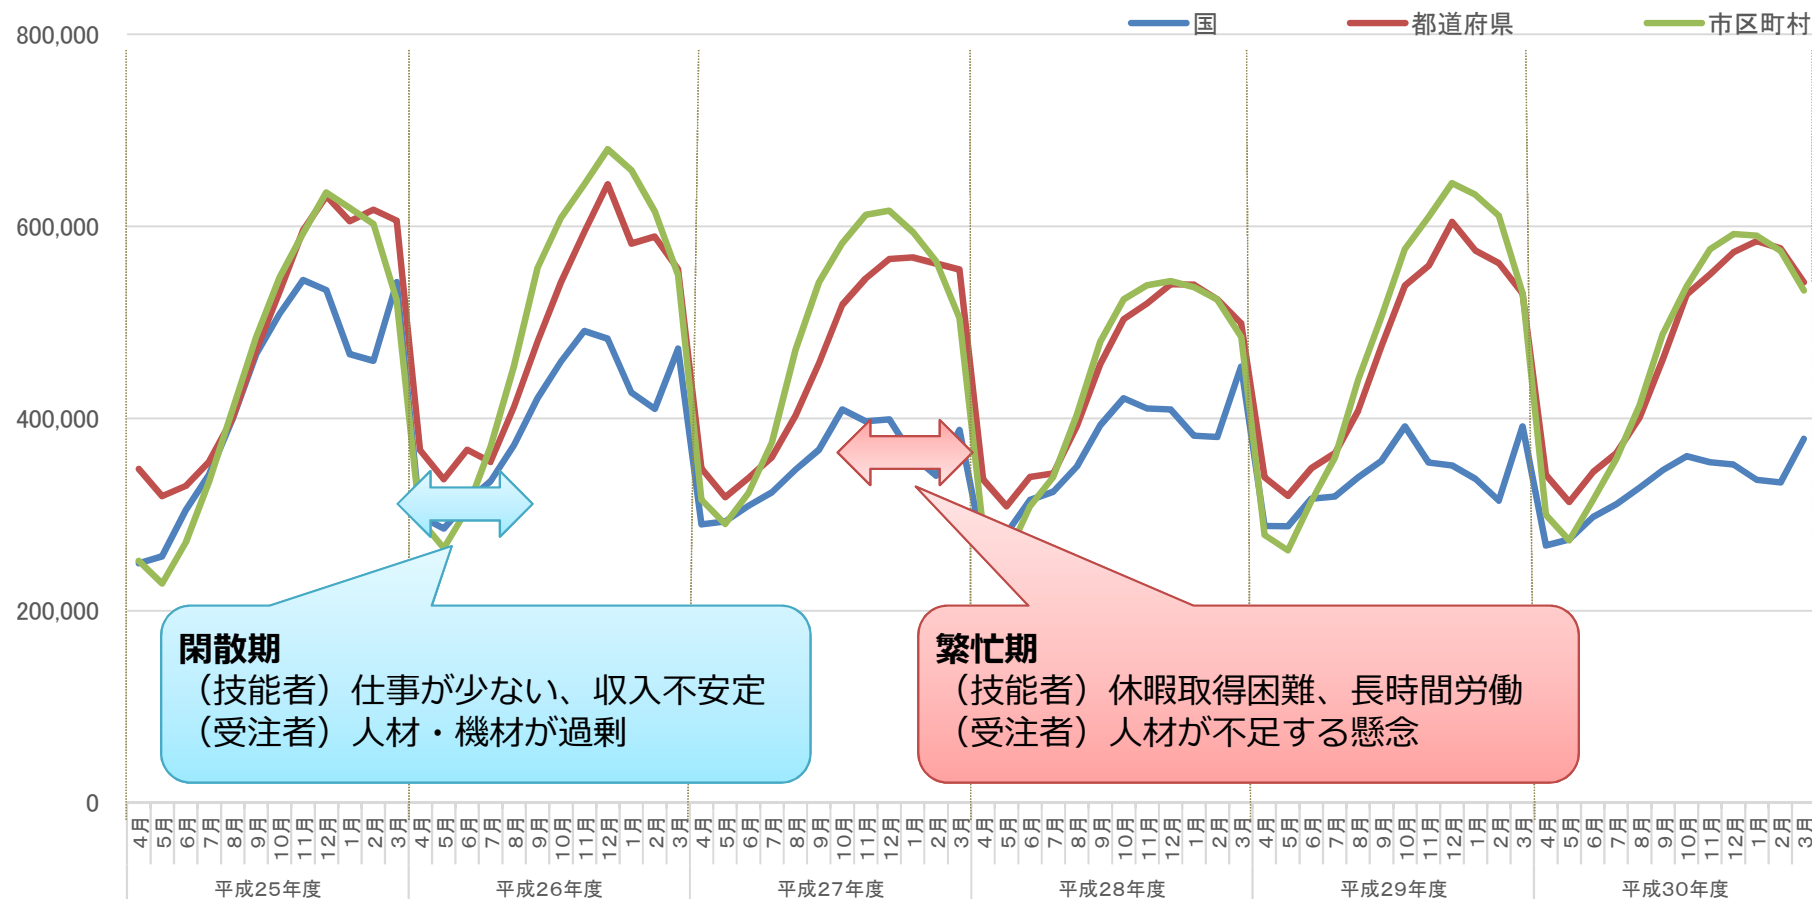

閑散期
 (技能者) 仕事が少ない、収入不安定
 (受注者) 人材・機材が過剰

繁忙期
 (技能者) 休暇取得困難、長時間労働
 (受注者) 人材が不足する懸念

- 政府全体において働き方改革が推進され、令和6年度から建設業にも労働時間規制が本格適用される中、昨年6月に新・担い手3法が成立し、品確法において施工時期の平準化が発注者責務として明記されるとともに、入契法においても平準化について規定され、平準化の取組が地方公共団体等の努力義務とされました。
- 公共工事については、通常、予算の単年度主義に基づき、年度ごとの予算により事業執行を行っていることから、年度初めに工事量が少なくなる一方、年度の半ばから後半にかけて工事量が多くなる傾向にあります。
- 工事量の繁閑に大きな差が生じることで、工事の閑散期である4-6月においては、仕事が不足し、公共工事の従事者の処遇に悪影響が出る可能性が懸念される一方、繁忙期である1-3月においては、仕事量が増大することにより、公共工事の従事者の長時間労働や休暇取得への支障などに繋がります。
- また、資機材についても、閑散期には余剰が生じ、繁忙期には資機材の需要が高く、円滑な調達が困難になる等の弊害が見受けられます。
- そのため、「施工時期の平準化」により、年度内の工事量の繁閑の差をできるだけ小さくし、年間を通した工事量が安定すれば、
 - ・受注者として人材・資機材の実働日数の向上による経営の健全化、労働者の処遇改善等
 - ・建設業で働く技能者として長時間労働の是正、休日の確保等
 - ・発注者として入札の不調・不落対策、担い手確保等
 - ・行政（地域）として地域の社会資本の品質確保、建設機械の保有促進による災害への対応力向上等
 が効果として期待されます。

建設業者（受注者）に期待される効果

- 年間を通じた安定的な工事の実施による経営安定化
- 人材や資機材の実働日数の向上や効率的な運用
- 稼働率の向上による機械保有等の促進

技能者に期待される効果

- 繁忙期への工事集中を回避することによる長時間労働の是正や休日の確保等の処遇改善
- 仕事量が安定することによる日給月給で働く技能労働者の安定的な雇用の確保、給与の安定

発注者に期待される効果

- 入札不調・不落の抑制など、安定的な施工の確保
- 中長期的な公共工事の担い手の確保
- 繁閑の差が解消されることによる発注担当職員等の事務作業の負担軽減

行政（地域）に期待される効果

- 建設業者の経営安定化により、地域の社会資本の品質確保が見込まれる
- 建設機械の保有が促進されることによる災害への対応力の向上
- 年度末の工事集中の回避

○平準化を進めるに当たっては、以下の㊥～㊸の取組が有効であると考えられます。

- ㊥ 債務負担行為の活用、㊦ 柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用）、㊧ 速やかな繰越手続
- ㊨ 積算の前倒し、㊩ 早期執行のための目標設定（執行率等の設定、発注見通しの公表）

債務負担行為の活用（さ）

- 債務負担行為を活用して複数の年度にまたがる契約を行うことにより、年度当初の閑散期（4月～6月）においても工事の施工が可能になり、施工時期の平準化につながります。
- 通常、大規模な工事で工期が複数年にわたる場合は、債務負担行為を設定することにより、複数年にわたる契約が締結されますが、工期が12ヶ月未満の工事でも、債務負担行為を設定することにより、年度をまたいだ契約を行うことが可能になります。
- また、ゼロ債務負担行為※を設定することにより、次年度当初から工事に着手でき、出水期までに施工が必要な工事などへの対応が可能になります。 ※主に補正予算で、年度内に契約まで済ませるが、支払いはゼロである債務負担行為

柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用）（し）

- 余裕期間制度の活用により、例えば、受注者が工事開始日や工期末を選択しやすくなるなど、受注者は人材や資機材の調整を行いやすくなるため、工事の円滑な施工が見込まれます。

速やかな繰越手続（す）

- 悪天候や用地の関係など、年度内に支出が終わらないやむを得ない事由が発生した場合には、年度末を待つことなく、速やかに繰越手続を開始することにより、受注者は、年度内の完成を早期に見直すことができ、余裕をもって人材・資機材のやりくりを行えるようになります。

積算の前倒し（せ）

- 発注前年度のうちに設計・積算までを完了させることにより、発注年度当初に積算単価を更新するだけで速やかに発注手続を行うことができます。

早期執行のための目標設定（執行率等の設定、発注見通しの公表）（そ）

- 年度末に工期末が集中しないよう上半期（特に4～6月）の執行率（契約率）の目標を設定し早期発注を目指します。
- 発注の見通しの公表により、受注者が人材や資機材を計画的に準備でき、円滑な施工が見込まれます。

これまでの経緯

- H26.6 ・品確法において、発注者の責務として「計画的に発注を行うとともに、適切な工期を設定するよう努めること。」が規定

- H27.1 ・品確法第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針(以下、運用指針という。)」において、発注者に対し、施工時期の平準化に努めることを規定

- R1.6 ・改正品確法において、発注者の責務として、「公共工事等の実施の時期の平準化」を規定
 ・改正入契法において、公共工事の発注者に施工時期の平準化のための方策を講ずることを「努力義務化」

- R1.10 ・改正品確法の理念を現場で実現するため、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針を改正し、施工時期の平準化に向けた債務負担行為の活用等による、翌年度にわたる工期設定等を明記

- R1.10 ・改正入契法に基づく公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針を改正し、債務負担行為の積極的な活用をはじめ、平準化の更なる取組を明記。それを踏まえ、総務省と連名で都道府県、市区町村に対し取組を要請

- R2.1 ・改正品確法に基づき、発注者共通の指針である運用指針を改定し、平準化の取組強化を位置づけ

- 適正な工期を確保するため、国庫債務負担行為(2か年国債やゼロ国債)を活用すること等により、公共工事の施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。
- これにより、閑散期の工事稼働件数は下図の通り改善傾向にあり、国交省直轄工事での平準化率は約9割に達している。
- 引き続き国庫債務負担行為の活用、発注見通しの統合・公表の参加団体を拡大。

①国庫債務負担行為の積極的活用

適正な工期を確保するための国庫債務負担行為(2か年国債^(注1)及びゼロ国債^(注2))を設定し、閑散期の工事稼働を改善

〈2ヶ年国債+当初予算におけるゼロ国債〉

令和2年度予算:約3,200億円 (平成31年度:約3,200億円)

※平成29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定(業務についても平成31年度から新たに設定)

※令和2年度予算の内訳は、2ヶ年国債 約2,000億円、ゼロ国債 約1,200億円(業務含む)

②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大

全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを統合し、とりまとめ版を公表する取組の参加団体を拡大


※参加状況の推移:平成29年3月時点:約500団体(約25%)→令和2年3月時点:1960団体(約98%)
 国、特殊法人等:205/213、都道府県:47/47、指定都市:20/20、市区町村:1674/1722(令和元年11月時点)

③地方公共団体等への働きかけ

地域発注者協議会等を通じて、自治体ごとの平準化の進捗や取組状況の見える化を図るとともに、取組の進んでいない自治体に対して直接ヒアリングなども行いながら、継続的にフォローアップを実施

注1:国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て後年度に亘って債務を負担(契約)することができる制度であり、2か年度に亘るものを2か年国債という。

注2:国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を行うが国費の支出は翌年度のもの。

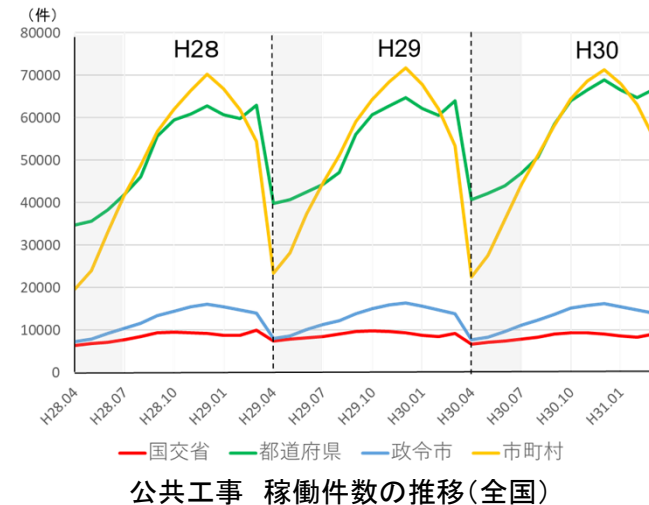

[各地区のページ] (東北地方発注者協議会) 平成25年11月1日現在

※〇〇地区の発注見通し
 〇〇地区とは、〇〇市、〇〇町、〇〇村を含む地区です。

※平成25年11月1日現在の公表(発注)予定の工事数を掲載しています。
 ※予定価格が250万円以上の土木、建築の工事数を掲載しています。
 ※土木・建築以外の工事、機械工事等については、東北地方発注者協議会のみ掲載しています。
 ※下記の発注見通しの発生見直しについては掲載されません。また他に掲載のない発注見通しは工事発注予定ではありません。

発注種別名: 〇〇町、〇〇村
 ※ここに記載する内訳は、平成25年11月1日現在の見直しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
 ※公表している内容等のお問い合わせについては、各発注者へお問い合わせください。

各発注機関の見直し公表ページはこちら(詳細については、こちらをご覧ください。)

発注機関名	発注種別名	工事名称	工事種別(業種)	工事場所(都道府県)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概算	概算工事規模	備考
国土交通省 東北地方 建設局	〇〇 建設局	〇〇新設工事 〇〇道路改良工事	〇〇土木 〇〇土木	〇〇市 〇〇市	〇〇市 〇〇市	〇〇土木 〇〇土木	〇〇市 〇〇市	約〇ヶ月 約〇ヶ月	約〇億円 約〇億円	〇〇㎡ 約〇〇〇〇㎡	〇〇市 〇〇市
〇〇市	〇〇市	〇〇地区津波避難 施設建設工事	〇〇土木	〇〇市	〇〇市	〇〇土木	〇〇市	〇日	〇億円	〇㎡	〇〇市
〇〇市	〇〇市	〇〇地区津波避難 施設建設工事	〇〇土木	〇〇市	〇〇市	〇〇土木	〇〇市	〇日	〇億円	〇㎡	〇〇市

発注見通しの統合・公表のページ(イメージ)

- ・改正品確法において、公共工事の施工時期の平準化が「発注者の責務」として規定
- ・また、入契法で、公共工事の発注者に施工時期の平準化のための方策を講ずることを「努力義務化」

施工時期の平準化の取組が浸透しつつあるが、実施体制やノウハウ不足等を理由に、特に市区町村ではいまだに低い水準であり、更なる平準化の推進が必要

[※平準化率は、国:0.85、都道府県:0.75、市区町村:0.55(H30年度)]

全ての地方公共団体に対し発注者の責務として平準化の取組を進めるよう支援
 まずは一定規模の工事契約件数のある都道府県、人口10万以上の市に対し、重点的に平準化の取組の実施を働きかけ

対策①: 取組事例等の周知徹底

- 施工時期の平準化の意義について、地方公共団体に対し様々な機会を捉え周知徹底
- 地方公共団体による優良事例を周知し、先進的な取組を水平展開(「さしすせそ事例集」の更なる充実・普及)

対策②: 平準化の進捗・取組状況の見える化

- 地方公共団体における平準化の進捗・取組状況を見える化して継続的にフォローアップ

最近の取組

取組等の周知徹底

- 地域発注者協議会(全国10ブロック)を開催し、運用指針改正案として平準化の取組を説明(R1.10～)
- 地域ブロック土木部長会議(全国8ブロック)を開催し、運用指針改正案として平準化の取組を説明(R1.11～)
- 全国8ブロックでブロック監理課長等会議を開催し、各都道府県に対して、来年度に向けた平準化の一層の取組を働きかけるとともに、今後の対応状況等について聴取(R1.11～)

平準化の見える化

- 入契法に基づき、総務省と連名で、全地方公共団体に対して、平準化の進捗及び取組状況の調査を发出し、調査結果を公表(入契調査(R1.11～))

今後の取組

- ブロック監理課長等会議など、各種会議の場で、各地方公共団体に対し、平準化の取組の更なる働きかけ
- 地方公共団体による優良事例を周知し、先進的な取組を水平展開(改訂版「さしすせそ事例集」の普及)
- 地方公共団体における平準化の進捗・取組状況を毎年度公表し、最新状況を見える化しフォローアップ

令和元年10月


11~12月

令和2年 1~3月

4月~

国の取組

地方公共団体の取組

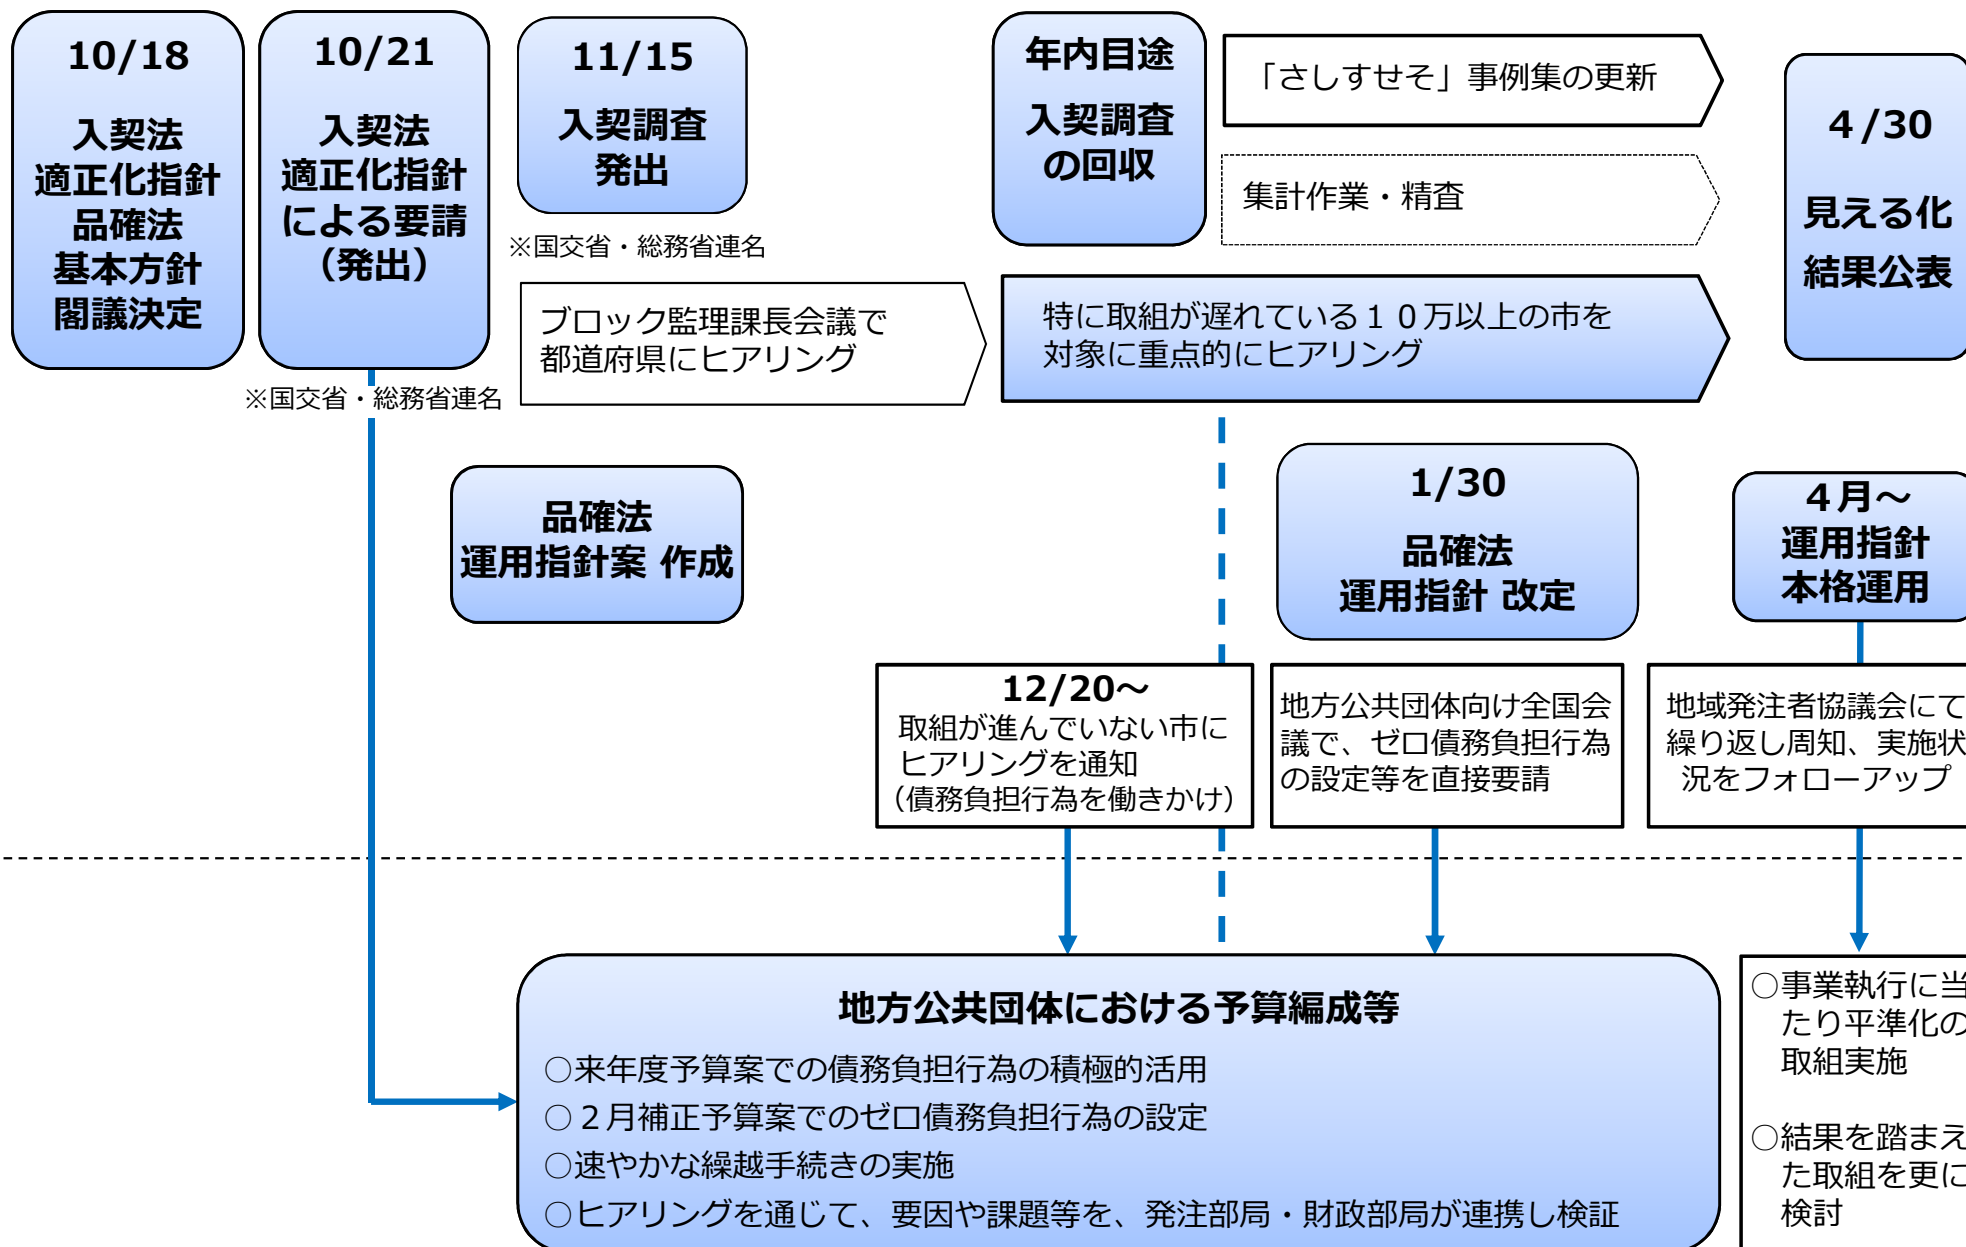


結果を踏まえ更なる取組の推進

平準化率の状況（都道府県）

都道府県の平準化率の状況

- 平準化率 0.8以上
- 平準化率 0.7～0.8
- 平準化率 0.6～0.7
- 平準化率 0.6未満

全国平均(都道府県): 0.75

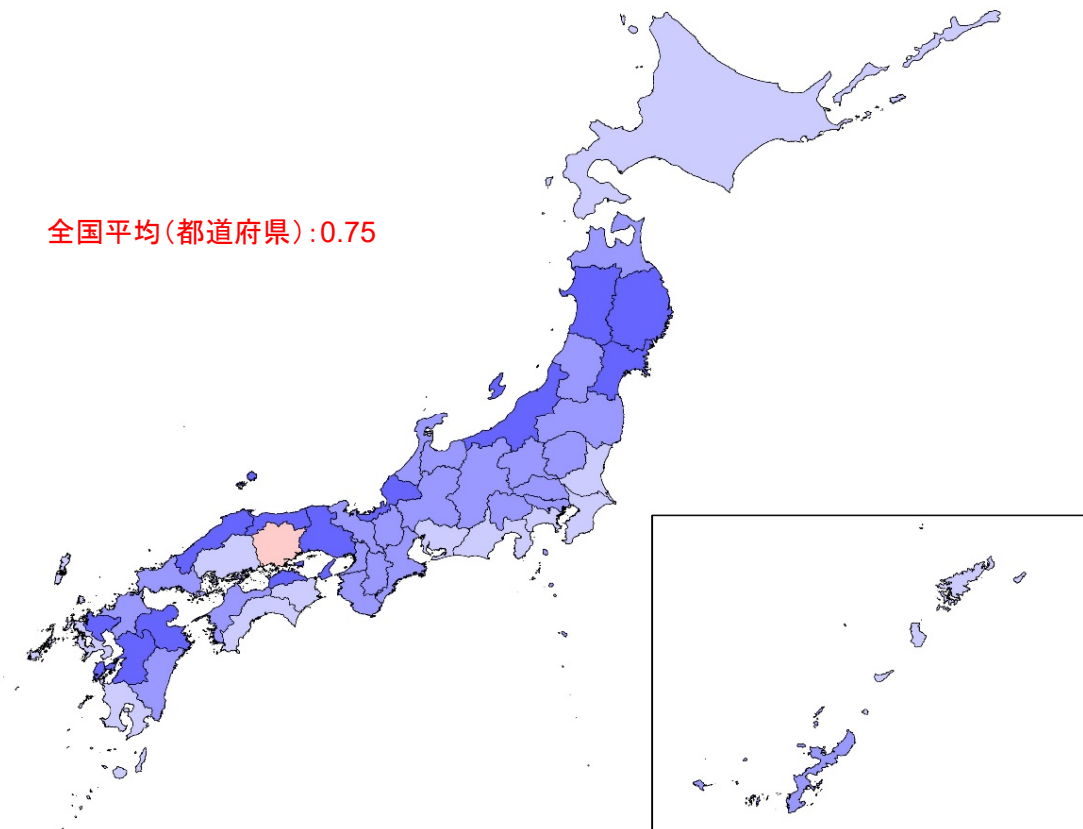

$$\text{平準化率(件数)} = \frac{\text{(4～6月期の工事平均稼働件数)}}{\text{(年度の工事平均稼働件数)}}$$

「一般財団法人日本建設情報総合センターコリンズ・テクリスセンター」登録データを活用

対象: 契約金額500万円以上の工事
稼働件数: 当該月に工期が含まれる工事の件数


都道府県の平準化率一覧

北海道	0.70	栃木県	0.72	石川県	0.71	滋賀県	0.75	岡山県	0.56	佐賀県	0.81
青森県	0.73	群馬県	0.75	福井県	0.84	京都府	0.79	広島県	0.61	長崎県	0.65
岩手県	0.88	埼玉県	0.70	山梨県	0.72	大阪府	0.76	山口県	0.80	熊本県	0.87
宮城県	0.93	千葉県	0.60	長野県	0.80	兵庫県	0.81	徳島県	0.68	大分県	0.87
秋田県	0.84	東京都	0.76	岐阜県	0.78	奈良県	0.77	香川県	0.82	宮崎県	0.76
山形県	0.77	神奈川県	0.64	静岡県	0.67	和歌山県	0.72	愛媛県	0.72	鹿児島県	0.65
福島県	0.76	新潟県	0.88	愛知県	0.66	鳥取県	0.83	高知県	0.63	沖縄県	0.71
茨城県	0.64	富山県	0.79	三重県	0.76	島根県	0.82	福岡県	0.71		

市区町村における平準化率の状況（地域別）

各地域における平準化率別の市区町村の構成割合

平準化率の区分: ■ ~0.4 ■ 0.4~0.5 ■ 0.5~0.6 ■ 0.6~0.7 ■ 0.7~0.8 ■ 0.8~ ※グラフ内の数字は地方公共団体数

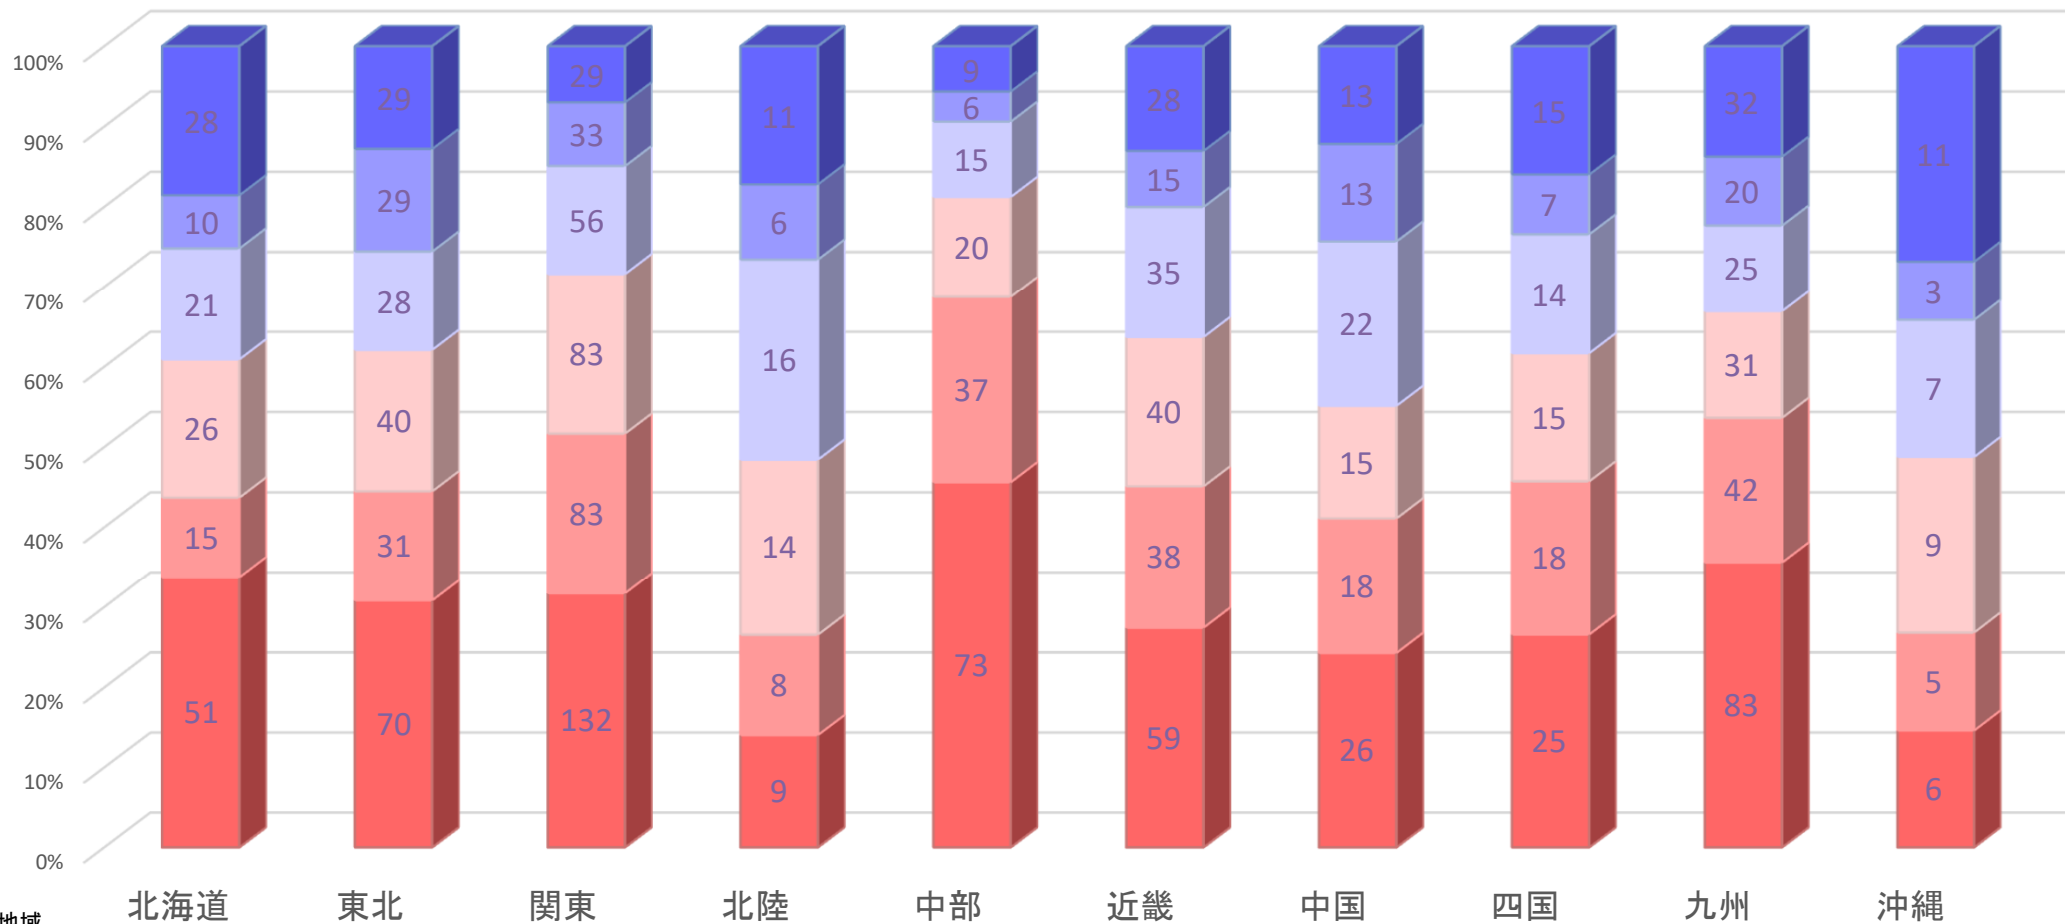

※対象地域

北海道ブロック:北海道
 東北ブロック:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
 関東ブロック:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
 北陸ブロック:新潟県、石川県、富山県
 中部ブロック:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿ブロック:福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
 中国ブロック:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
 四国ブロック:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
 九州ブロック:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
 沖縄ブロック:沖縄県


※平準化率の定義: 4~6月期の工事平均稼働件数/年度の工事平均稼働件数

※平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事(1件当たり500万円以上)を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出(データ抽出時点:令和元年5月18日)(一部未登録の地方公共団体あり)

市区町村における平準化率の状況（都道府県別）

各都道府県における平準化率別の市区町村の構成割合

平準化率の区分: ■ ~0.4 ■ 0.4~0.5 ■ 0.5~0.6 ■ 0.6~0.7 ■ 0.7~0.8 ■ 0.8~ ※グラフ内の数字は地方公共団体数

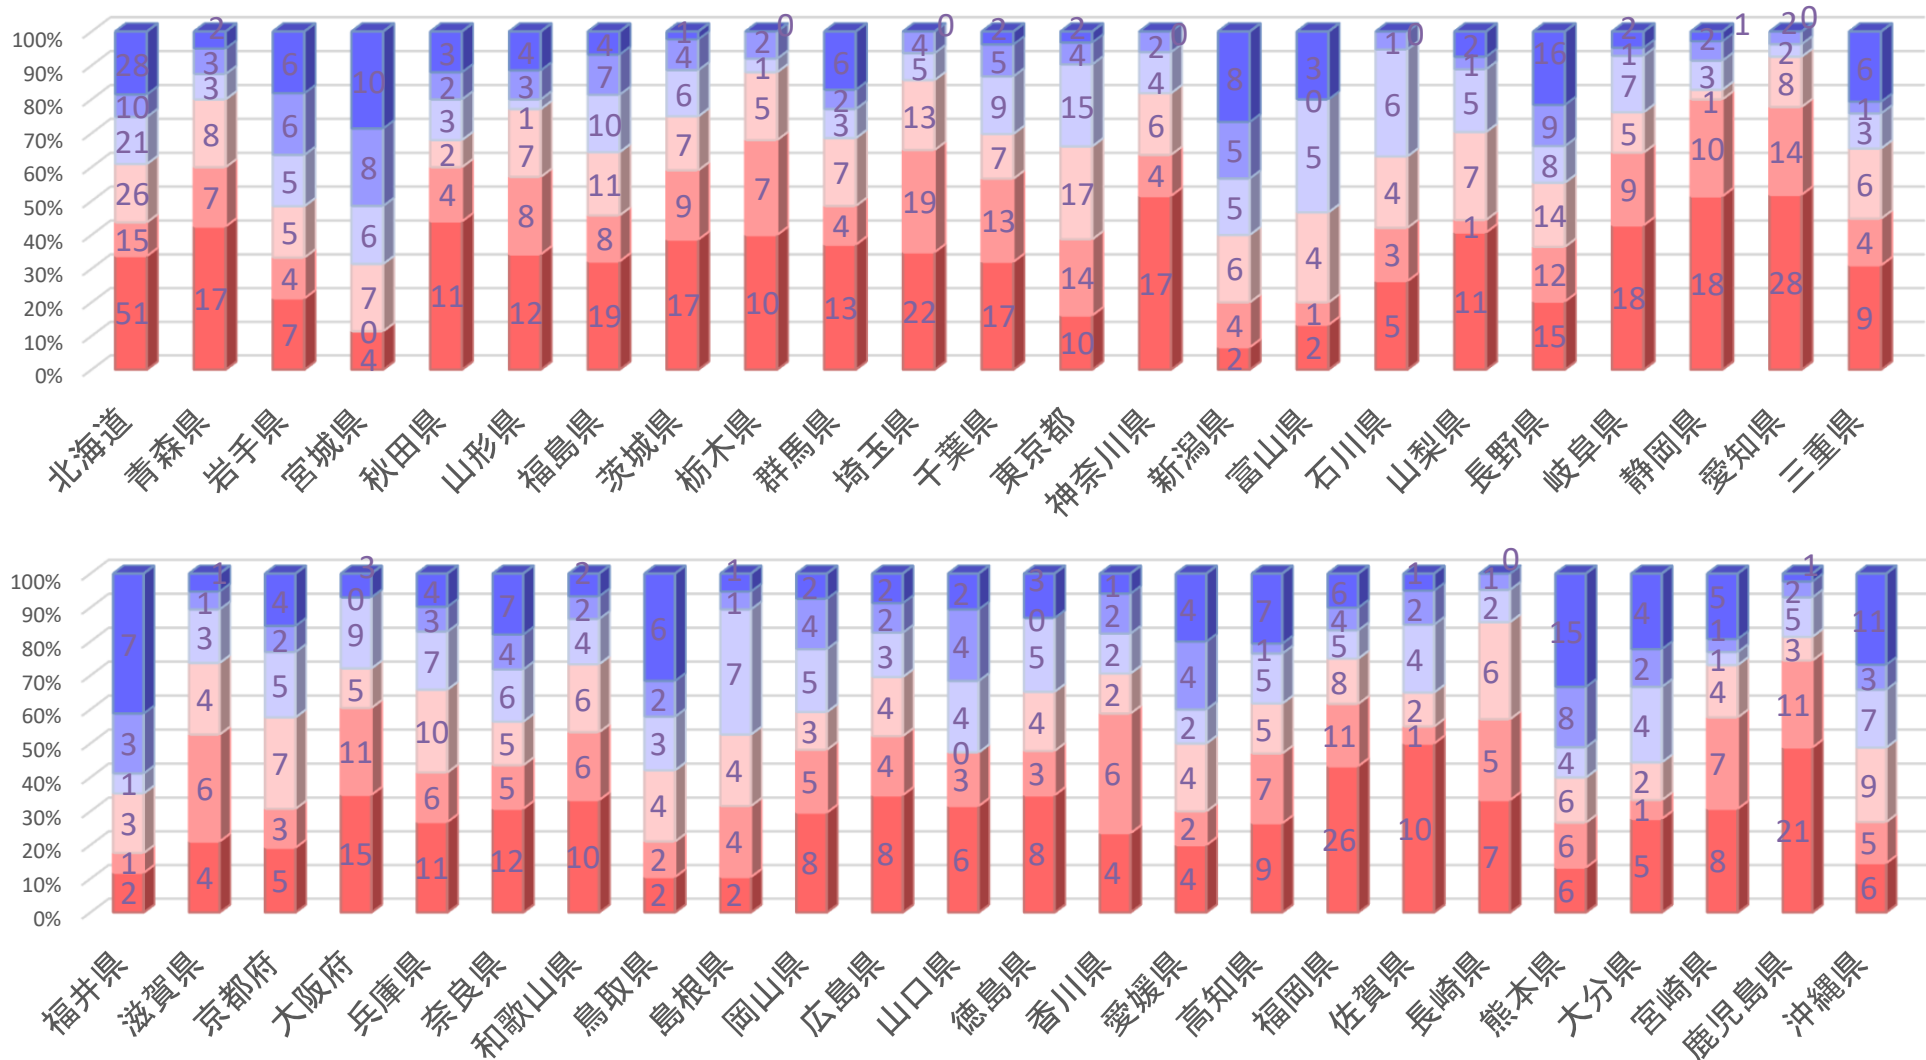


※平準化率の定義: 4~6月期の工事平均稼働件数 / 年度の工事平均稼働件数

※平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事(1件当たり500万円以上)を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出(データ抽出時点: 令和元年5月18日)(一部未登録の地方公共団体あり)

- ①年度末における工事量の集中を回避する観点から、工期が1年以上の公共工事のみならず工期が1年に満たない工事についても2カ年債を設定すること
- ②端境期における受注機会の確保を図る観点から、契約初年度に支出を要さない債務負担行為（いわゆる「ゼロ債務負担行為」）を設定すること

により、工事量の偏りが分散し、平準化に寄与することとなります。

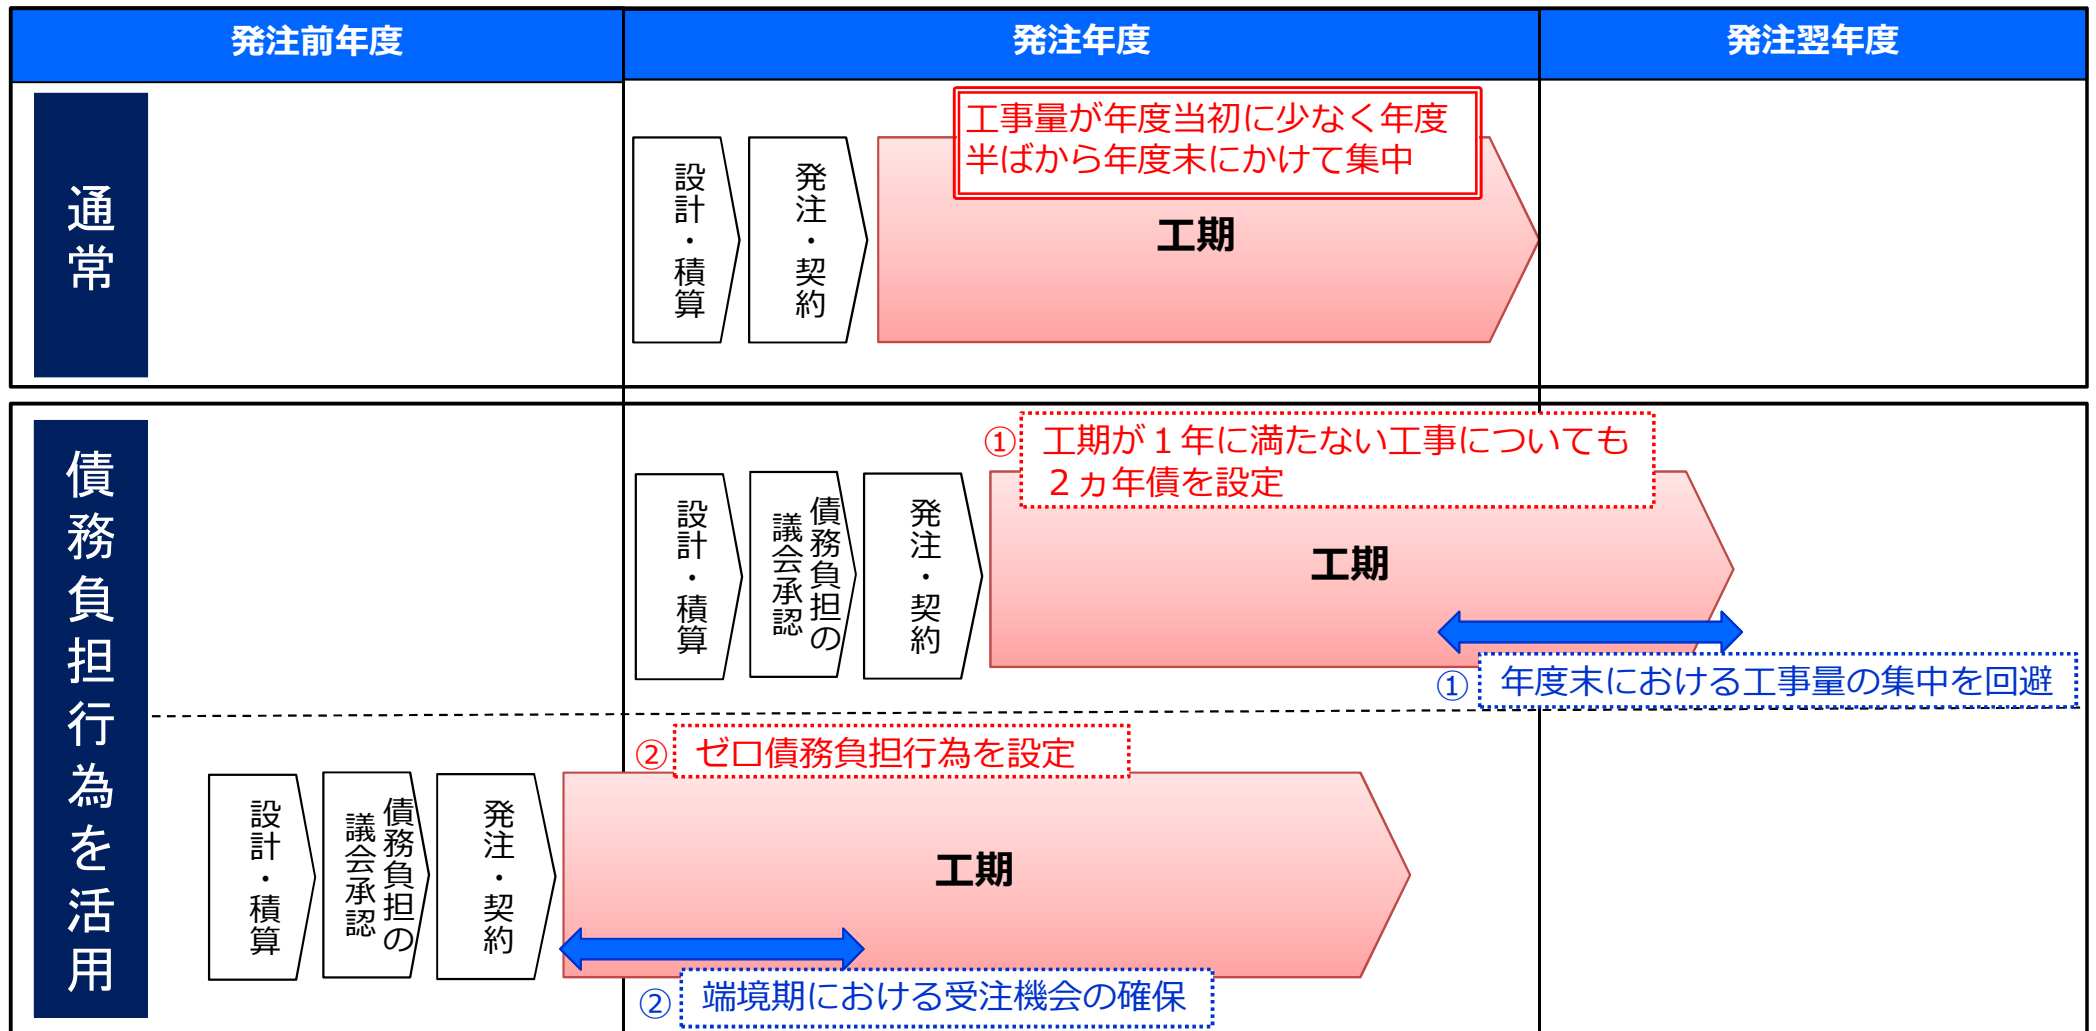

社会資本総合交付金事業における債務負担行為の活用 (H28.2通知)


○事業の平準化を図る観点から、国土交通大臣に提出された社会資本総合整備計画に係る交付金事業において、地方公共団体が債務負担行為を設定し事業を実施することも可能。
 (過年度に設定した債務負担行為の後年度支出分に対し、配分された予算の範囲内で社会資本整備総合交付金等を充てることができる。)

※「施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について」(平成28年2月17日付け総行第41号・国土入企第17号)



【債務負担行為の活用の例】

二カ年県債の活用



単年度で実施

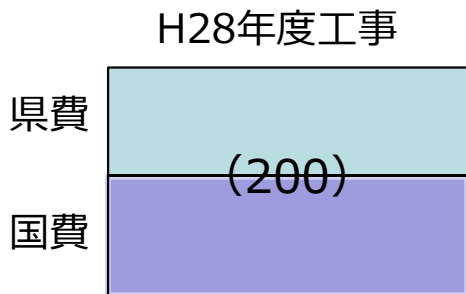


債務負担行為の活用

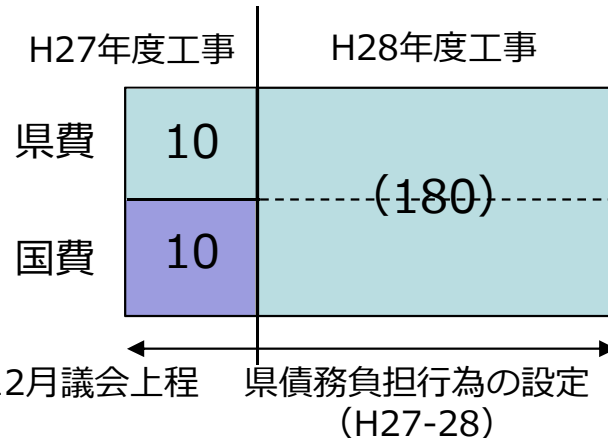



交付金示達後

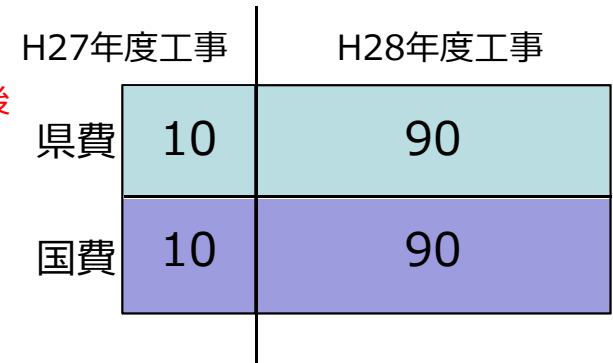

ゼロ県債の活用

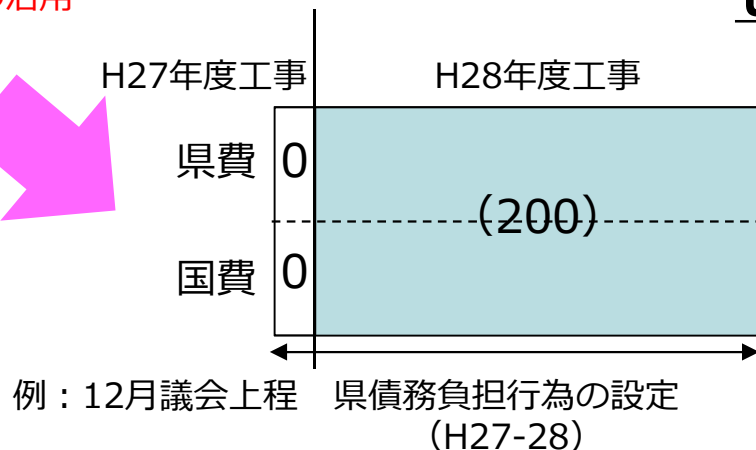

交付金示達後

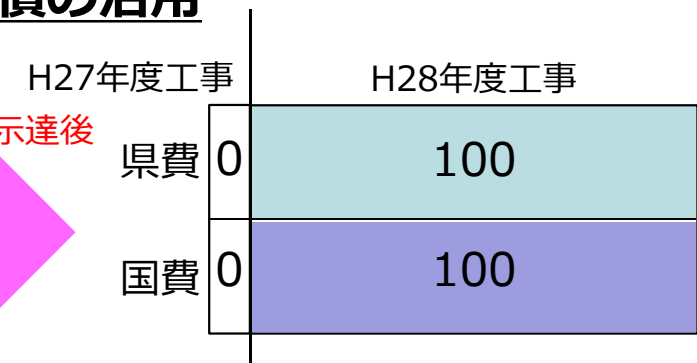


※ 債務負担行為を設定することに対し、交付金の配分を保証するものではない。

平準化に資するための社会資本整備総合交付金事業に係る債務負担行為等の活用 (R2.3 通知)

- 社会資本整備総合整備計画に係る交付金事業については、地方公共団体による債務負担行為の設定 (H28.2通知) のほか、早期着手交付申請や一括設計審査を実施することが可能。
- たとえば、初年度の交付申請時に一括設計審査の承認を受けて交付決定される事業について、地方公共団体による債務負担行為を設定して事業の契約を行い、その後年度支出分について翌年度に早期着手交付申請を活用することは、切れ目ない事業執行のみならず、施工時期の平準化に資する

※「社会資本総合整備計画に係る交付金事業における施工時期の平準化に資するための債務負担行為等の活用について」(令和2年3月31日付け総行第93号・国土入企第55号)

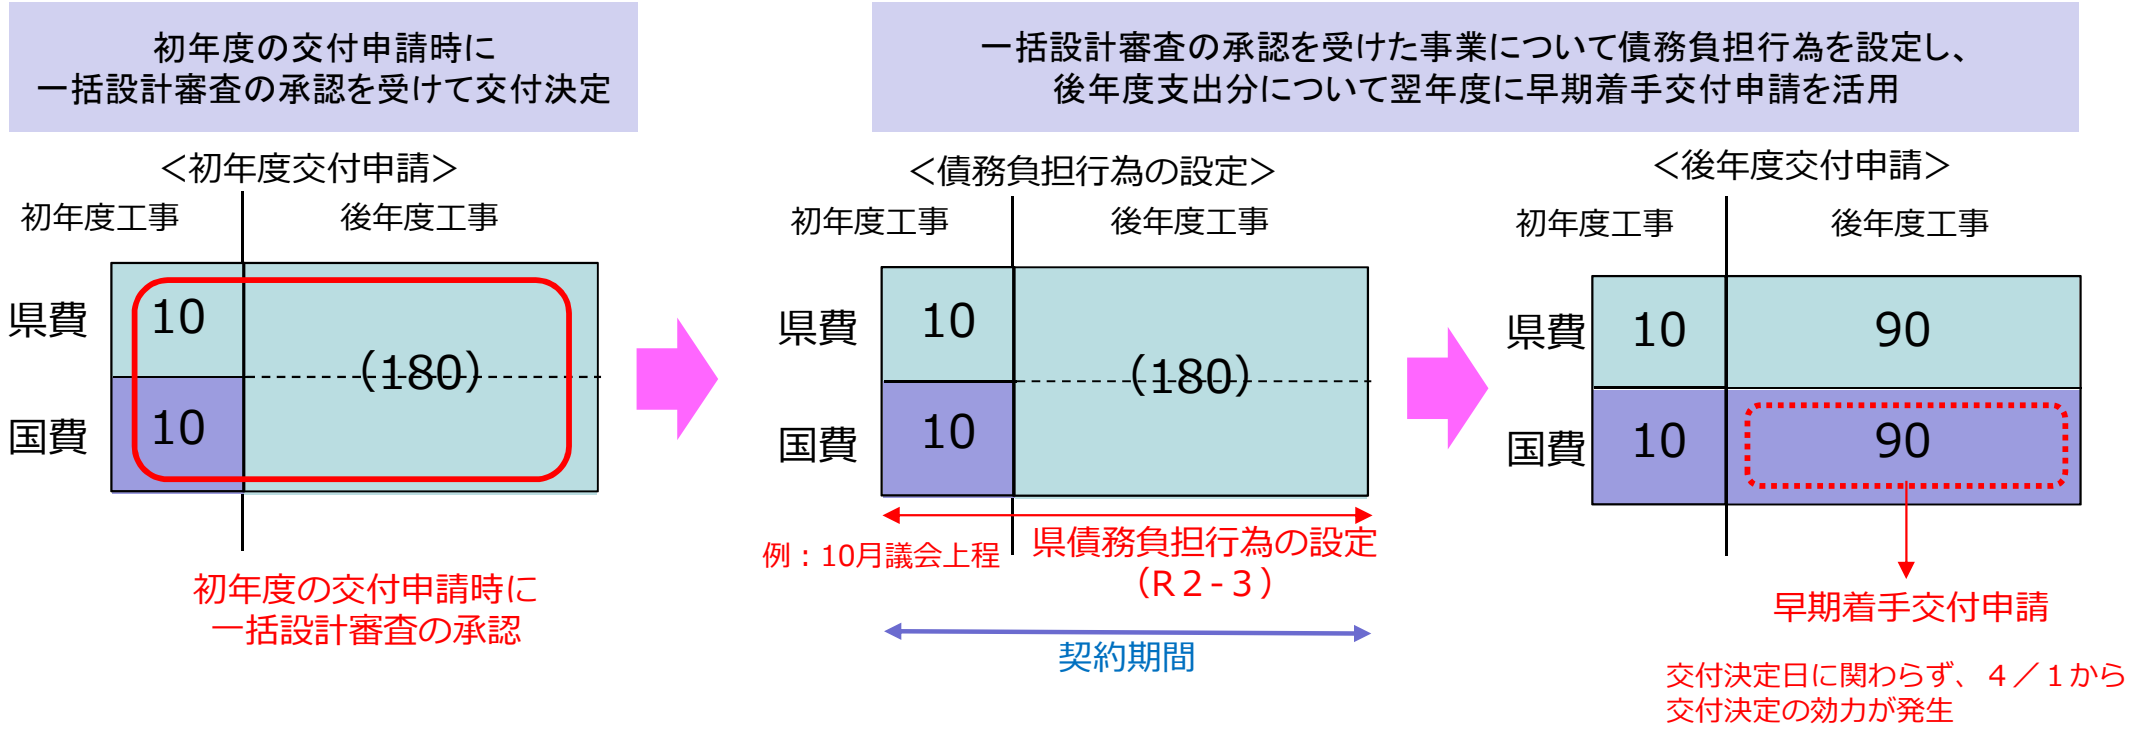

(参考) 一括設計審査

○交付金を充てて施行しようとする要素事業において、施行上設計を分割することが困難なもの等で工事を一括して施行する必要がある、かつ、2か年以上にわたる工事については、初年度にまとめて設計審査を受けることが可能

(参考) 早期着手交付申請




○真にやむをえない理由がある場合には、交付決定日に関わらず、その効力を4月1日から生じさせることが可能

(例) ・一括設計審査の承認を受けている前年度からの継続事業
 ・適正工期の確保のため早期着手が必要な事業 等

債務負担行為の活用

債務負担行為の設定の有無




※グラフ内の数字は地方公共団体数

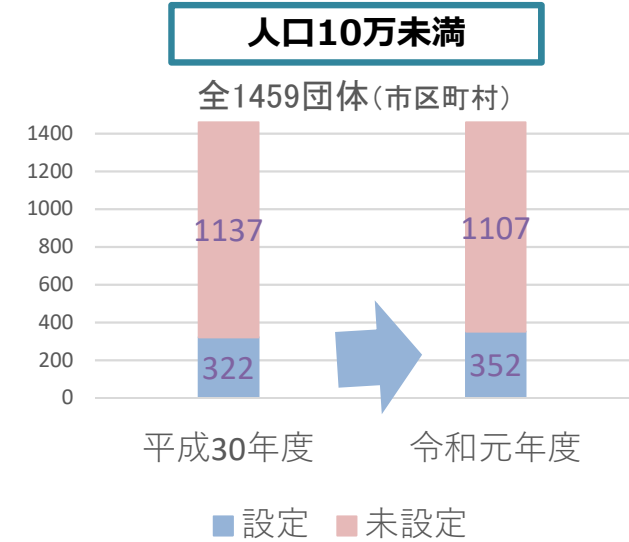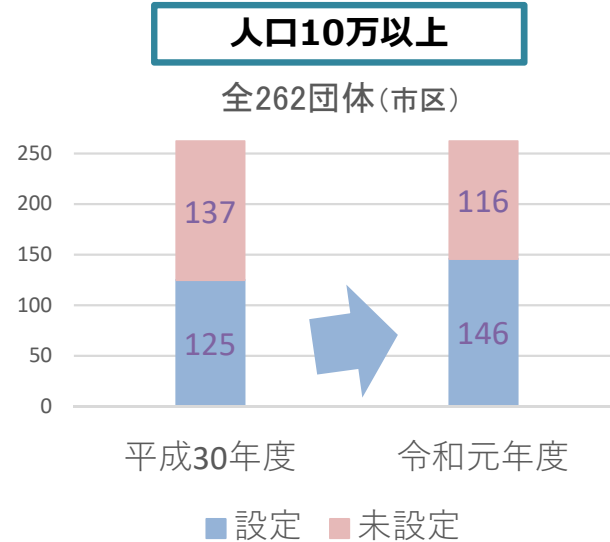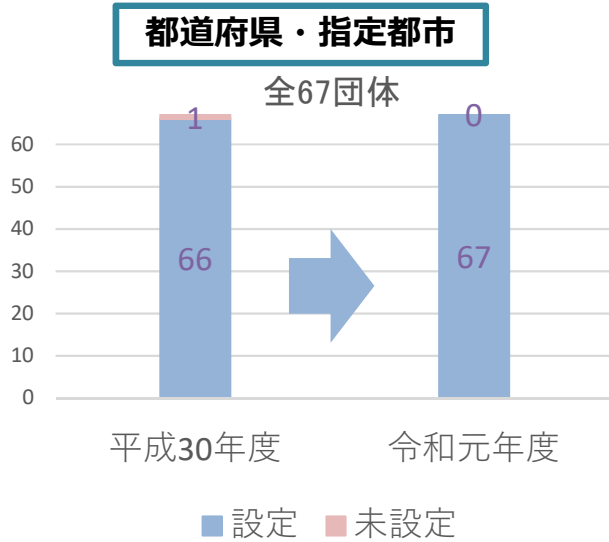

債務負担行為の設定状況

※グラフ内の数字は地方公共団体数

(年間の工事発注件数に占める債務負担行為の設定件数比)

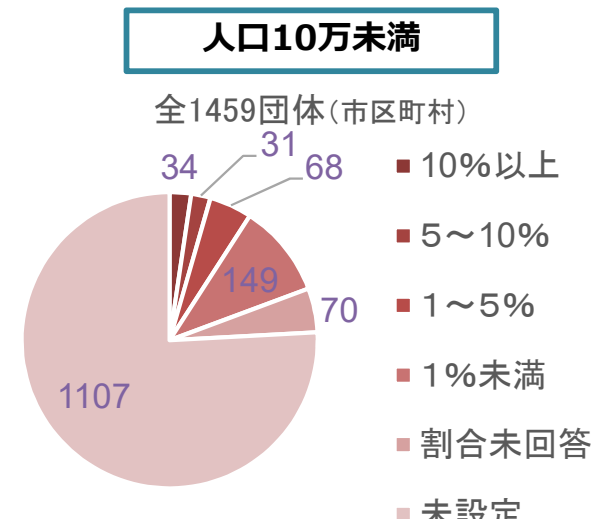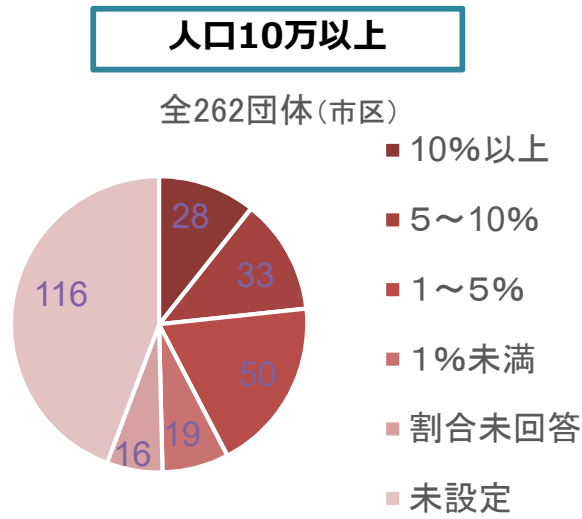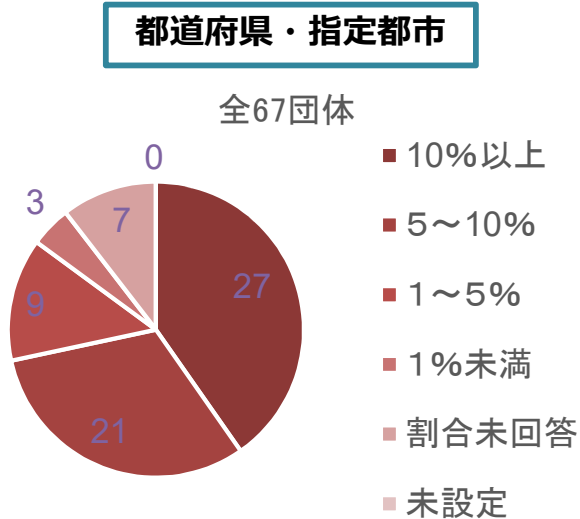


工期1年未満工事における債務負担行為の活用


工期1年未満の工事における債務負担行為の設定の有無

※グラフ内の数字は地方公共団体数


都道府県・指定都市

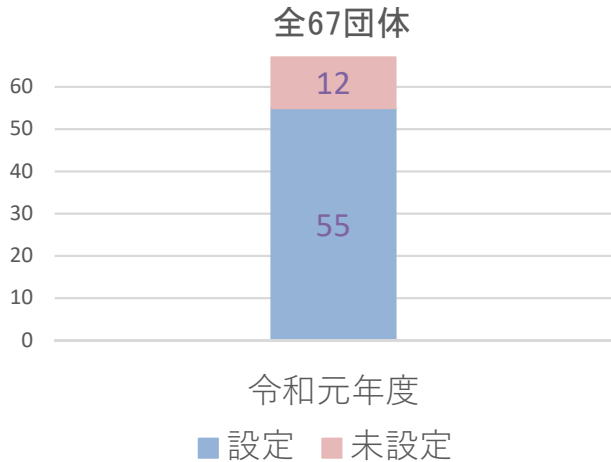

人口10万以上

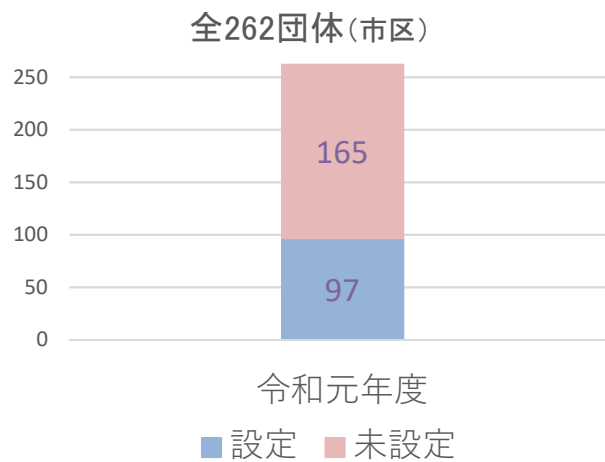

人口10万未満

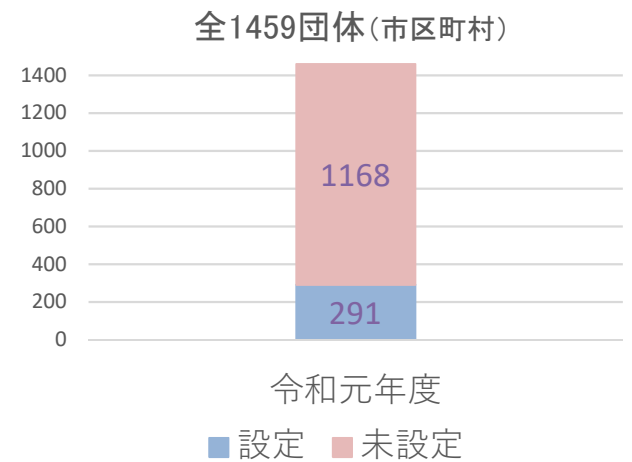


工期1年未満の工事における債務負担行為の設定の状況


※グラフ内の数字は地方公共団体数

(工期1年未満の工事の年間の工事発注件数に占める債務負担行為の設定件数比)


都道府県・指定都市

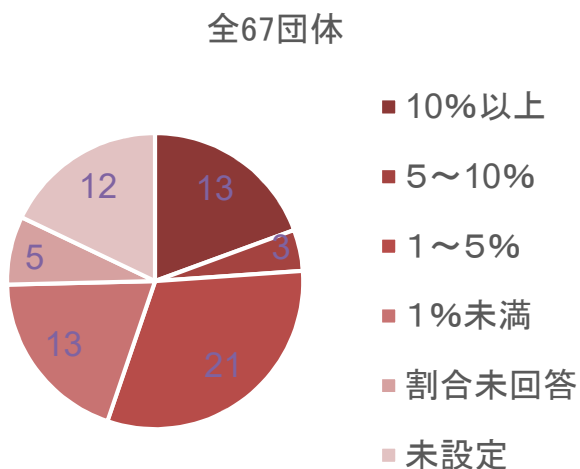

人口10万以上

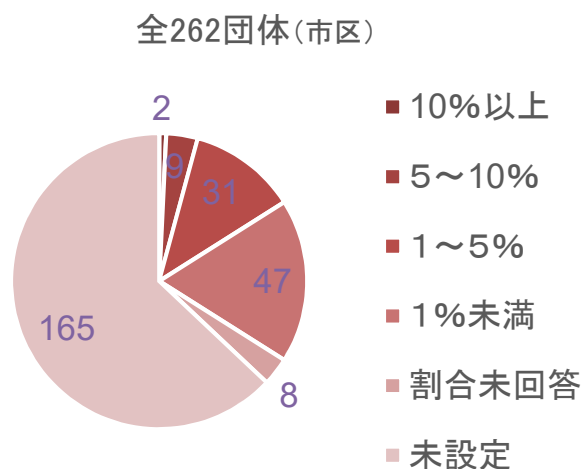

人口10万未満

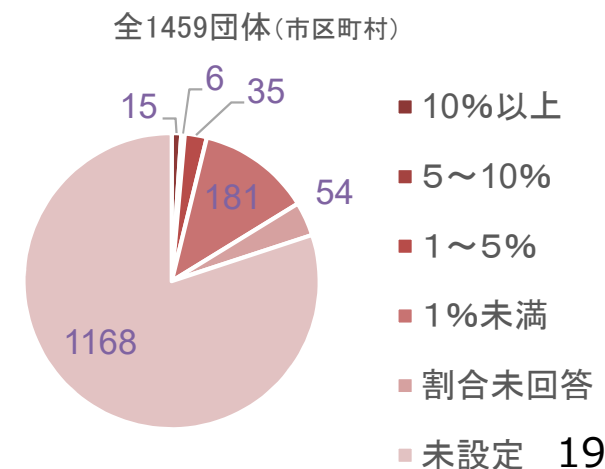

※実施の有無について平成30年度以前は未調査
 ※件数比: 工期1年未満の工事の債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く) / 工期1年未満の工事の年間発注件数

出典: 令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)
 ※件数比については平成30年度実績


ゼロ債務負担行為の活用

ゼロ債務負担行為の設定の有無

※グラフ内の数字は地方公共団体数


都道府県・指定都市

全67団体

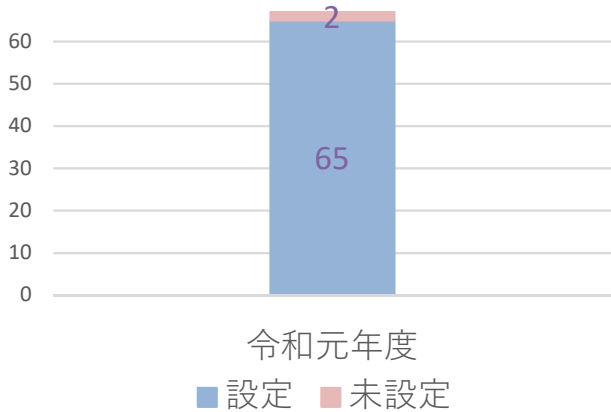


人口10万以上

全262団体(市区)

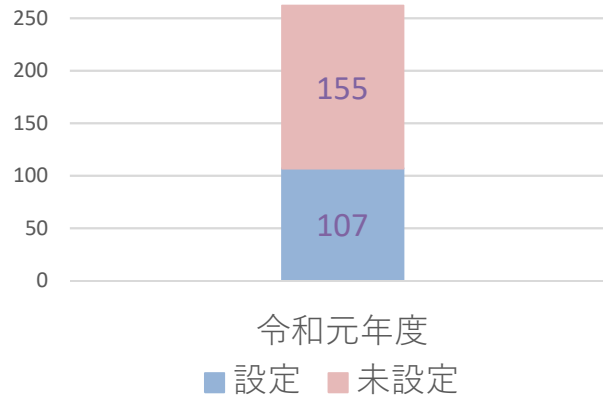

人口10万未満

全1459団体(市区町村)

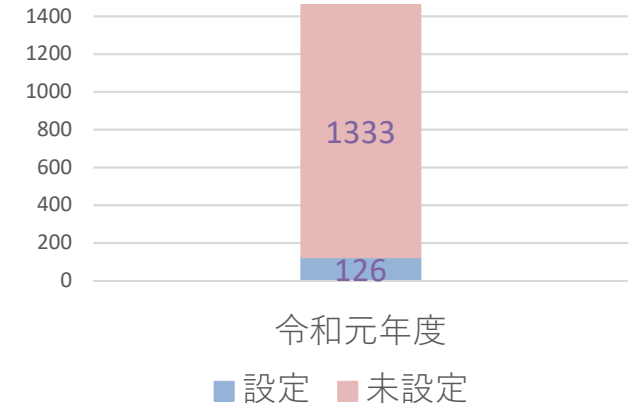


ゼロ債務負担行為の設定の状況

※グラフ内の数字は地方公共団体数

(年間の工事発注件数に占めるゼロ債務負担行為の設定件数比)


都道府県・指定都市

全67団体

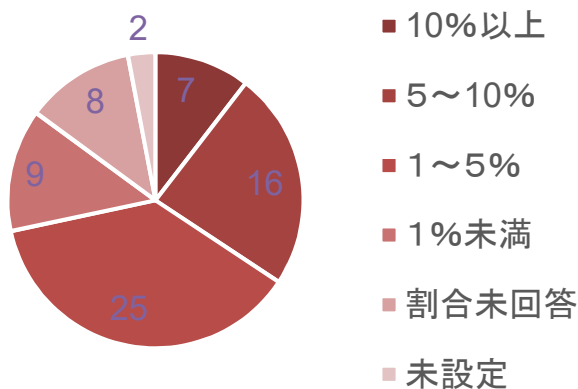


人口10万以上

全262団体(市区)

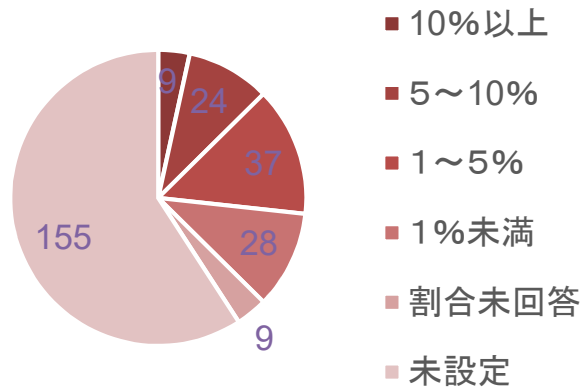

人口10万未満

全1459団体(市区町村)

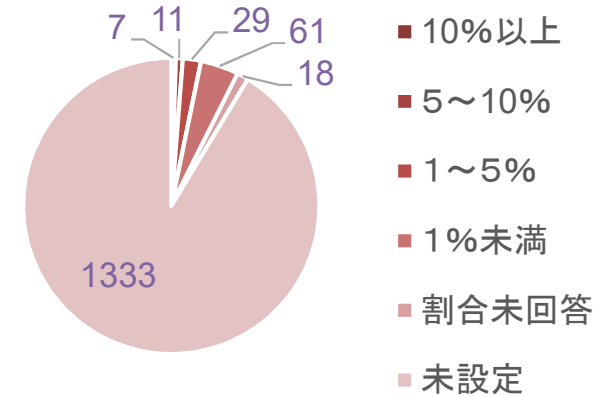

※実施の有無について平成30年度以前は未調査
※件数比: ゼロ債務負担行為の設定件数/年間の工事発注件数

静岡県

件数比：約 17 %

○年度末から年度当初にかけて切れ目のない工事発注を行うため、9月補正予算及び当初予算において、維持修繕工事等に工期1年未満の工事を含め、債務負担行為を設定。

【件数比】約 17.1 % (うち 単独事業は 約 9.7 %)
【設定額】約 154億82百万円 (設定額のうち執行額)

<例：当初予算における債務負担行為の活用>

Table showing project timelines for Shizuoka Prefecture. It includes a 'Before' (従前) section with columns for fiscal years Heisei 28, 29, 30, and 31. Rows show business commissions for Heisei 29, 30, and 31. Black bars indicate project periods, such as '工期: H29.4.1~H30.3.31' for Heisei 29 and '工期: H30.4.1~H31.3.31' for Heisei 30. Milestones like '発注準備' and '精算' are marked.

Table showing improved project timelines (改善後) for Shizuoka Prefecture. It uses the same fiscal year structure. Red bars and arrows indicate the use of debt commitment behavior. Key events include 'ゼロ債発注 2月議会債務枠設定' and 'H29-H30債務 (H29: 3/4, H30: 1/4)'. Project periods are shown as '工期: H29.7.1~H30.7.31 (指示はH30.6.30まで)' and '工期: H30.7.1~H31.7.31 (指示はH31.6.30まで)'.

滋賀県

件数比：約 32 %

○平準化の取組を推進するため、土木事務所単位で平準化の目標を定め、執行計画を作成し、債務負担行為を設定。

○主に当初予算において、工期1年未満の工事を含めた債務負担行為を設定し、翌年度当初にまたがる工期の工事を実施。

【件数比】約 31.6 % (うち 単独事業は 約 21.1 %)
【設定額】約 107億79百万円

岐阜県

件数比：約 18 %

○計画的な事業執行に資するよう、工期1年未満の工事も含め、債務負担行為を設定し、翌年度当初にまたがる工期の工事を実施。

○次年度以降の施工計画を踏まえ、毎年度設定工事を吟味。

【件数比】約 17.7% (うち 単独事業で 約 13.8%)
【設定額】約 126億74百万円

北海道

件数比：約 15 %

○冬期は降雪の影響で工事ができないことから、冬期までの期間を有効に活用するため債務負担行為を設定。

○2~3月に発注を行い、翌年度8月頃までに工期末を迎えられるよう工期を設定。

【件数比】約 14.8 % (うち 単独事業は 約 24.6 %)
【設定額】約 316億25百万円

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査(平成30年度実績)」より算出

※件数比は、(工期1年未満の工事における債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く) / 工期1年未満の工事の年間発注件数)

※単独事業の件数比は、(単独事業かつ工期1年未満の工事における債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く) / 単独事業かつ工期1年未満の工事件数)

三重県

件数比：約 39 %

- 年度末から翌年度当初にかけて切れ目のない工事発注を行うため、当初予算において、工期 1 年未満の工事を含め、債務負担行為を設定。
- 引き続き、道路工事などに債務負担行為を設定し、1 年を通じた施工時期の平準化を推進。

【件数比】約 38.6% (うち 単独事業は 約 12.4%)
【設定額】約 149億35百万円

島根県

件数比：約 4 %

- 年間工事量の平準化を図り、建設業における安定的な雇用確保を図る観点から、令和元年度 1 1 月補正予算において債務負担行為を設定し、翌年度当初にまたがる工期の工事を実施。

【件数比】約 4.4% (うち 単独事業は 約 4.4%)
【設定額】約 52億8百万円

和歌山県

件数比：約 13 %

- 平成 30 年度において、平成 31 年度以降の債務負担行為の設定として、工期が 1 年を超える工事への設定とは別に、平準化を踏まえた工期 1 年未満の工事に対しても債務負担行為を設定。
- また、令和元年度においても、引き続き、令和 2 年度以降の工事への平準化を踏まえた債務負担行為を設定。

【件数比】約 13.2% (うち 単独事業は 約 10.3%)
【設定額】約 95億11百万円

名古屋市

件数比：約 6 %

- 閑散期の工事量を増やし、年間を通じた工事量を平準化させることにより人材・資材の効率的な活用を促し、不調・不落を防ぐため、工期 1 年未満の工事について債務負担行為を設定。
- 平成 31 年度当初予算においては、下水管改良工事等に債務負担行為を設定。

【件数比】約 6.4% (うち 単独事業は 約 5.1%)
【設定額】約 78億60百万円

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査(平成30年度実績)」より算出

※件数比は、(工期1年未満の工事における債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く)／工期1年未満の工事の年間発注件数)

※単独事業の件数比は、(単独事業かつ工期1年未満の工事における債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く)／単独事業かつ工期1年未満の工事件数)

大阪府 茨木市

件数比：約 9 %

- 当初予算において、翌年度4～6月の工事を確保するために工期1年未満の工事に債務負担行為を設定。
- 道路の維持工事のうち可能なものについては、設計を12月までに終了し、1月以降に発注に着手。

【件数比】約 8.8% (うち 単独事業は 約 13.9%)
【設定額】約 3億27百万円

東京都 町田市

件数比：約 6 %

- 建設業の経営の効率化・安定化を図ることに加え、工期末が年度末に集中することを避けるため、平成31年度当初予算において、工期1年未満の工事に対しても債務負担行為を設定。
- 学校の改修工事は長期休暇中に施工する必要があるが、春休みを利用し年度をまたいだ工期で発注したり、夏休みに施工する場合でも、工場製作部分を年度をまたいで発注できるよう工夫している。

【件数比】約 6.3% (うち 単独事業は 約 9.8%)
【設定額】約 10億52百万円

広島県 尾道市

件数比：約 5 %

- 4～6月の閑散期の工事量を増加させるため、工期が1年に満たない工事についても債務負担行為を設定し、年度をまたいだ契約を実施。
- 土木工事以外の学校や消防など建築工事でも債務負担行為を設定。

【件数比】約 5.1% (うち 単独事業は 約 12.1%)
【設定額】約 3億63百万円

東京都 八王子市

件数比：約 8 %

- 当初予算・補正予算にかかわらず、工期1年未満の平準化を目的とした工事も含め、必要に応じて債務負担行為を設定。
- 渇水期の工期確保が必要となる河川改修工事など、必要な工事・事業について個別に判断し、適宜債務負担行為を設定。

【件数比】約 7.7% (うち 単独事業は 約 10.5%)
【設定額】約 7億71百万円

山形県 山形市

件数比：約 5 %

- 地域の建設業の経営の安定化・効率化を図るため、平成28年度から毎年度、平準化を目的とした債務負担行為を設定。
- 平成30年度は平準化目的の債務負担行為を12件設定。

【件数比】約 4.8% (うち 単独事業は 約 10.6%)
【設定額】約 4億32百万円

北海道 苫小牧市

件数比：約 7 %

- 第1四半期から第2四半期の工事量を確保するため、工期が1年に満たない工事も含め、債務負担行為を設定し年度内に発注を行っている。

【件数比】約 7.2% (うち 単独事業は 約 4.2%)
【設定額】約 35億51百万円

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査(平成30年度実績)」より算出

※件数比は、(工期1年未満の工事における債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く)／工期1年未満の工事の年間発注件数)

※単独事業の件数比は、(単独事業かつ工期1年未満の工事における債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く)／単独事業かつ工期1年未満の工事件数)

沖縄県 久米島町

件数比：約 16 %

- 年度当初の工事を確保し、地域の建設業者の経営安定化に寄与するため、工期が1年に満たない工事についても積極的に債務負担行為を設定。
- 図書館等の建築工事に債務負担行為を活用し、年度をまたいだ工期を設定。

【件数比】約 15.6% (うち 単独事業は 約 16.7%)
【設定額】約 1億59百万円

三重県 南伊勢町

件数比：約 4 %

- 地域の建設業の経営の安定化・効率化を図るため、毎年最低1件は平準化を目的として債務負担行為の設定。
- 平成30年度補正予算において、道路改良事業に平準化を目的とした債務負担行為を設定。

【件数比】約 3.7% (うち 単独事業は 約 8.3%)
【設定額】約 2億42百万円

石川県 宝達志水町

件数比：約 6 %

- 年度当初の端境期における受注機会の確保を図るため、補正予算において債務負担行為を設定。
- 学校関係の工事は、長期休暇期間(春休み)を活用するために、年度をまたいだ工期を設定。

【件数比】約 6.1% (うち 単独事業は 約 15.4%)
【設定額】約 2億9百万円

栃木県 壬生町

件数比：約 3 %

- 工期が1年に満たない公民館の修繕工事について、工期を年度をまたぐ9-6月として債務負担行為を設定。

【件数比】約 3.3% (うち 単独事業は 約 3.9%)
【設定額】約 1億33百万円

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査(平成30年度実績)」より算出

※件数比は、(工期1年未満の工事における債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く)／工期1年未満の工事の年間発注件数)


※単独事業の件数比は、(単独事業かつ工期1年未満の工事における債務負担行為の設定件数(ゼロ債務負担行為を除く)／単独事業かつ工期1年未満の工事件数)

鹿児島県

件数比：約 14 %

○令和元年度12月補正予算において、公共事業の平準化等を図るため、債務負担行為（ゼロ県債）を設定。平成28年度からは交付金事業にも拡大。

【件数比】約 14.4% （うち 単独事業で約 22.3%）
【設定額】約 39億42百万円

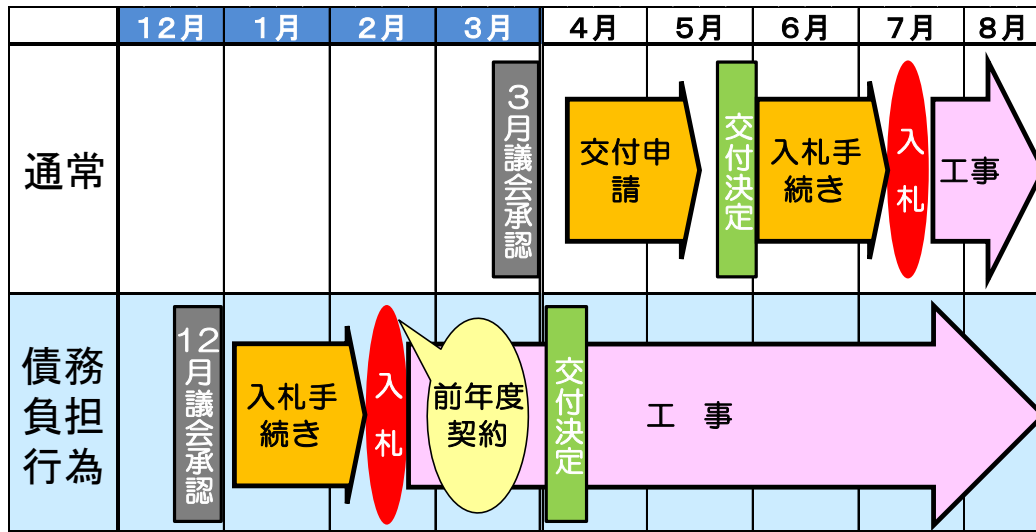

兵庫県

件数比：約 11 %

○平準化を一層推進し、経済対策を図るため、2月補正における全ての工事を対象としてゼロ債務負担行為を設定。

【件数比】約 10.8% （うち 単独事業で約 18.4%）
【設定額】約 59 億円

長崎県

件数比：約 9 %

○地域の建設業者の経営の安定化のため、必要性を検討した上で、積極的にゼロ債を設定。

○令和元年度11月補正予算においても、平準化を踏まえたゼロ債務負担行為を計上。

【件数比】約 9.0% （うち 単独事業で約 14.3%）
【設定額】約 22億33百万円（設定額のうち執行額）

群馬県

件数比：約 15 %

○中小企業への発注量を確保するため、年末から年度末にかけての公共事業発注の端境期対策として、令和元年度11月補正及び2月補正予算においてゼロ県債を活用。

【件数比】約 15.1% （うち 単独事業で約 37.5%）
【設定額】約 26億44百万円

青森県

件数比：約 7 %

○令和元年度11月補正予算において、県事業の早期発注のため、社会資本整備総合交付金事業及び県費単独事業について債務負担行為（ゼロ債務負担行為）を設定。

【件数比】約 7.0% （うち 単独事業で約 11.9%）
【設定額】約 41億1百万円（設定額のうち執行額）

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査（平成30年度実績）」より算出
※件数比は、（ゼロ債務負担行為の設定件数／工事の年間発注件数）
※単独事業の件数比は、（単独事業の工事におけるゼロ債務負担行為の設定件数／単独事業の工事件数）

愛知県 岡崎市

件数比：約 15 %

○施工時期の平準化を進めるため、令和元年度12月補正予算において、舗装修繕、水道管布設替工事及び下水道管改築工事等にゼロ債務負担行為を設定。

【件数比】約 14.9% (うち 単独事業は 約 15.8%)

【設定額】約 13億64百万円

静岡県 三島市

件数比：約 14 %

○4月5月の工事量を確保するため、年間発注工事の2割にゼロ債務負担行為を設定することを目標としている。

○令和元年度2月補正予算において、道路改良工事等にゼロ債務負担行為を設定。

【件数比】約 13.7% (うち 単独事業は 約 23.2%)

【設定額】約 2億58百万円

新潟県 柏崎市

件数比：約 4 %

○公共工事の早期発注と施工時期の平準化のため、新年度分の公共工事の契約や発注を今年度中に行う「ゼロ市債」を活用。

○新年度予算で行う市単独費の工事に、市議会の2月定例会議で債務負担行為を設定し、現年度中に入札、契約を締結をすることにより、新年度当初の施工を可能にする。

【件数比】約 4.0% (うち 単独事業は 約 7.9%)

【設定額】約 78百万円

ゼロ市債の活用による早期工事発注のお知らせ

市は、公共工事の早期完成を図るため、新年度分の公共工事の契約や発注を今年度中に行う「ゼロ市債」を活用します。

対象となる工事は、道路の区画線工事や漁港しゅんせつ工事など、早期に施工する必要がある工事や施工時期の限られている工事で、市単独費で行う工事です。

(新潟県柏崎市HPより)

東京都 国分寺市

件数比：約 14 %

○公共工事の発注時期の平準化により、建設業者の経営の効率化と雇用の安定を目的に、ゼロ債務を活用した公共工事の早期発注を実施。

【件数比】約 14.3% (うち 単独事業は 約 30.0%)

【設定額】約 1億27百万円

ゼロ債務の活用による工事発注時期の平準化について

[サイト](#)

ページ番号 1014990 更新日 平成29年1月5日

ゼロ債務の活用による工事の早期発注について

国分寺市では、公共工事の発注時期の平準化により、建設業者の経営の効率化と雇用の安定を目的に、ゼロ債務を活用した公共工事の早期発注を行います。概要は以下のとおりです。

[ゼロ債務の活用による工事の早期発注についての概要 \(PDF 63.0KB\)](#)

(東京都国分寺市HPより)

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査(平成30年度実績)」より算出

※件数比は、(ゼロ債務負担行為の設定件数/工事の年間発注件数)

※単独事業の件数比は、(単独事業の工事におけるゼロ債務負担行為の設定件数/単独事業の工事件数)

北海道 釧路市

件数比：約 7 %

- 建設業者等の経営環境の健全化や労働者の処遇改善、資機材確保の円滑化などを図ることを目的に、ゼロ市債を設定し事業を実施。（平成30年度：29事業、平成31年度：19事業）
- 令和2年度においても、引き続きゼロ市債を設定。
【件数比】約 6.8%（うち 単独事業は約 14.1%）
【設定額】約 3億37百万円

群馬県 富岡市

件数比：約 3 %

- 新年度で予定している工事等を現年度に前倒し発注し、公共事業の閑散期と言われる4 - 6月期に施工することで平準化を図る。
- 工事等の早期完了・代金の早期支払いによる景気浮揚をねらいとして令和元年12月にも債務負担行為を2事業に設定。
【件数比】約 3.4%（うち 単独事業は約 3.6%）
【設定額】約 27百万円

長野県 軽井沢町

件数比：約 5 %

- 地域の建設業者への配慮として施工時期の平準化を図るため、ゼロ債務負担行為を活用。
- 平成30年度12月補正において、道路補修工事3件に設定。
【件数比】約 5.3%（うち 単独事業は約 7.3%）
【設定額】約 32百万円

北海道 岩内町

件数比：約 3 %

- 6月以降に工期が集中することを避け、年度当初から工事に着手するため、令和元年度3月補正において、下水道工事にゼロ町債を設定。
【件数比】約 3.4%（うち 単独事業は約 4.5%）
【設定額】約 68百万円

広島県 府中町

件数比：約 2 %

- 4月1日から道路維持管理業務に着手できるよう、令和元年度12月補正において、ゼロ債務負担行為を設定。
【件数比】約 2.2%（うち 単独事業は約 9.1%）
【設定額】約 25百万円

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査（平成30年度実績）」より算出
※件数比は、（ゼロ債務負担行為の設定件数／工事の年間発注件数）
※単独事業の件数比は、（単独事業の工事におけるゼロ債務負担行為の設定件数／単独事業の工事件数）

長崎県

件数比：約 13 %

○当初予算及び補正予算において、端境期（4 - 6月）における発注工事量の減少に対応し、発注可能な工事契約を前倒し実施するため、単独事業及び交付金事業に債務負担行為（ゼロ債を含む）を設定。

【件数比】約 12.6%
【設定額】約 102億29百万円（設定額のうち執行額）

宮崎県

件数比：約 4 %

○翌年度発注予定の事業を一部繰り上げて発注することにより、出水期前に行う浸水対策、安全対策等の事業効果の早期発現を図るとともに、工事量の平準化を図るため、平成28年度より県単独事業に加え社会資本整備交付金等にも新たにゼロ県債を設定。

【件数比】約 3.9%
【設定額】約 88億57百万円

秋田県

件数比：約 8 %

○前倒し発注を積極的に推進し、事業の平準化を図るため、平成30年度支出に係る補助金・交付金事業において債務負担行為を設定。

【件数比】約 8.4%
【設定額】約 47億92百万円

青森県

件数比：約 5 %

○令和元年度11月補正予算において、県事業の早期発注のため、社会資本整備総合交付金事業及び県費単独事業について債務負担行為（ゼロ債務負担行為）を設定。

【件数比】約 4.6%
【設定額】約30億69百万円（設定額のうち執行額）

福岡県

件数比：約 5 %

○令和元年度12月補正予算において、翌年度事業の早期発注と年間を通じた工事施工時期の平準化を図るため、社会資本整備総合交付金事業と県単独事業にゼロ県債を設定。

【件数比】約 4.6%
【設定額】約 56億75百万円

鹿児島県

件数比：約 10 %

○令和元年度12月補正予算において、公共事業及び県単公共事業の平準化等を図るため、債務負担行為（ゼロ県債）を設定。平成28年度からは交付金事業にも拡大。

【件数比】約 9.8%
【設定額】約 82億円

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査（平成30年度実績）」より算出

※件数比は、（補助金・交付金事業の工事における債務負担行為の設定件数／補助金・交付金事業の工事件数）

沖縄県 那覇市

件数比：約 34 %

- 早期発注することで計画的に事業が執行できるよう債務負担行為を設定。
- 令和元年度 1 月補正において、単独事業に加え、市営住宅建替等の交付金事業においても、ゼロ債務負担行為を設定。

【件数比】約 34.4% 【設定額】約 229億58百万円

愛知県 豊橋市

件数比：約 9 %

- 4～6月の工事量を増やし、年間の工事量の波を平準化させるため、債務負担行為を設定。
- 平成31年度当初予算において、学校の校舎建築工事等（10件）の交付金事業に設定。

【件数比】約 9.1% 【設定額】約 8億35百万円

東京都 荒川区

件数比：約 32 %

- 平成30年度当初予算において、年度をまたぐ交付金事業（公共施設建築工事等10件）に、債務負担行為を設定。

【件数比】約 32.3% 【設定額】約 17億58百万円

岩手県 一関市

件数比：約 7 %

- 計画的な発注を推進し、工事の年度末への偏りを解消するため、平成31年3月補正予算において交付金事業へ債務負担行為を設定。

【件数比】約 6.9% 【設定額】約 2億43百万円

青森県 青森市

件数比：約 20 %

- 早めの発注を行い第1四半期の工事量の落ち込みを解消するため、社会資本整備交付金事業において、ゼロ債務負担行為を設定。
- 令和元年度 1 2月補正予算においては、水路護岸整備、道路整備、橋梁修繕等に設定。

【件数比】約 19.7% 【設定額】約 6億19百万円

三重県 伊勢市

件数比：約 5 %

- 4～6月の閑散期の工事量の増加を図るため、平成30年度当初予算において、交付金事業にも債務負担行為を設定。

【件数比】約 5.0% 【設定額】約 3億22百万円

静岡県 清水町

件数比：約 7 %

- 平成30年度当初予算において、図書館工事等交付金事業に債務負担行為を設定。

【件数比】約 6.7% 【設定額】約 80百万円

熊本県 美里町

件数比：約 93 %

- 早期に発注を行い、地域の道路・河川整備を前倒しするため、債務負担行為を活用。
- 平成30年度予算において、道路工事等（44件中41件）の交付金事業に設定し、令和元年度3月補正予算においても、交付金事業に債務負担行為を設定。

【件数比】約 93.2% 【設定額】約 9億16百万円

※件数比、設定額は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査(平成30年度実績)」より算出

※件数比は、(補助金・交付金事業の工事における債務負担行為の設定件数/補助金・交付金事業の工事件数)


3. 柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用）

余裕期間制度の活用により、例えば、受注者が工事開始日や工期末を選択しやすくなるなど、受注者は人材や資機材の調整を行いやすくなるため、工事の円滑な施工が見込まれます。

国土交通省における余裕期間制度


発注者指定方式

余裕期間を設けて工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式




任意着手方式

受注者が工事の開始日を余裕期間内で選択できる方式

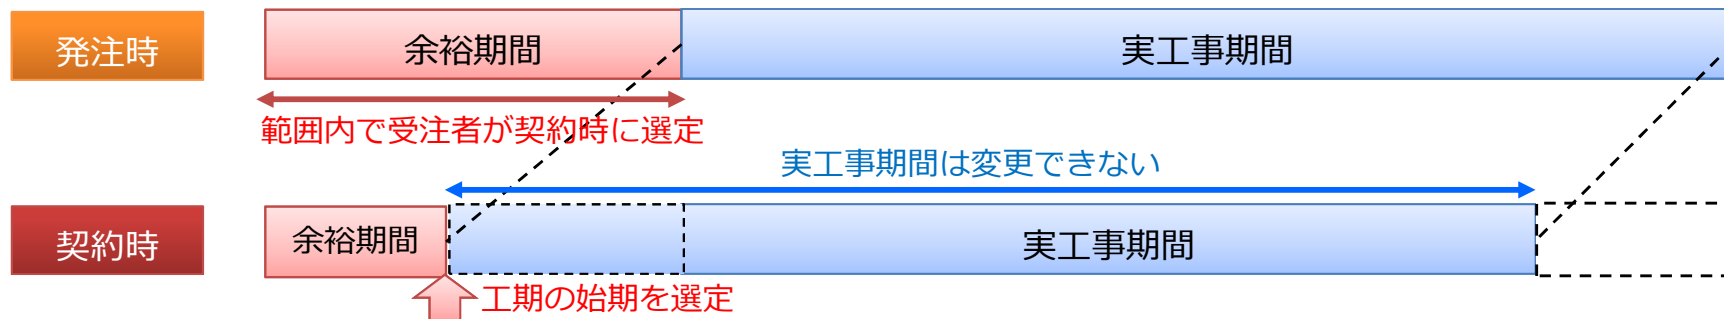

フレックス方式

受注者が工事の始期と終期を全体工期内で選択できる方式

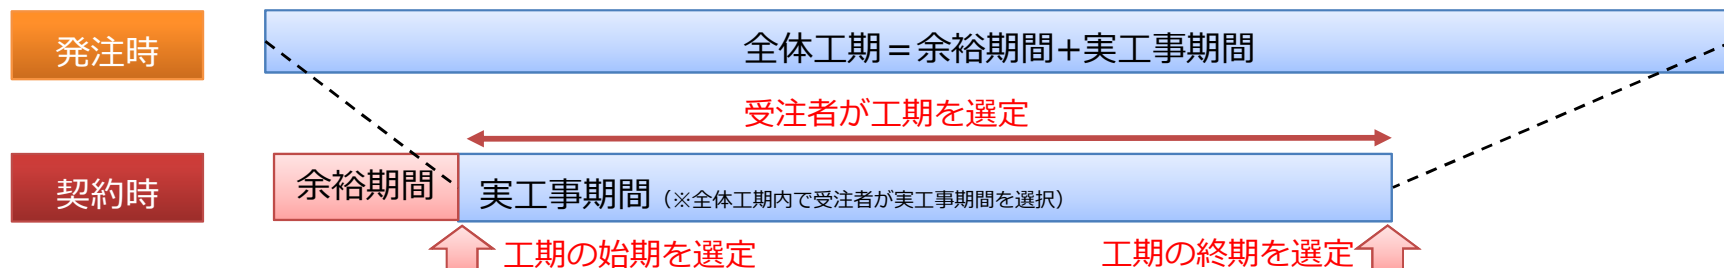

1. 余裕期間の長さ: 6ヶ月を超えない範囲
2. 技術者の配置:
 - (1) 技術者の配置必要なし、現場着手してはいけない期間(資機材の準備は可、現場搬入不可)
 - (2) 実工事期間: 技術者の配置必要、準備・後片付け期間を含む。


柔軟な工期設定（余裕期間制度の活用）

柔軟な工期の設定の有無

※グラフ内の数字は地方公共団体数


都道府県・指定都市

全67団体

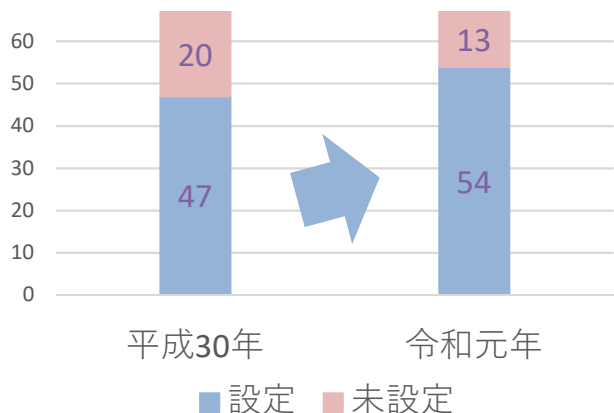


人口10万以上

全262団体(市区)

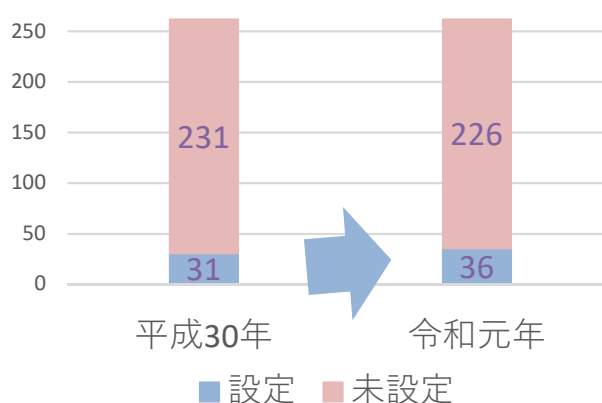

人口10万未満

全1459団体(市区町村)

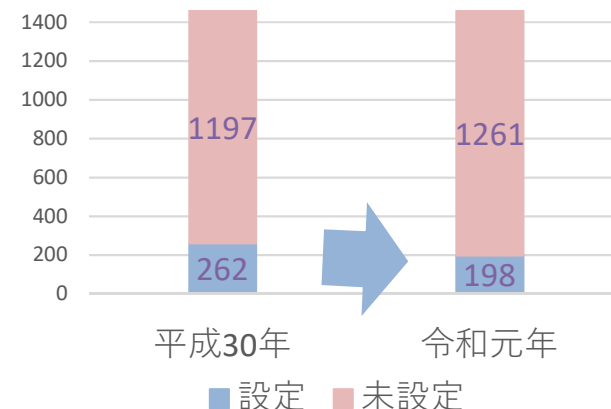


柔軟な工期の設定の状況

※グラフ内の数字は地方公共団体数

(年間の工事発注件数に占める柔軟な工期の設定件数比)


都道府県・指定都市

全67団体

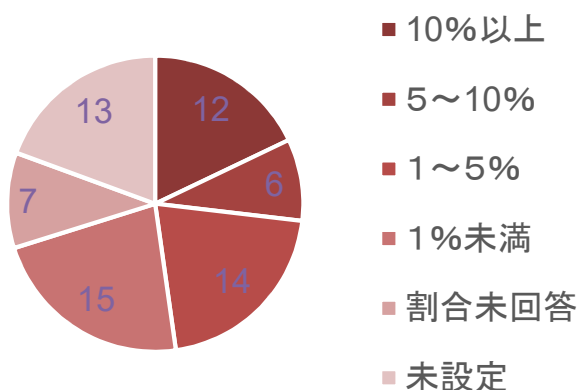


人口10万以上

全262団体(市区)

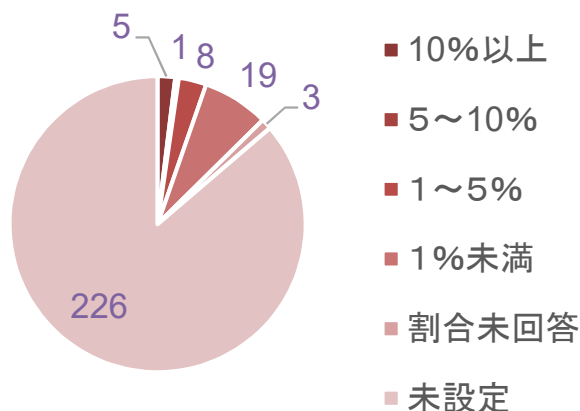

人口10万未満

全1459団体(市区町村)

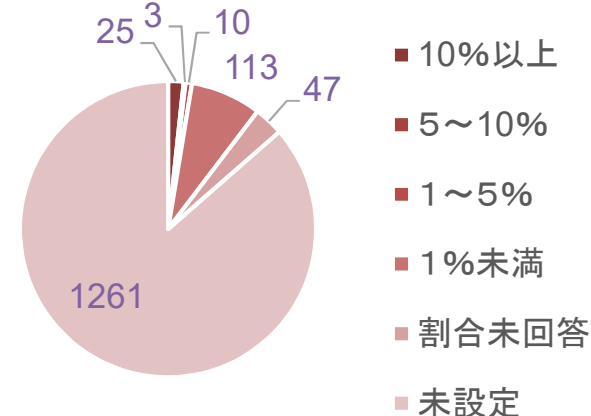

※件数比: 柔軟な工期の設定件数/工事の年間発注件数
 ※「柔軟な工期の設定」について、令和元年度調査より解釈を明確化

出典: 令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点) ※件数比については平成30年度実績


北海道

件数比：約 48 %

フレックス工期制実施要領の制定

○建設管理部が発注する工事において、発注者があらかじめ設定した全体工期内で受注者が工事の始期・終期を決定できるフレックス工期制を導入し、平成29年1月4日以後に公告等を行う工事から適用。

フレックス工期制概要図

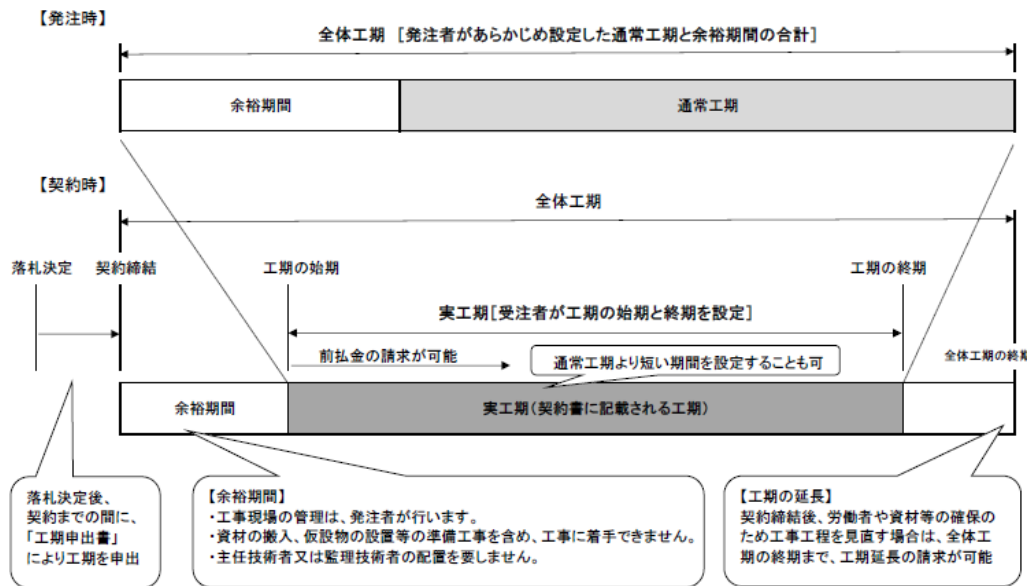

(北海道HPより)

岩手県

件数比：約 39 %

余裕期間の設定

○県土整備部が所管する県営建設工事において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、実工期の30%を超えず、かつ4ヶ月(120日間)を超えない範囲内※で余裕期間を設定し、発注者が工事の始期日を指定することができる制度を平成29年2月より導入(工事の始期日を変更する際は受発注者協議により変更できる)。

※ 令和2年4月以降入札公告に付する工事は、実工期の40%を超えず、かつ5ヶ月(150日間)を超えない範囲内

余裕期間を設定した工事のイメージ

余裕期間を設定した工事で、契約上の終期日より前に完成～検査・引渡しする例




(岩手県HPより)

愛媛県

件数比：約 13 %

余裕工期設定工事の実施

- 建設資材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定を行い、施工時期の平準化に努めるため、土木部発注工事において、工期に余裕期間を設定した工事を平成28年2月1日より試行。
平成29年度からは、全部局において全ての工事に原則適用することとして本格実施している。

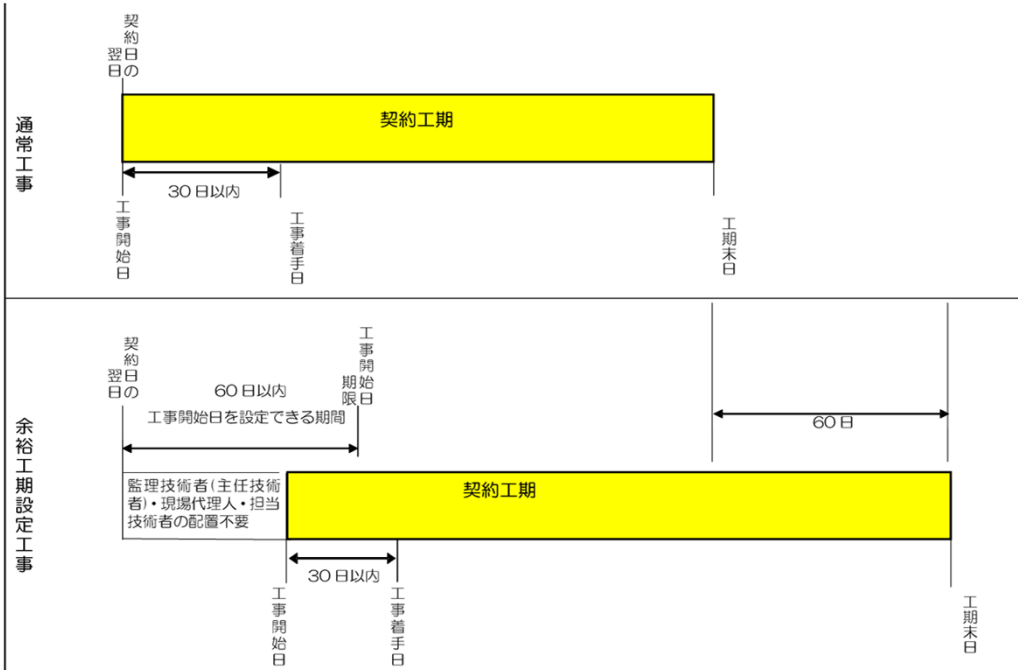

(愛媛県HPより)


高知県

件数比：約 6 %


余裕期間の設定

- 契約締結日から工事開始日までの間に、余裕期間を設定し、当該余裕期間については、技術者の配置を不要とするもの。
年度後半(10月以降)に公告又は指名通知を行う工事で、技術者不足等により入札の不調・不落の発生が懸念される等、発注部局において必要と認められるもので、発注者が指定したものを対象。
指定にあたっては、
 - ・工事の特性等から、不調・不落の発生が懸念される工事で余裕期間を設定することにより、解消が期待できるもの。
 - ・年度を跨いだ施工が予定されるもの。
 を要件としている。

<発注者指定方式>



<任意選択方式>

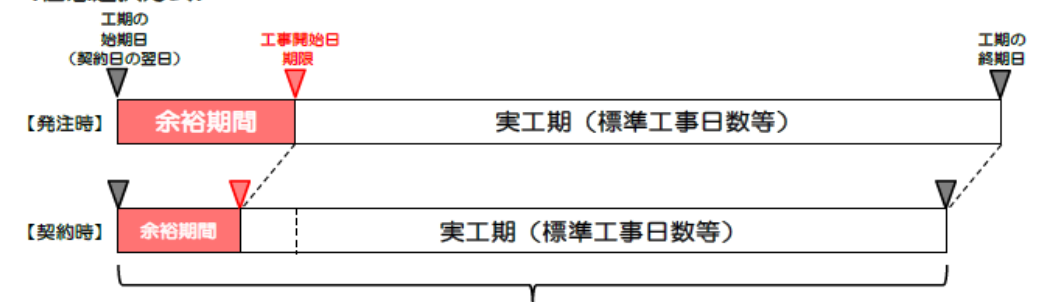

契約工期

(高知県HPより)

兵庫県


件数比：約 2 %

余裕期間制度の試行

- 受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる余裕期間（最大60日）を設定した工事を試行。

[実施時期] 平成28年4月入札公告分から実施。

<参考> 余裕期間制度を活用した工事



* 余裕期間は、主任技術者等の配置は不要


(兵庫県HPより)

三重県

件数比：約 2 %

余裕期間の設定

- 県土整備部が所管する県営建設工事において、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、契約締結日から90日間を超えない範囲内で余裕期間を設定し、発注者又は受注者が工事の始期日を指定できる制度を平成29年2月より導入。

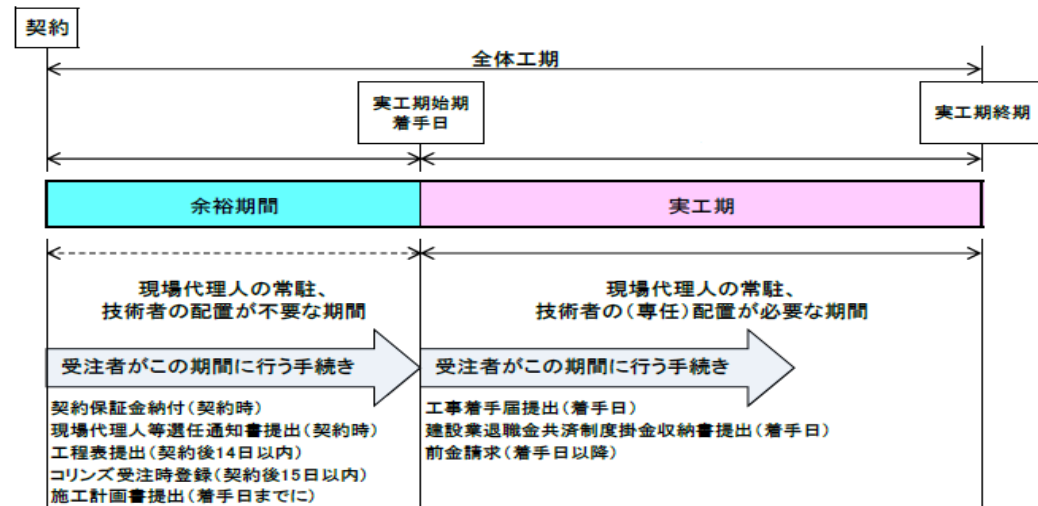

(三重県HPより)

山形県

件数比：約 3 %

余裕期間制度の試行

- 受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、発注者が示した工事着手期限までの間に受注者が工事の始期を選択できる余裕期間（任意着手方式）を平成28年11月から試行導入。

- 対象工事は、県土整備部及び各総合支庁建設部が発注する建設工事。

※ 平成30年12月に対象範囲を制限する金額設定を撤廃し適用範囲を拡大。

熊本県 熊本市

件数比：約 18 %

- 受注者の円滑な施工体制整備を図るため、建設資材の調達や労働力確保に要する余裕期間を設定することができることとしている。余裕期間は、工事ごとに発注者が判断し、必要に応じて設定することとし、発注者指定方式、任意着手方式又はフレックス方式のいずれかの方式において設定する。

静岡県 浜松市


件数比：約 2 %

- 施工時期の平準化や円滑な施工体制の確保を実現するため、建設工事において受注者が工事着手日を選択し契約締結することができる着手日選択型工事の対象を拡大し、平成30年5月より実施。

熊本県 天草市

件数比：約 18 %

- 余裕期間は、工事ごとに発注者が判断し3ヵ月を超えない範囲で設定。余裕期間内に建設資材の調達や労働力が確保できた場合、施工担当課との協議により工事着工可。

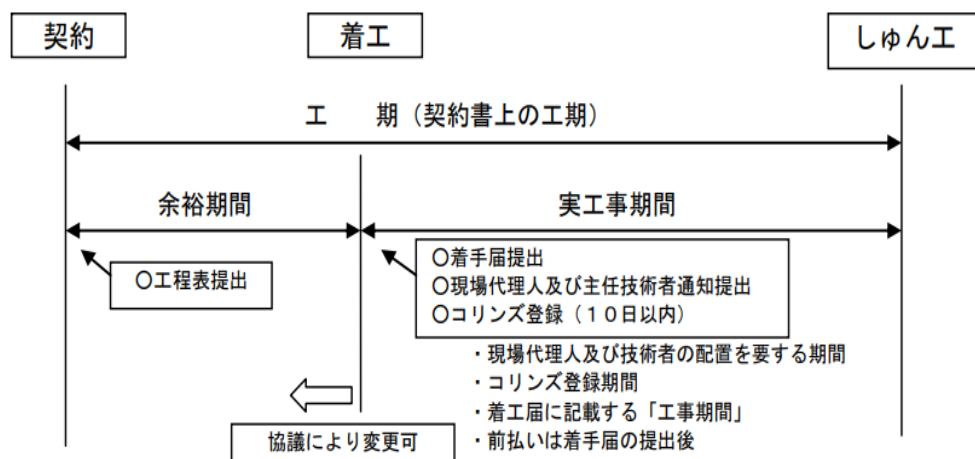

千葉県 浦安市

件数比：100 %

- 地域の建設業者より、技術者が不足気味だが、余裕期間制度が活用されれば入札に参加できるので採用して欲しいとの要望がありフレックス方式の活用を開始。130万円を超える全ての工事をフレックス方式の対象工事としている。



岐阜県 岐阜市

件数比：約 46 %

- 技術者の配置を柔軟にするため、一般競争入札案件は全ての工事を余裕期間制度の対象工事としている。ただし、工期末を確定させるため、任意着手方式やフレックス方式ではなく、発注者指定方式を活用している。

4. 速やかな繰越手続

悪天候や用地の関係など、年度内に支出が終わらないやむを得ない事由が発生した場合には、年度末を待つことなく、速やかに繰越手続を開始することにより、受注者は、年度内の完成を早期に見直すことができ、余裕をもって人材・資機材のやりくりを行えるようになります。

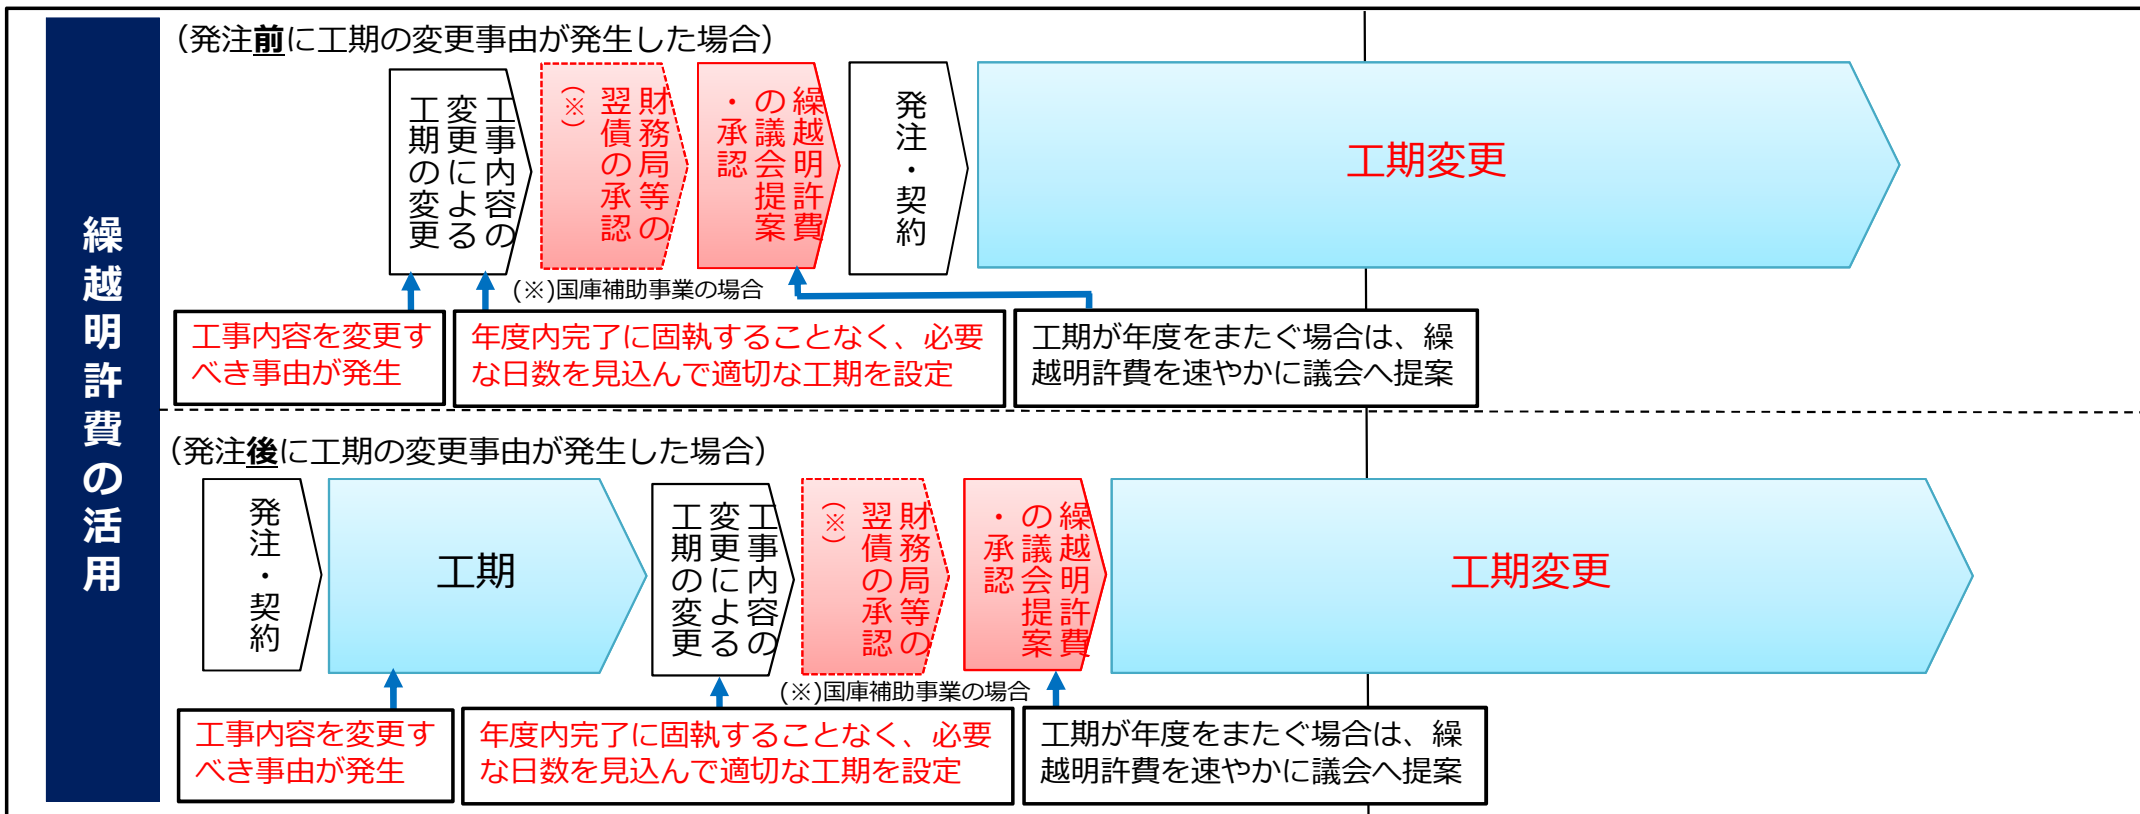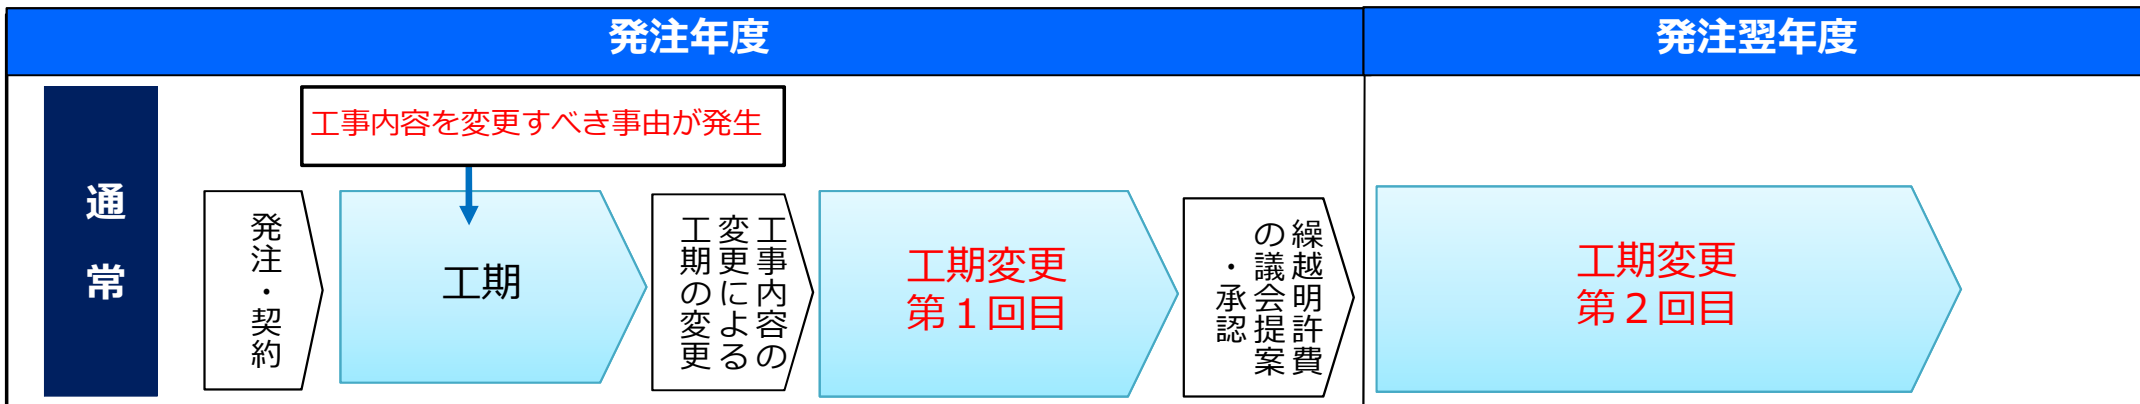


速やかな繰越手続（繰越明許費の活用）

速やかな繰越手続の実施の有無

※グラフ内の数字は地方公共団体数


都道府県・指定都市

全67団体

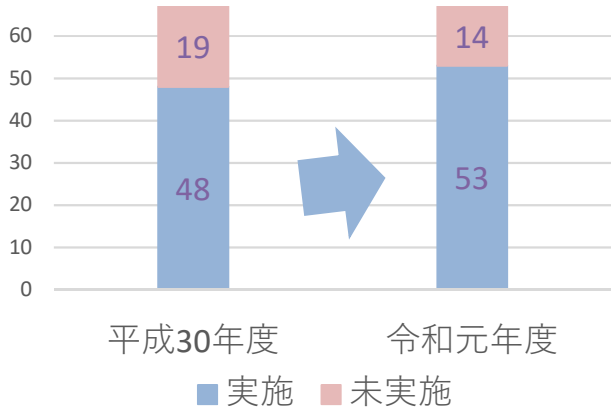


人口10万以上

全262団体(市区)

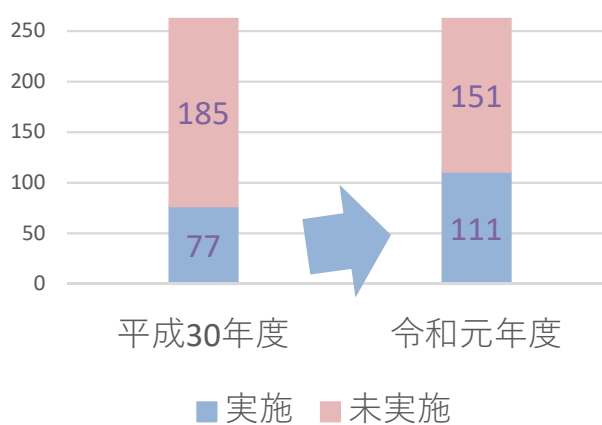

人口10万未満

全1459団体(市区町村)

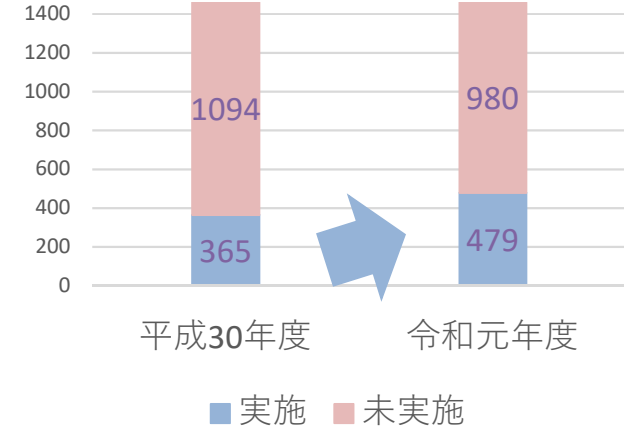


速やかな繰越手続の実施の状況

※グラフ内の数字は地方公共団体数

(速やかな繰越手続の実施時期)


都道府県・指定都市

全67団体

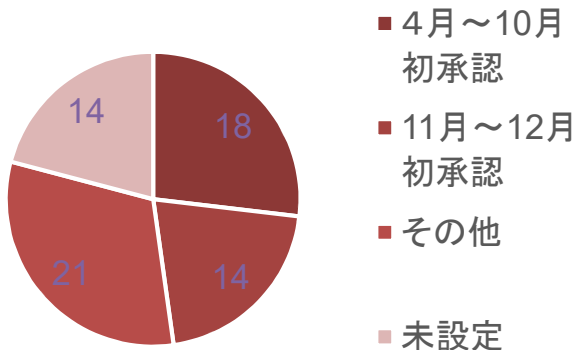


人口10万以上

全262団体(市区)

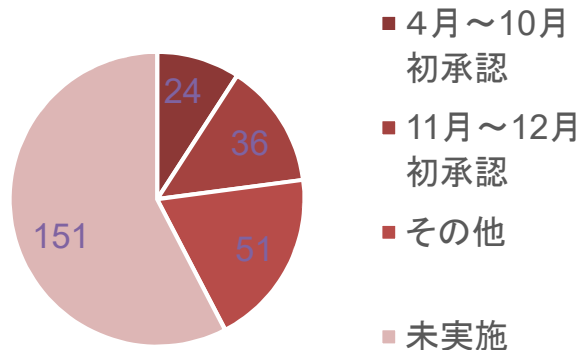

人口10万未満

全1459団体(市区町村)

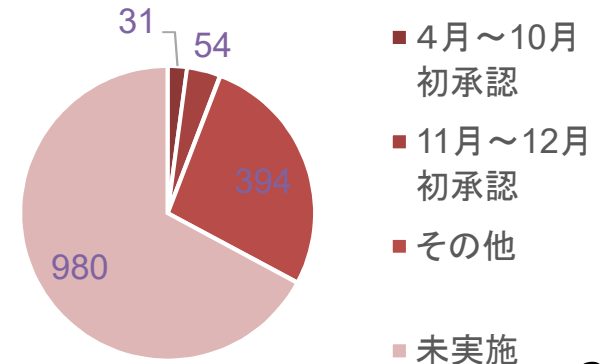

宮崎県

6月議会に対応

- 令和元年度6月補正予算及び9月補正予算において、公共道路新設改良事業、公共河川事業等の計16事業について繰越明許費（93億47百万円）を、11月補正予算において繰越明許費（35億62百万円）を計上。

岡山県

9月議会に対応

- 令和元年度9月補正予算において、地方道路整備事業等の繰越明許費（32億1百万円（土木部関係））を設定。また、令和元年度11月補正予算においても、地方道路整備事業等の繰越明許費（57億13百万円（土木部関係））を設定。

沖縄県

9月議会に対応

- 令和元年度9月補正予算において、道路事業、港湾事業や公園事業等について繰越明許費（18億6百万円）を設定し、9月定例議会に提出。また、令和元年度11月補正予算においても、道路事業や港湾事業、下水道事業等の繰越明許費（49億93百万円）を設定し、11月定例議会に提出。

群馬県

9月議会に対応

- 令和元年度9月補正予算において、道路維持修繕事業、河川改修事業や街路事業等に繰越明許費（29億70百万円（県土整備費関係））を設定し、9月定例議会に提出。

栃木県

9月議会に対応

- 令和元年度9月補正予算において、道路事業、河川事業及び街路事業等の繰越明許費（281億35百万円（土木費関係））を設定し、9月通常議会に提出。

埼玉県

12月議会に対応

- 令和元年度12月補正予算(12月県議会に計上)において、年度内の完了が困難なことが明らかになった工事・委託業務について適正工期を確保するため、道路事業及び河川砂防事業(計26事業)で繰越明許費82億37百万円(県土整備部関係)を設定。

鳥取県 鳥取市

9月議会に対応

- 平成30年度においては、9月補正において、橋梁修繕工事に繰越明許費（44百万円（土木関係費））を設定し、9月定例会に提出。
- 12月補正において、道路改良工事等に繰越明許費（5億95百万円（土木関係費））を設定し、12月定例会に提出。

静岡県 森町

11月議会に対応

- 平成30年度11月補正予算において、空調設備（町内の幼稚園、小学校、中学校）及び下水道整備計画の策定委託について、繰越明許費（1億83百万円）を設定し、11月臨時会に提出。
- 平成30年度12月補正予算において、コミュニティ消防センター建設事業について、繰越明許費（16百万円）を設定し、12月定例会に提出。

長崎県 長崎市

9月議会に対応

- 令和元年度9月補正予算において、繰越明許費（70百万円）を設定。
- 令和元年度11月補正予算において、繰越明許費（33億12百万円）を設定。令和2年2月補正予算において、繰越明許費（9億55百万円）を設定。

長野県 箕輪町

12月議会に対応

- 標準工期が確保できないものや、発注済でやむを得ない事情により年度内竣工が困難なものについては、速やかに繰越の承認を受けるようにしている。
- 令和元年度においては、事業規模から標準工期が確保できない造成工事や橋梁長寿命化詳細点検・補修設計業務委託など、6事業について繰越明許費（2億22百万円）を設定し、12月定例会に提出。

島根県 出雲市

12月議会に対応

- 平成30年12月補正予算において、小学校エアコン整備事業等について、繰越明許費（850,000千円）を設定し、第3回定例会（12月）に提出。


広島県 府中町

12月議会に対応

- 平成30年度12月補正予算において、防災行政無線事業に繰越明許費（15百万円（消防費関係））を設定し、第5回定例会（12月）に提出。

5. 積算の前倒し

発注前年度のうちに設計・積算までを完了させることにより、発注年度当初に積算単価を更新するだけで速やかに発注手続を行うことができます。

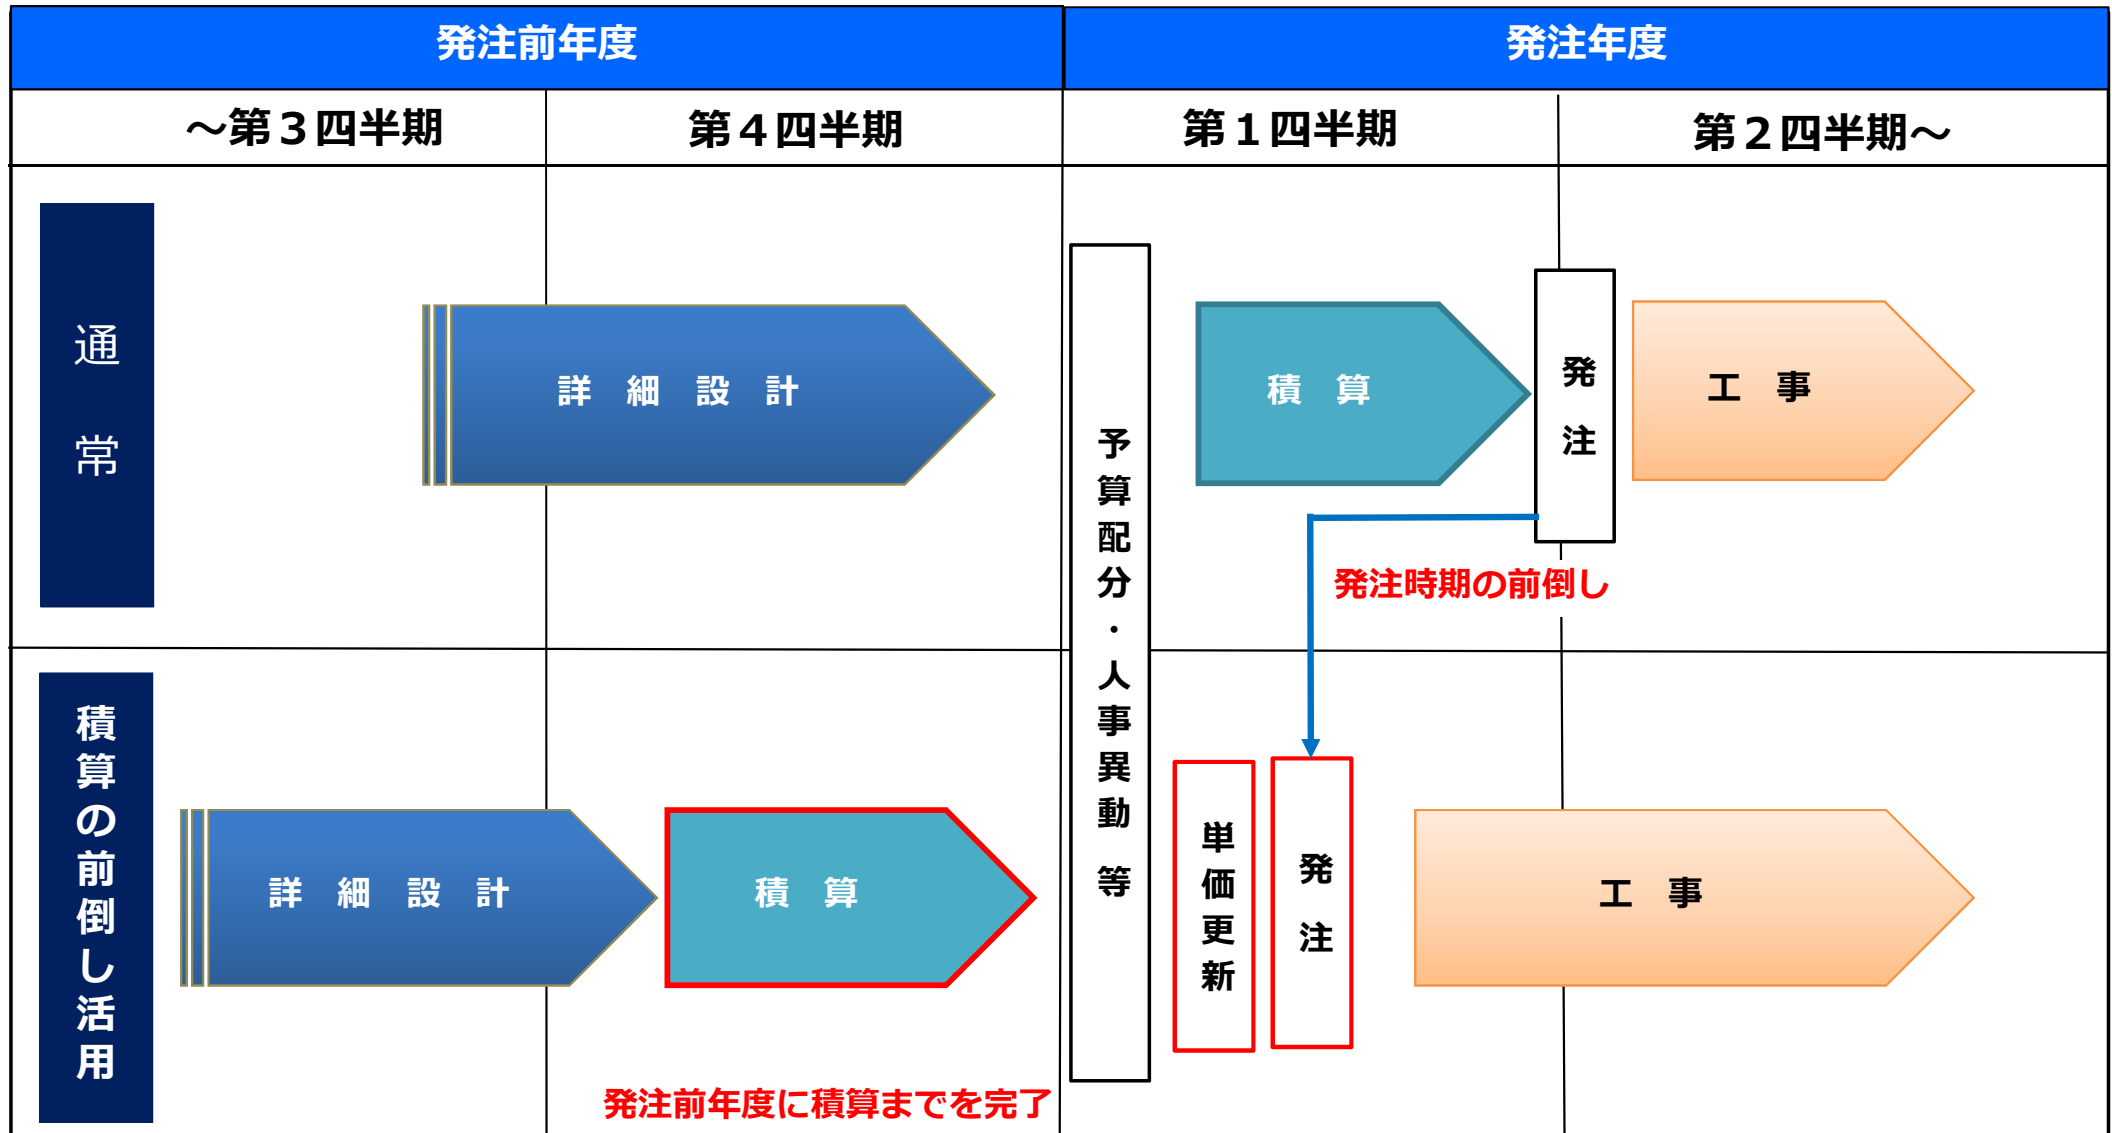


積算の前倒し／早期執行のための目標設定・公表

積算の前倒しの実施の有無

※グラフ内の数字は地方公共団体数


都道府県・指定都市

全67団体

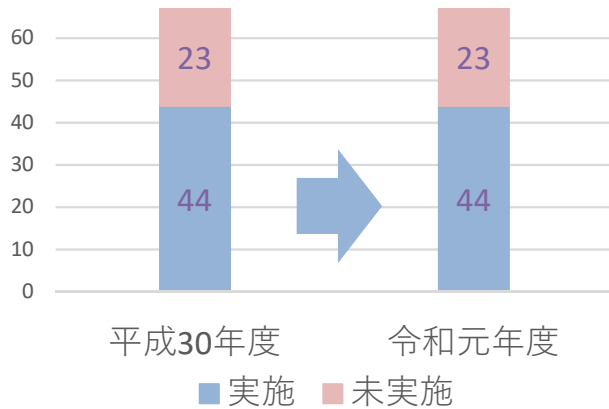


人口10万以上

全262団体(市区)

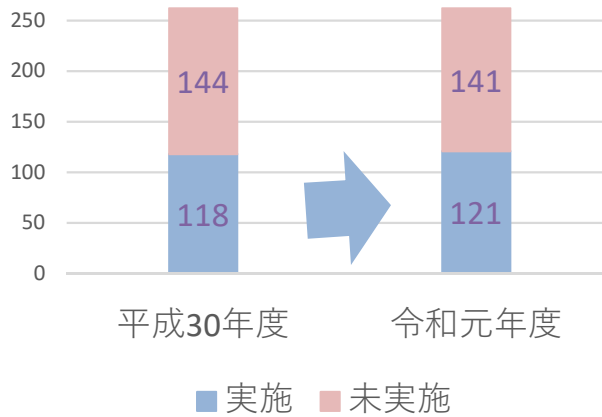

人口10万未満

全1459団体(市区町村)

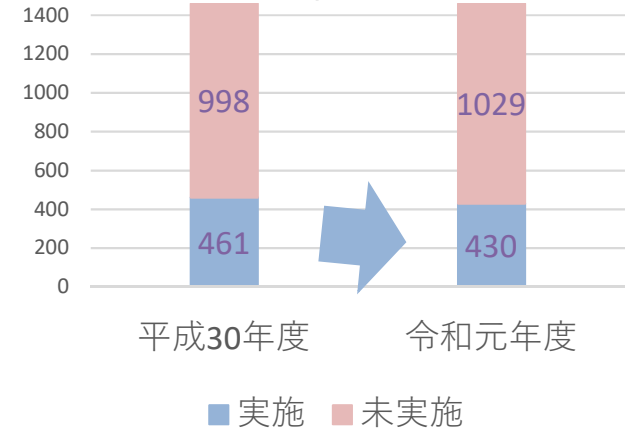


早期執行のための目標設定・公表の実施の有無

※グラフ内の数字は地方公共団体数


都道府県・指定都市

全67団体

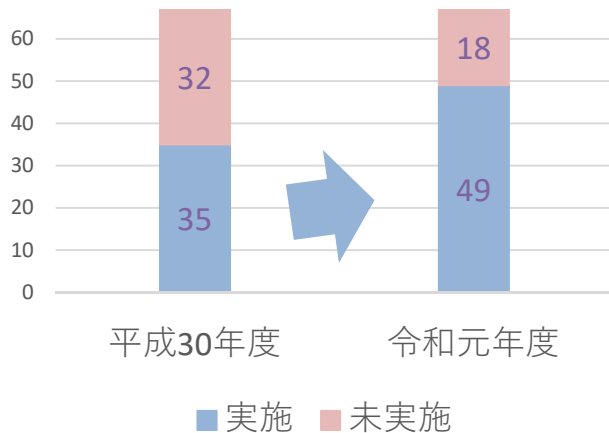


人口10万以上

全262団体(市区)

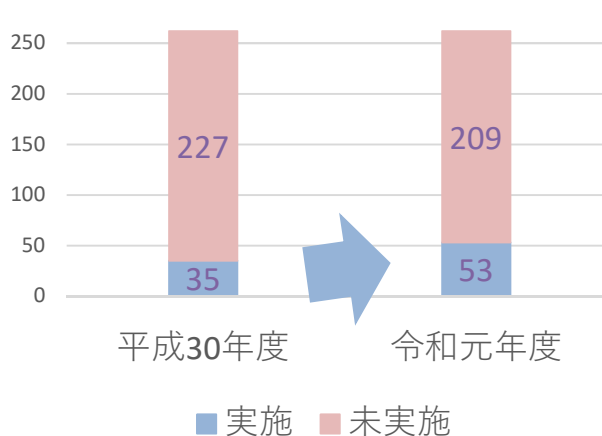

人口10万未満

全1459団体(市区町村)

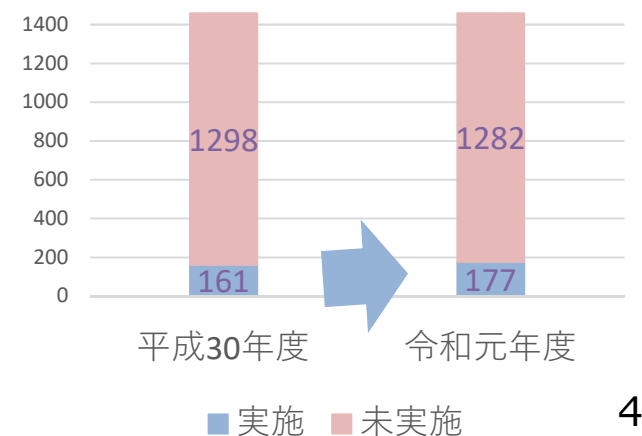

兵庫県

件数 : 395 件

- 設計が完了したら速やかに積算を行っている。
- 前年度のうちに設計が完了したものは、発注年度当初の4, 5, 6月に工事の発注手続きを行っている。

京都府 宇治市

件数 : 35 件

- 発注前年度のうちに設計・積算を完了させることにより、発注年度当初に速やかに発注手続を実施。

和歌山県

件数 : 260 件

- 年度当初の早期発注を可能とするため、前年度のうちに、設計・積算を行い、あらかじめ発注の準備を進めている。

熊本県 美里町

件数 : 44 件

- 前年度までに積算を行っている。
- 発注前年度に設計をし、発注年度の4, 5月に早期発注を行っている。

埼玉県

件数 : 202 件

- 前年度中に積算など発注の準備を終え、新年度4～6月に契約を行う工事を一定規模設定。

岩手県 矢巾町

件数 : 17 件

- 4月1日からの手続を速やかに行えるよう、旧年度単価にて2月中旬から積算を行うこととしている。

※件数比は「令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査(平成30年度実績)」より算出

年度末に工期末が集中しないよう上半期（特に4～6月）の執行率（契約率）の目標を設定し早期発注を目指します。また、発注の見通しを公表することにより、受注者が人材や資機材を計画的に準備でき、円滑な施工が見込まれます。

具体的な市区町村取組例（発注見通しを公表している市の例）




安曇野市
AZUMINO CITY

令和2年度建設工事発注予定（4月7日更新）

令和2年度 発注見通し表（第1四半期）

番号	工事名	工事箇所	工事概要	業種	入札予定月	工事期間(月数)	入札方法
1	令和2年度 道路橋梁維持事業 市道穂高1級20号線舗装補修工事	穂高	アスファルト舗装工 L=190m W=6.5m	舗装工事	6	4	競争入札
2	令和2年度 道路橋梁維持事業 市道豊科1級30号線舗装補修工事	豊科	アスファルト舗装工 L=100m W=6.5m	舗装工事	6	3	競争入札
3	令和2年度 防災安全交付金舗装修繕事業 市道豊科1級23号線舗装補修工事	豊科	アスファルト舗装工 L=300m W=7.5m	舗装工事	7	4	競争入札
4	令和2年度 防災安全交付金橋梁修繕事業 等々力大橋補修工事	穂高	橋梁補修 2橋	とび・土工・コンクリート工事	9	4	競争入札

- 学校・上下水道等を含め、**部局横断的に情報を集約**し、250万円を超える建設工事の年間発注見通し表を公表している。
- 四半期ごとの年4回更新している。




三条市
SANJO CITY

公共工事等発注見通し

平成31年度 三条市公共工事発注見通し一覧表【2回目】

No	発注機関	担当課	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工種	入札予定時期
1	三条市	建設課	市道北五百川中通線道路改良工事	北五百川地内	L=約60m	約8か月	一般競争入札	土木一式	第1四半期
2	三条市	建設課	市道井栗249号線道路改良工事	井栗一丁目地内	L=約40m	約3か月	一般競争入札	土木一式	第1四半期
3	三条市	建設課	月岡地内排水路改良工事	月岡地内	L=約30m	約3か月	一般競争入札	土木一式	第1四半期

- 学校・消防・上下水道等を含め、**市内全部局の情報を、部局横断的に集約**し、発注を予定している建設工事の年間見通し表を公表している。
- 発注見通しの公表回数を増やすため、様式を改善し、担当課の負担を軽減した。



帯広市
Obihiro City

建設工事発注予定情報

令和2年度 帯広市建設工事等 発注見通し（令和2年4月1日現在）

令和2年4月1日現在

番号	予算課	工程	工事名	工事担当課	概算総額(税別、千円)【公表用】	予定工期(月)	予定工期(日)	契約方法	施工場所	工事概要	特記事項【公表用】
1	土木課	土木一式	帯広圏都市計画道路3・4・34号青柳通整備工事(橋梁下部工)	土木課	135,100	9月	R3 3月	一般競争入札	西8～9条南31～34丁目	橋台2基 外 L=20m, W=18.00m	国の交付金等の内示額によっては、金額の変更あり
2	土木課	土木一式	愛国大橋補修工事	土木課	100,000	6月	R3 1月	一般競争入札	稲田町東2線	表面含浸材塗装塗替 外	国の交付金等の内示額によっては、金額の変更又は未執行の可能性あり

- 発注見通しに特記事項欄を設け、国の交付金の内示状況により取り止め等が見込まれる場合は、特記事項にその旨を記載している。

東京都

- 令和3年度を目標年度とした目標値を業種ごとに定め、**全庁を挙げて平準化**に係る取組を強化。
- ゼロ都債及び工期12か月未満の債務負担行為の積極的な活用を検討するとともに、庁内連絡会にて**各局の課題や優良な取組事例を共有**するなど、平準化に係る取組を推進。

業種	平準化率	
	目標 (R3年度)	参考 (H30年度実績)
建築	0.90以上	0.83
土木	0.90以上	0.79
設備	0.80以上	0.69

(東京都HPより)

山形県

- 令和元年度上半期における公共事業等の施行状況のうち、政府の補正予算を活用した事業の契約率については、早期発注に努め、概ね80%とした目標に対して、80.2%という結果になった。
- また、政府の補正予算を活用した事業以外の契約率については、概ね60%とした目標に対して、65.8%という結果となった。

区分	対象事業費 [a]	上半期目標 契約率	上半期実績	
			契約率 [b/a]	契約額 [b]
(1) 政府の補正予算を活用した事業分	22,270 百万円	80%	80.2%	17,853 百万円
(2) (1)を除く公共事業費等	98,261 百万円	60%	65.8%	64,645 百万円

(山形県HPより)

新潟県 長岡市

- 毎年、**全部局に対し、当初予算に係る公共事業費の上半期執行率の目標を設定**している。
- 土木部においては、執行状況について毎月目標を定め、随時達成状況を確認し、発注担当課で共有している。上半期に80%の執行を目標設定し、令和元年度は目標を達成した。

鹿児島県 鹿児島市

- 入契法及び「鹿児島市建設工事等発注見通しの公表要領」に基づき、工事等の発注見通しを公表している。
- また、鹿児島市公共事業等施行推進本部会議を毎年開催し、早期発注を目的とした上半期執行目標率を設定し、**全庁的に取り組んでいる**。

滋賀県 大津市

〇**部局を横断**した市内の発注見通しをHPに集約し、受注者が市の発注情報を入手しやすいよう工夫している。



令和2年度建設工事発注見通し

いいね! シェア ツイート 更新日：2020年04月01日

ここに公表する内容は、契約検査課において発注する見通しのある工事について記載したものであり、この時点で発注が予想されない工事、入札等の時期の見通しの立たない工事、工事概要が未定の工事については記載しておりません。
このため、この公表以後に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合、またはここに公表されていない工事が発注される場合があります。

施工課（令和2年4月1日現在）

PDF 施設整備課 (PDF: 57.8KB)

PDF 環境美化センター (PDF: ...)

PDF 北部クリーンセンター (PDF: ...)

PDF 都市魅力づくり推進課 (PDF: ...)

PDF 公園緑地課 (PDF: 72.5KB)

PDF 建築指導課 (PDF: 60.8KB)

PDF 道路・河川管理課 (PDF: ...)

PDF 建築課(工事) (PDF: 121.4KB)

工事名	種別	工事場所	入札契約の方法	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期
水管機設置工事	土木一式	大戸	一般競争入札	約6ヵ月	ステンレス管300A L=23m 下部工・基礎工 2箇所 ダクト内線管 φ300 L=50m	第2回中期
浄水場連絡管有収工事	土木一式	におの浜丁目	受注希望型指名競争入札	約4ヵ月	ダクト内線管 φ700 L=360m	第2回中期
配水管有収工事	土木一式	浜戸町ほか	受注希望型指名競争入札	約3ヵ月	ダクト内線管 φ200 L=230m 給水管切替工 40件	第1回中期
配水管有収工事	土木一式	一重山田丁目ほか	受注希望型指名競争入札	約4ヵ月	ダクト内線管 φ500 L=150m ダクト内線管 φ400 L=400m	第1回中期
配水管有収工事	土木一式	三井寺町ほか	受注希望型指名競争入札	約5ヵ月	ダクト内線管 φ600 L=90m ダクト内線管 φ500 L=80m ダクト内線管 φ200 L=210m ポリ塩化ビニル管 φ100 L=95m	第1回中期

関連リンク

企業局発注分（大津市企業局ホームページ）

秋田県 秋田市

〇発注見通しを毎月県に報告し発注情報の統合を行うとともに、市のHPにおいても、四半期に一度HPを更新し、最新の情報を受注者に提供している。



工事発注の見通し



ページ番号1002118 更新日 令和2年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

令和2年度

令和2年4月当初工事発注見通し (PDF 280.3KB)

令和2年度における建設工事の発注見通し(4月当初)

部局名	課所室名	No.	工事名	工事場所	種別	入札方法	入札時期	工事開始	工事終了	工事概要(必ず記載すること)
総務部	財産管理 活用課	1	秋田市庁舎分館トイレ改修工事	山王一丁目2番34号	建築	要件付一般競争入札	令和2年5月	令和2年6月	令和2年10月	秋田市庁舎分館1階および2階のトイレ改修(前室、給湯室を含む)
		2	秋田市庁舎分館トイレ改修機械設備工事	山王一丁目2番34号	管	要件付一般競争入札	令和2年5月	令和2年6月	令和2年10月	トイレ改修に伴う機械設備工事 また、給水方式を受水槽方式から直圧給水方式に変更
		3	秋田市庁舎分館トイレ改修電気設備工事	山王一丁目2番34号	電気	要件付一般競争入札	令和2年5月	令和2年6月	令和2年10月	トイレ改修に伴う電気設備工事
		4	旧森林総合利用施設解体工事	河辺三内字榎台	解体	要件付一般競争入札	令和2年5月	令和2年6月	令和2年10月	木造平家建 101.99㎡ 全解体
観光文化 スポーツ部	観光振興課	5	雄和ふるさと温泉給湯設備工事	雄和神々村字舟卸	機械器具設置	公募型指名競争入札	令和2年6月	令和2年7月	令和3年1月	配管設備、源泉井戸ポンプ設備、旧井戸埋填、ポンプ小屋建設、電気設備、自動制御設備工事
		6	雄和観光花さか栽培園管理棟建築工事	雄和妙法字榎塚	建築	公募型指名競争入札	令和2年8月	令和2年8月	令和3年3月	建築:木造平家建て(延床面積270平米程度)、電気設備、機械設備工事
		7	まちなか観光案内拠点整備に伴う環境整備工事	大町一丁目	建築	公募型指名競争入札	令和2年9月	令和2年10月	令和3年3月	建築:木造平家建て(延床面積13平米程度)、電気設備、機械設備、外構整備工事(面積300平米程度)

(参考資料)

都道府県による平準化の取組状況①

団体名	(さ)債務負担行為の活用				(し)柔軟な工期設定		(す)速やかな繰越手続	(せ)積算の前倒し	(そ)早期執行のための目標設定	(参考)平準化率
	工期1年未満工事における債務負担行為の設定		ゼロ債務負担行為の設定		有無	状況				
	有無	状況	有無	状況						
北海道	○	14.8%	○	4.3%	○	47.6%	11月～12月初承認	○	×	0.70
青森県	×	×	○	7.0%	○	10.4%	その他	○	○	0.73
岩手県	○	14.8%	○	3.7%	○	39.0%	その他	○	○	0.88
宮城県	○	12.2%	○	2.9%	○	100.0%	×	○	×	0.93
秋田県	×	×	○	8.6%	○	2.8%	11月～12月初承認	○	○	0.84
山形県	○	0.3%	○	4.8%	○	3.0%	11月～12月初承認	×	○	0.77
福島県	○	-	○	-	○	-	4月～10月初承認	○	○	0.76
茨城県	○	0.1%	○	6.6%	○	6.6%	×	○	○	0.64
栃木県	○	0.0%	○	3.5%	○	62.8%	その他	○	○	0.72
群馬県	○	1.7%	○	15.1%	○	10.2%	その他	○	○	0.75
埼玉県	○	3.5%	○	6.0%	○	29.2%	4月～10月初承認	○	○	0.70
千葉県	×	×	○	5.3%	○	7.5%	4月～10月初承認	○	○	0.60
東京都	○	-	○	-	○	-	その他	○	○	0.76
神奈川県	○	4.0%	○	11.4%	×	×	4月～10月初承認	×	○	0.64
新潟県	○	-	○	-	○	-	×	×	○	0.88
富山県	×	×	○	-	○	-	その他	×	×	0.79
石川県	○	3.4%	○	1.7%	×	×	11月～12月初承認	○	×	0.71
福井県	○	0.4%	○	2.4%	○	0.0%	4月～10月初承認	○	×	0.84
山梨県	○	4.5%	○	1.8%	○	0.0%	4月～10月初承認	○	○	0.72
長野県	○	35.2%	○	8.3%	○	6.4%	×	×	○	0.80
岐阜県	○	17.7%	○	4.4%	○	10.1%	4月～10月初承認	○	○	0.78
静岡県	○	17.1%	○	10.7%	○	0.8%	11月～12月初承認	×	○	0.67
愛知県	○	1.7%	○	1.8%	×	×	その他	×	×	0.66
三重県	○	38.6%	×	×	○	1.6%	11月～12月初承認	×	○	0.76

※(さ)～(そ)の項目については、令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)より算出 ※(さ)～(す)の設定状況、(せ)については平成30年度実績

※平準化率の定義: 4～6月期の工事平均稼働件数/年度の工事平均稼働件数

※平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事(1件当たり500万円以上)を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出(データ抽出時点: 令和元年5月18日)

※(さ)・(し)における各取組状況について、割合未回答の地方公共団体は「-」と表示

都道府県による平準化の取組状況②

団体名	(さ)債務負担行為の活用				(し)柔軟な工期設定		(す)速やかな繰越手続	(せ)積算の前倒し	(そ)早期執行のための目標設定	(参考)平準化率
	工期1年未満工事における債務負担行為の設定		ゼロ債務負担行為の設定		有無	状況				
	有無	状況	有無	状況						
滋賀県	○	31.6%	○	7.0%	×	×	その他	○	○	0.75
京都府	○	7.4%	○	1.0%	○	5.3%	11月～12月初承認	×	○	0.79
大阪府	○	0.8%	○	0.1%	×	×	その他	○	○	0.76
兵庫県	○	13.4%	○	10.8%	○	2.1%	×	○	○	0.81
奈良県	○	14.5%	○	3.1%	○	2.9%	4月～10月初承認	○	○	0.77
和歌山県	○	13.2%	○	0.6%	○	0.0%	4月～10月初承認	○	○	0.72
鳥取県	○	1.0%	○	4.5%	○	1.8%	4月～10月初承認	×	○	0.83
島根県	○	4.4%	○	3.0%	○	0.4%	その他	×	×	0.82
岡山県	○	-	○	-	○	0.6%	4月～10月初承認	×	○	0.56
広島県	○	37.4%	×	×	○	0.0%	4月～10月初承認	○	○	0.61
山口県	×	×	○	3.5%	×	×	11月～12月初承認	○	○	0.80
徳島県	○	13.0%	○	1.6%	○	1.3%	×	×	○	0.68
香川県	○	-	○	-	○	-	その他	○	○	0.82
愛媛県	○	0.0%	○	2.7%	○	12.6%	4月～10月初承認	○	○	0.72
高知県	○	0.0%	○	0.4%	○	5.5%	その他	○	○	0.63
福岡県	○	0.7%	○	6.2%	○	1.9%	11月～12月初承認	○	×	0.71
佐賀県	×	×	○	3.9%	○	0.0%	4月～10月初承認	×	○	0.81
長崎県	○	3.3%	○	9.0%	×	×	その他	×	○	0.65
熊本県	○	0.0%	○	0.5%	○	49.8%	×	×	×	0.87
大分県	○	5.9%	○	7.2%	×	×	4月～10月初承認	○	○	0.87
宮崎県	○	1.2%	○	3.7%	○	7.5%	その他	○	○	0.76
鹿児島県	○	1.6%	○	14.4%	○	10.5%	×	○	○	0.65
沖縄県	×	×	○	-	○	-	その他	○	○	0.71

※(さ)～(そ)の項目については、令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)より算出 ※(さ)～(す)の設定状況、(せ)については平成30年度実績

※平準化率の定義: 4～6月期の工事平均稼働件数/年度の工事平均稼働件数

※平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事(1件当たり500万円以上)を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出(データ抽出時点: 令和元年5月18日)

※(さ)・(し)における各取組状況について、割合未回答の地方公共団体は「-」と表示

指定都市による平準化の取組状況

団体名	(さ)債務負担行為の活用				(し)柔軟な工期設定		(す)速やかな繰越手続	(せ)積算の前倒し	(そ)早期執行のための目標設定	(参考)平準化率
	工期1年未満工事における債務負担行為の設定		ゼロ債務負担行為の設定		有無	状況				
	有無	状況	有無	状況						
札幌市	○	1.2%	○	12.2%	○	0.9%	その他	○	○	0.79
仙台市	○	2.3%	○	1.7%	○	2.7%	×	○	×	0.66
さいたま市	×	×	○	9.5%	×	×	11月～12月初承認	○	○	0.63
千葉市	×	×	○	7.6%	○	0.0%	×	○	○	0.42
横浜市	×	×	○	1.1%	○	1.1%	×	○	○	0.75
川崎市	○	1.6%	○	0.0%	○	0.0%	その他	○	×	0.67
相模原市	×	×	○	-	○	-	その他	×	×	0.45
新潟市	○	3.3%	○	1.2%	×	×	その他	×	×	0.69
静岡市	○	1.1%	○	5.4%	○	4.3%	4月～10月初承認	×	○	0.70
浜松市	○	0.7%	○	8.7%	○	1.6%	11月～12月初承認	○	○	0.46
名古屋市	○	6.4%	○	7.5%	○	0.2%	4月～10月初承認	○	×	0.71
京都市	○	4.0%	○	0.6%	○	0.0%	11月～12月初承認	○	○	0.65
大阪市	○	0.0%	○	0.3%	○	0.0%	×	×	○	0.64
堺市	○	3.4%	○	12.5%	×	×	その他	○	×	0.65
神戸市	○	2.4%	○	2.7%	○	3.3%	11月～12月初承認	○	○	0.61
岡山市	○	0.8%	○	5.0%	×	×	4月～10月初承認	○	×	0.69
広島市	○	4.8%	○	2.0%	○	3.1%	×	×	×	0.80
北九州市	○	1.4%	○	0.8%	○	0.0%	11月～12月初承認	○	○	0.61
福岡市	○	2.4%	○	6.9%	×	×	その他	×	○	0.59
熊本市	×	×	○	0.3%	○	17.6%	×	×	×	0.75

※(さ)～(そ)の項目については、令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)より算出 ※(さ)～(す)の設定状況、(せ)については平成30年度実績


※平準化率の定義: 4～6月期の工事平均稼働件数/年度の工事平均稼働件数

※平準化率は、「一般財団法人日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター」に登録された工事(1件当たり500万円以上)を団体区分毎に全ての工事を足し合わせて算出(データ抽出時点: 令和元年5月18日)

※(さ)・(し)における各取組状況について、割合未回答の地方公共団体は「-」と表示

市区町村による取組状況（債務負担行為の活用）


都道府県別の市区町村による債務負担行為設定の有無の状況

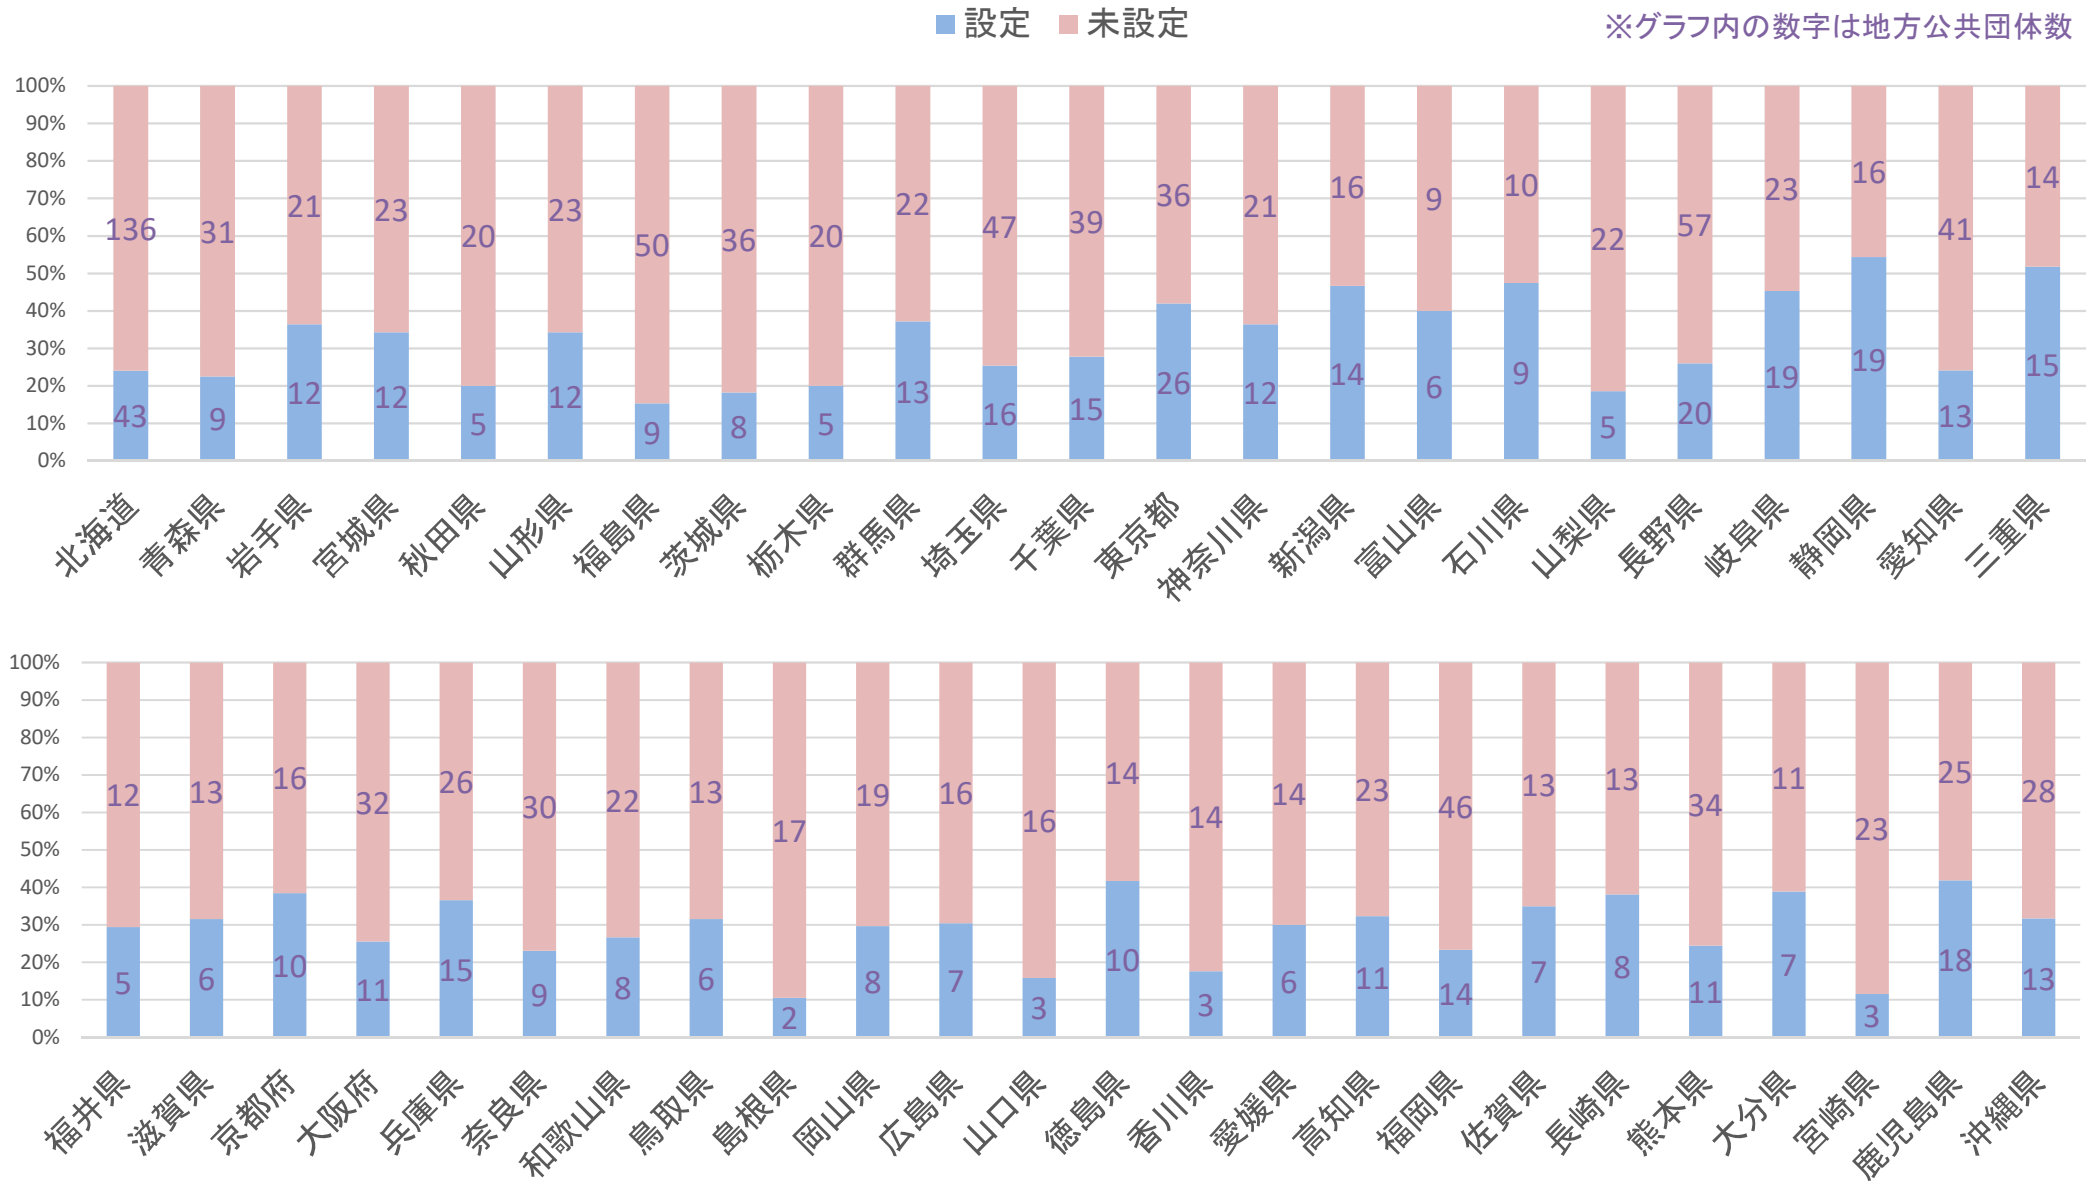

出典: 令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)

市区町村による取組状況（工期1年未満工事での債務負担行為の活用）

都道府県別の市区町村による工期1年未満の工事での債務負担行為の設定の有無の状況

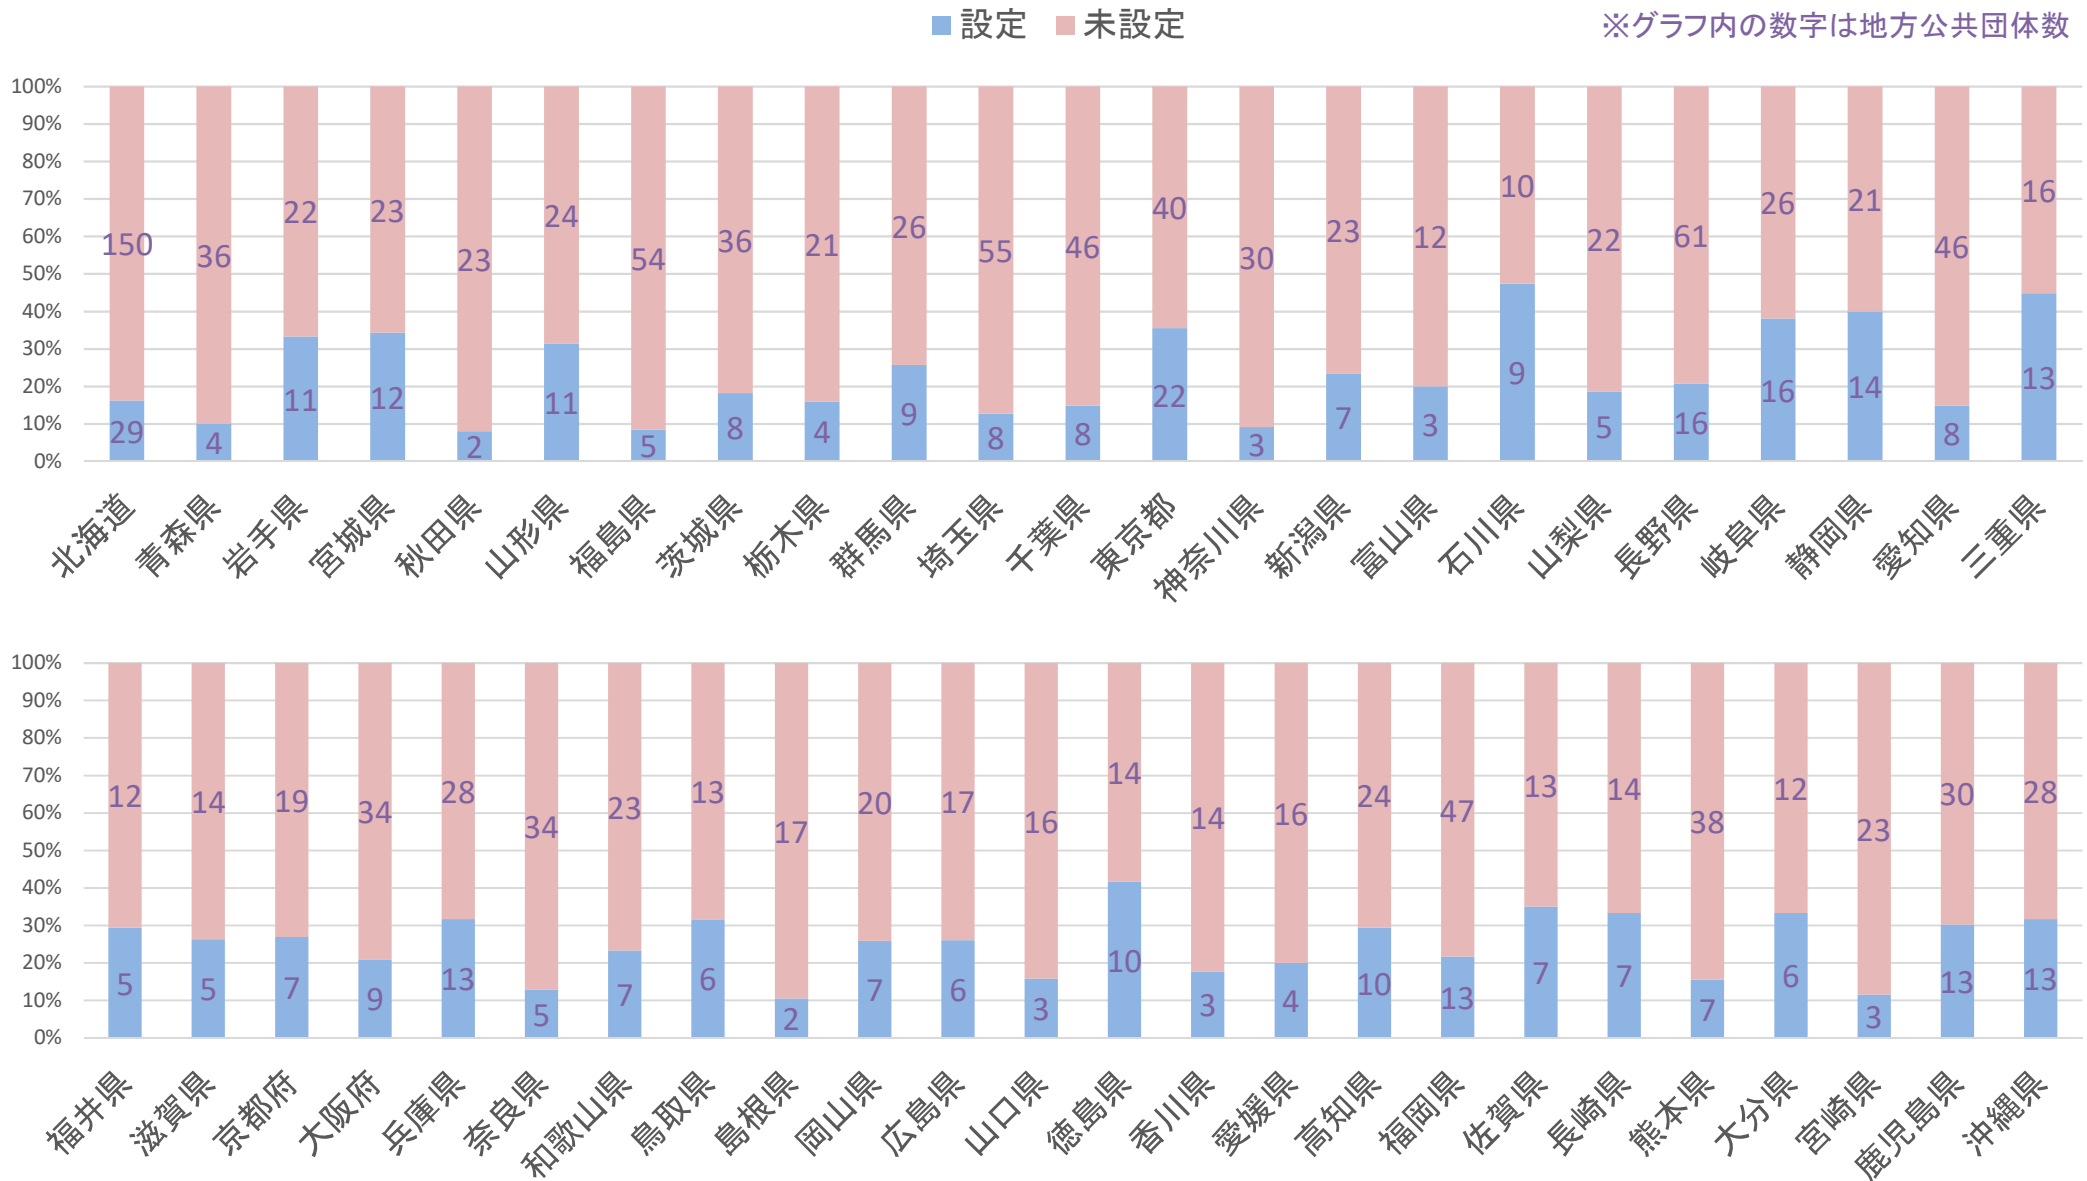


出典:令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)

市区町村による取組状況（ゼロ債務負担行為の活用）

都道府県別の市区町村によるゼロ債務負担行為の設定の有無の状況

■ 設定 ■ 未設定


※グラフ内の数字は地方公共団体数

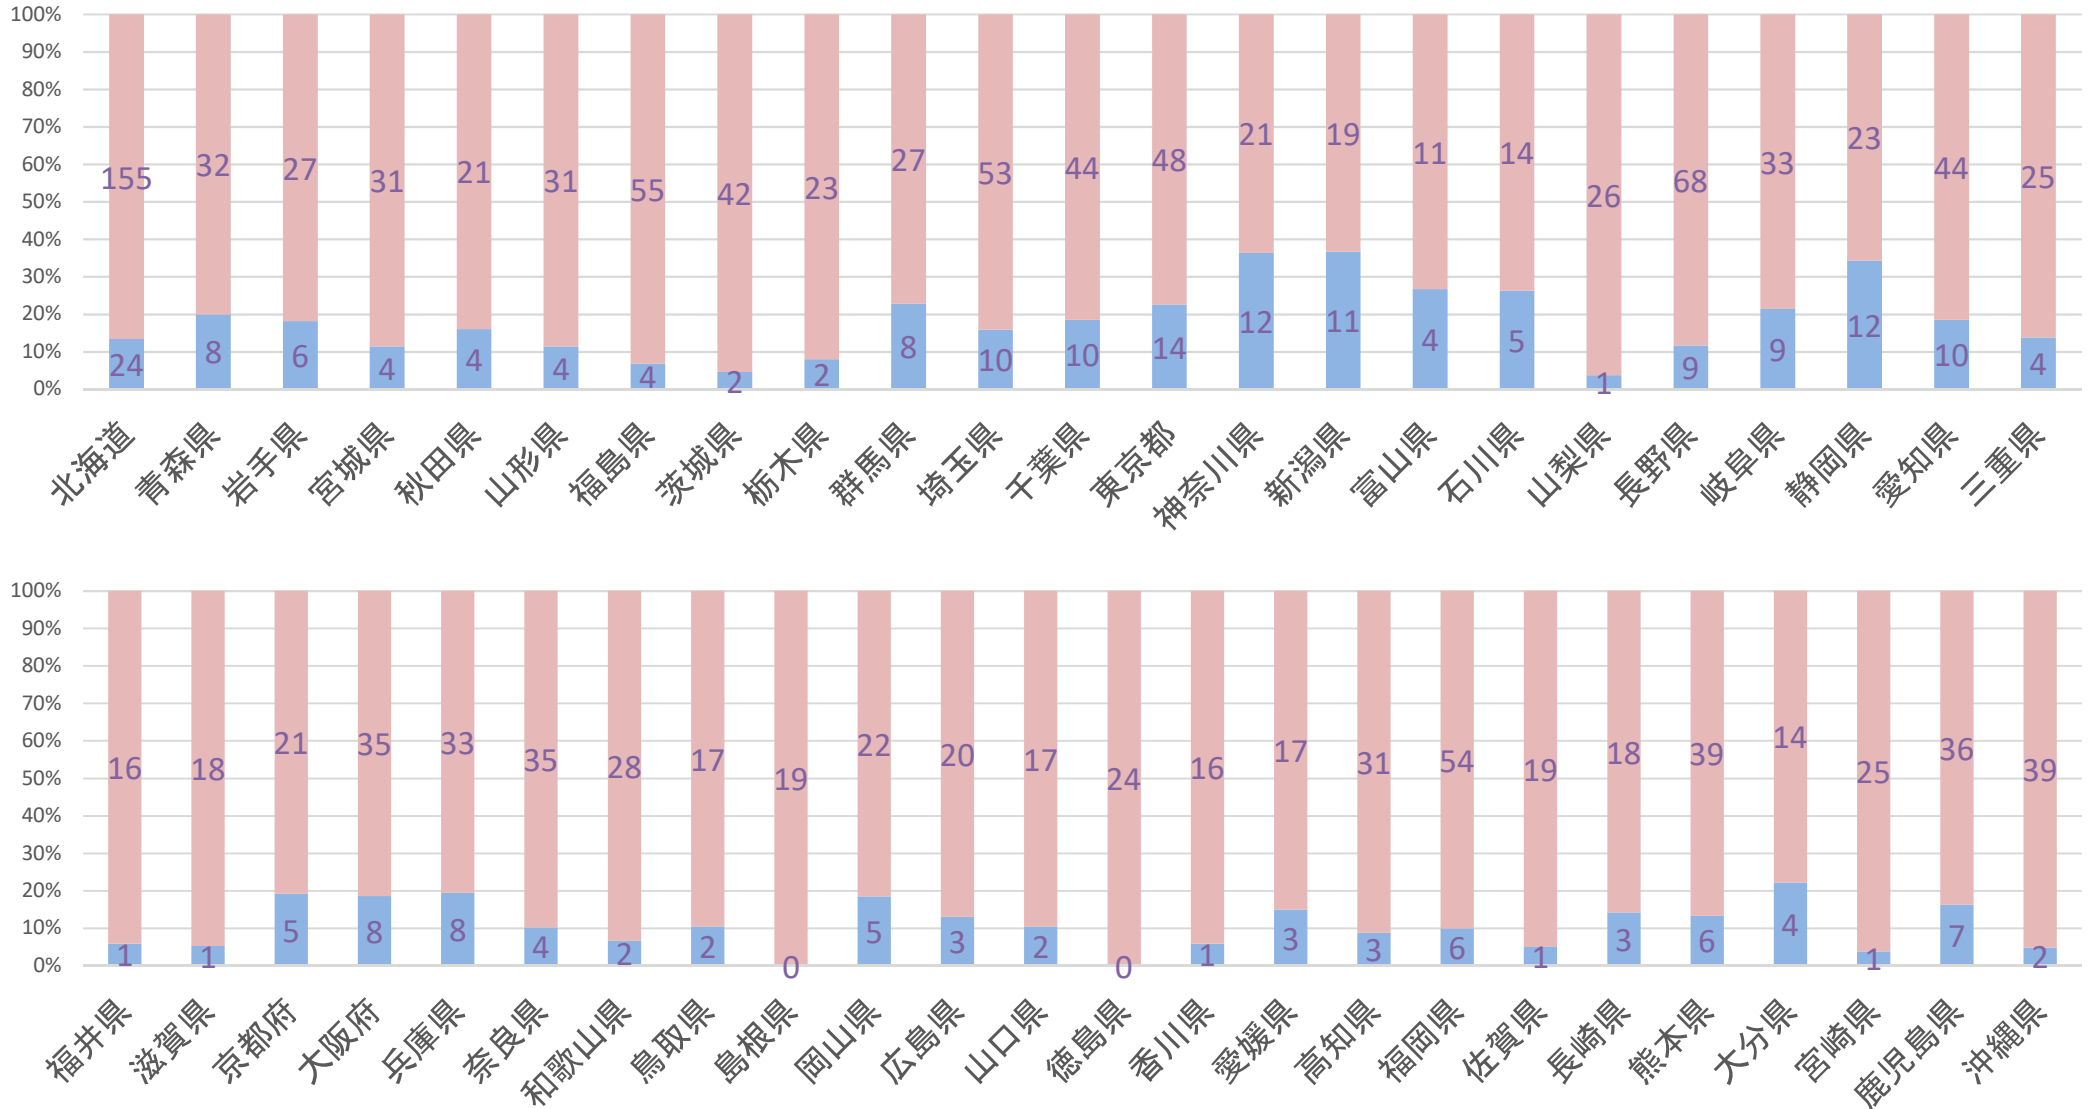

出典:令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)

市区町村による取組状況（柔軟な工期設定）

都道府県別の市区町村による柔軟な工期設定の有無の状況

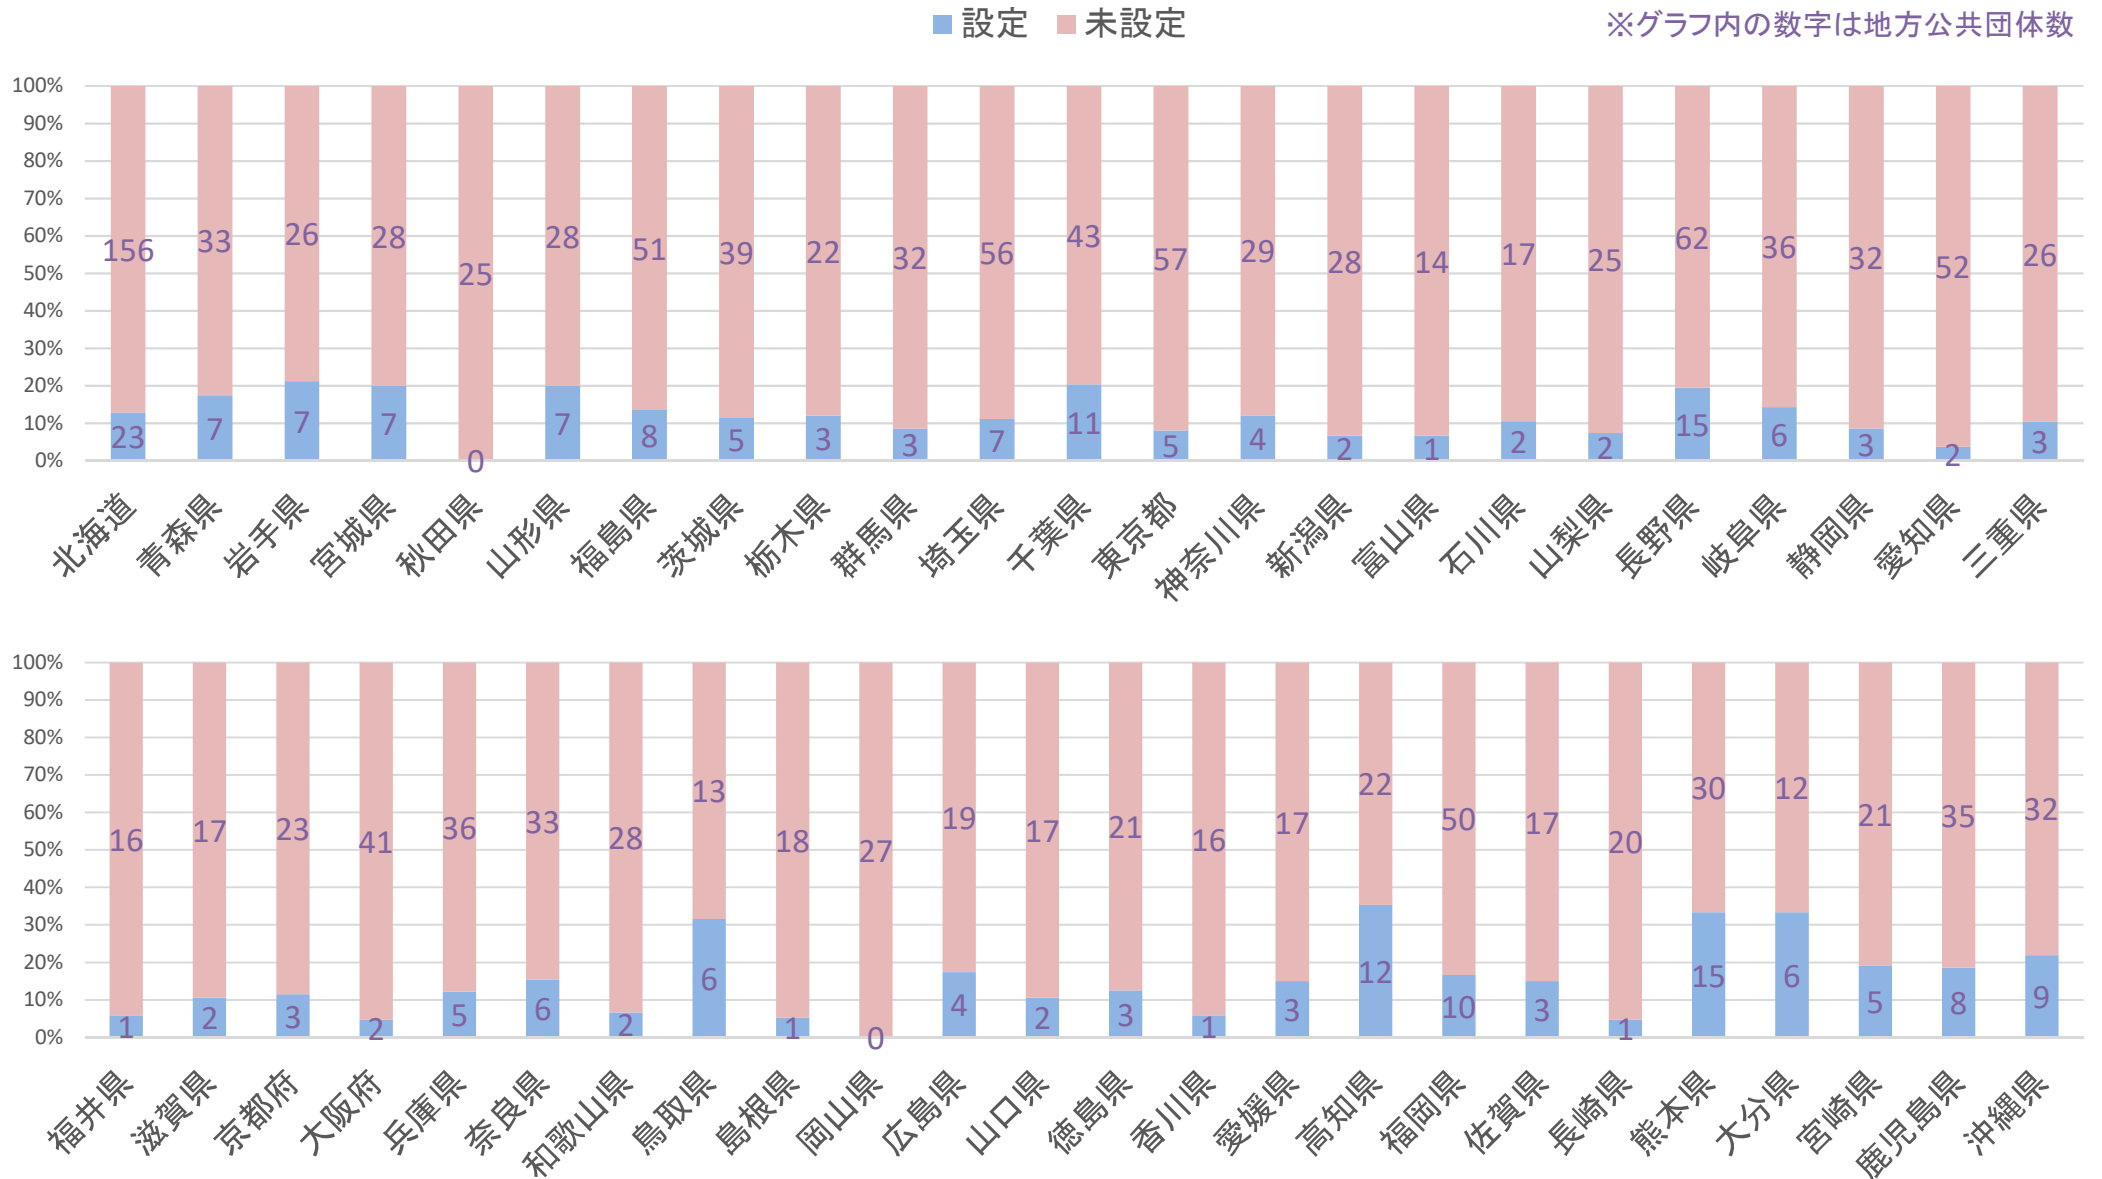



出典: 令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)

市区町村による取組状況（速やかな繰越手続）

都道府県別の市区町村による速やかな繰越手続の実施の有無の状況

■ 実施 ■ 未実施


※グラフ内の数字は地方公共団体数

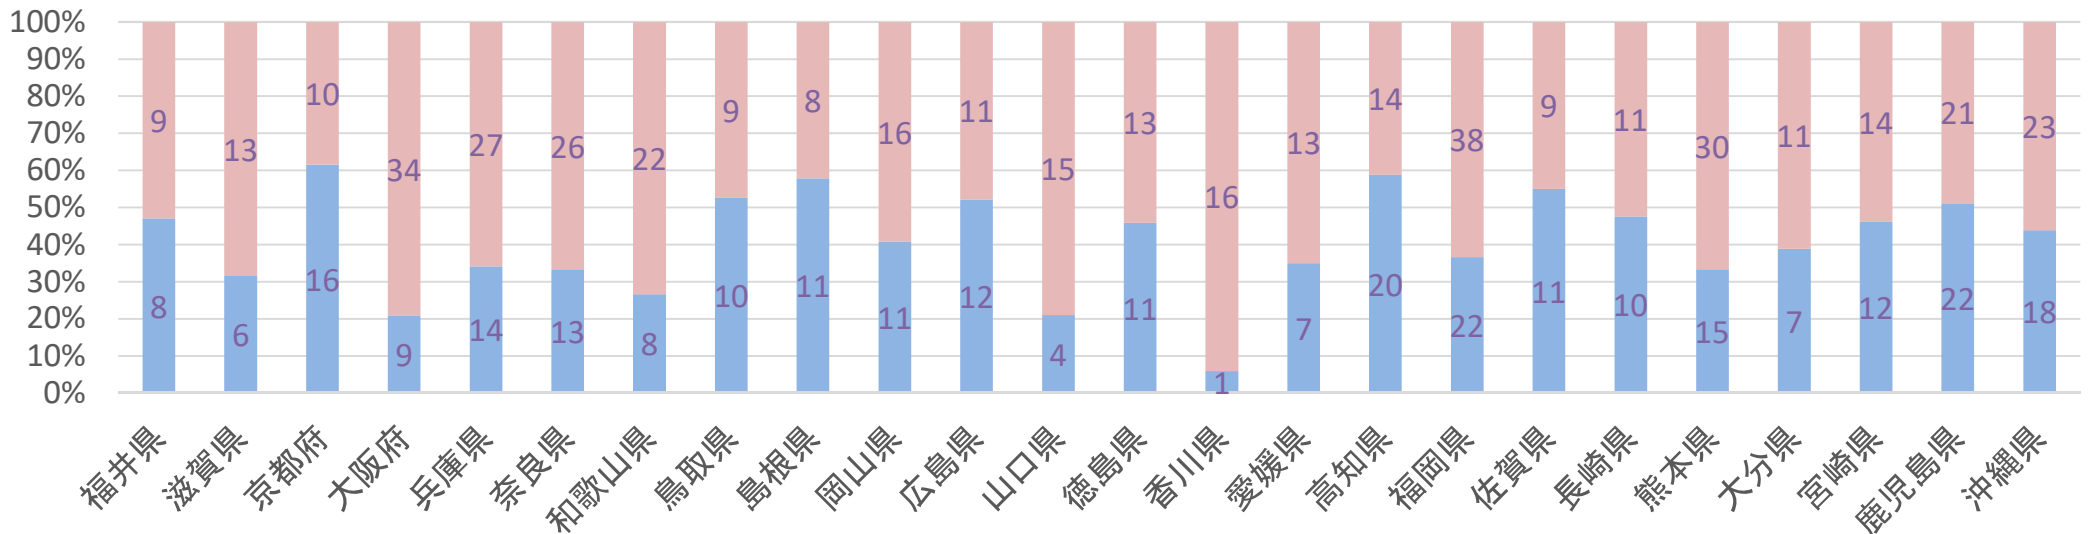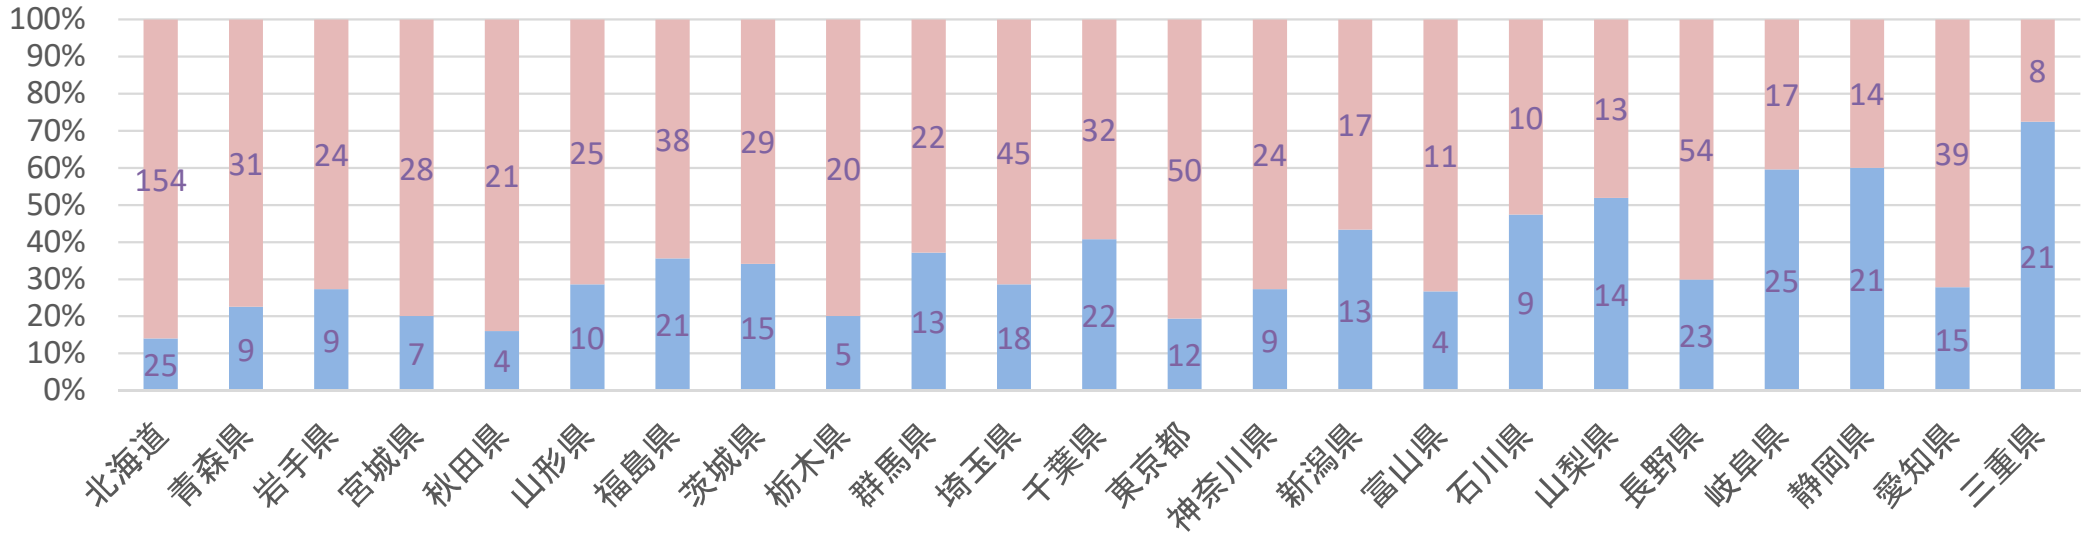

出典:令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)

市区町村による取組状況（積算の前倒し）


都道府県別の市区町村による積算の前倒しの実施の有無の状況

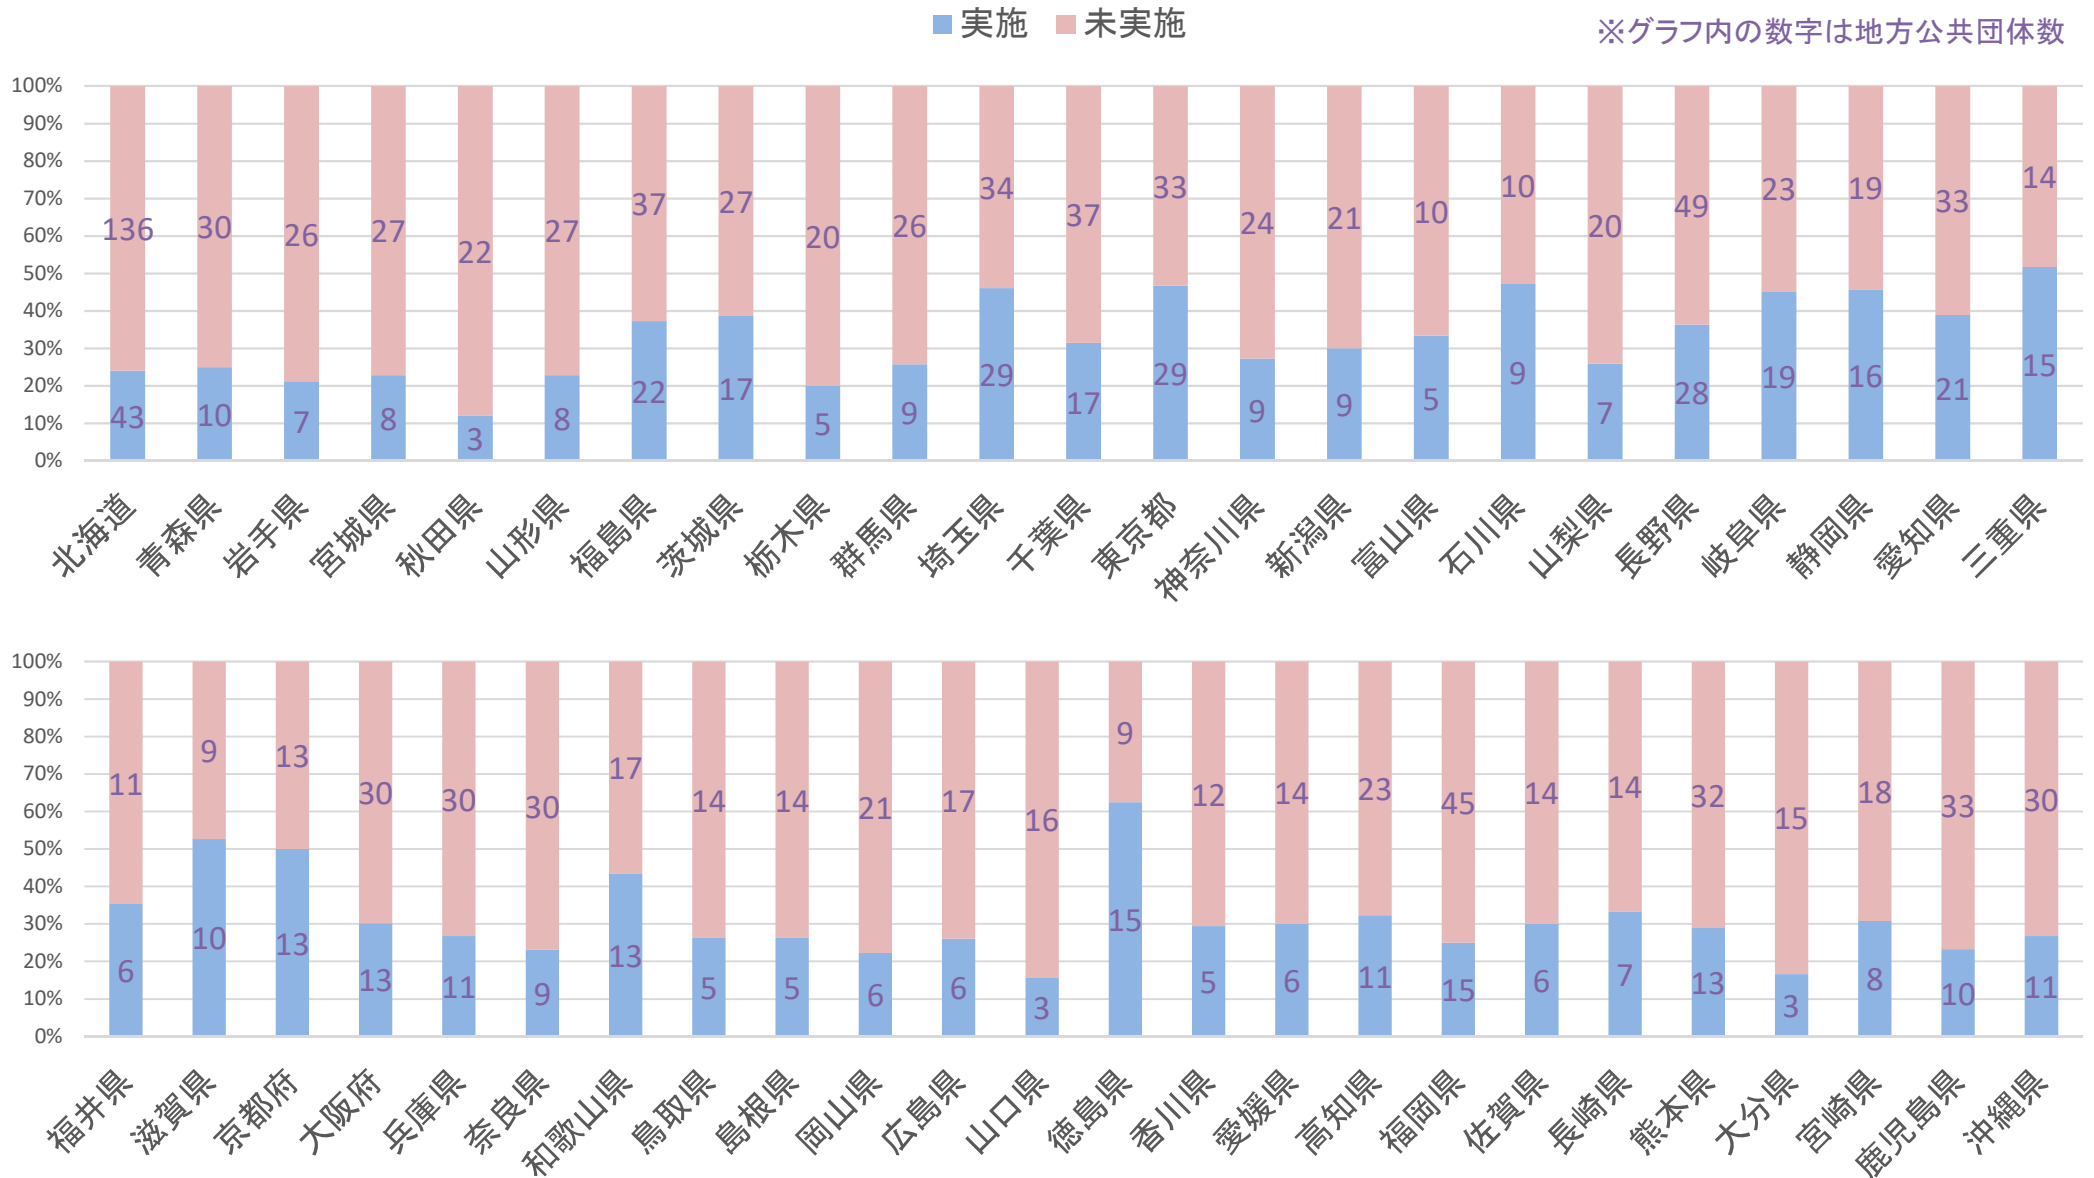

出典: 令和元年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査(令和元年11月1日時点)

市区町村による取組状況（早期執行のための目標設定・公表）

都道府県別の市区町村による早期執行のための目標設定・公表の実施の有無の状況

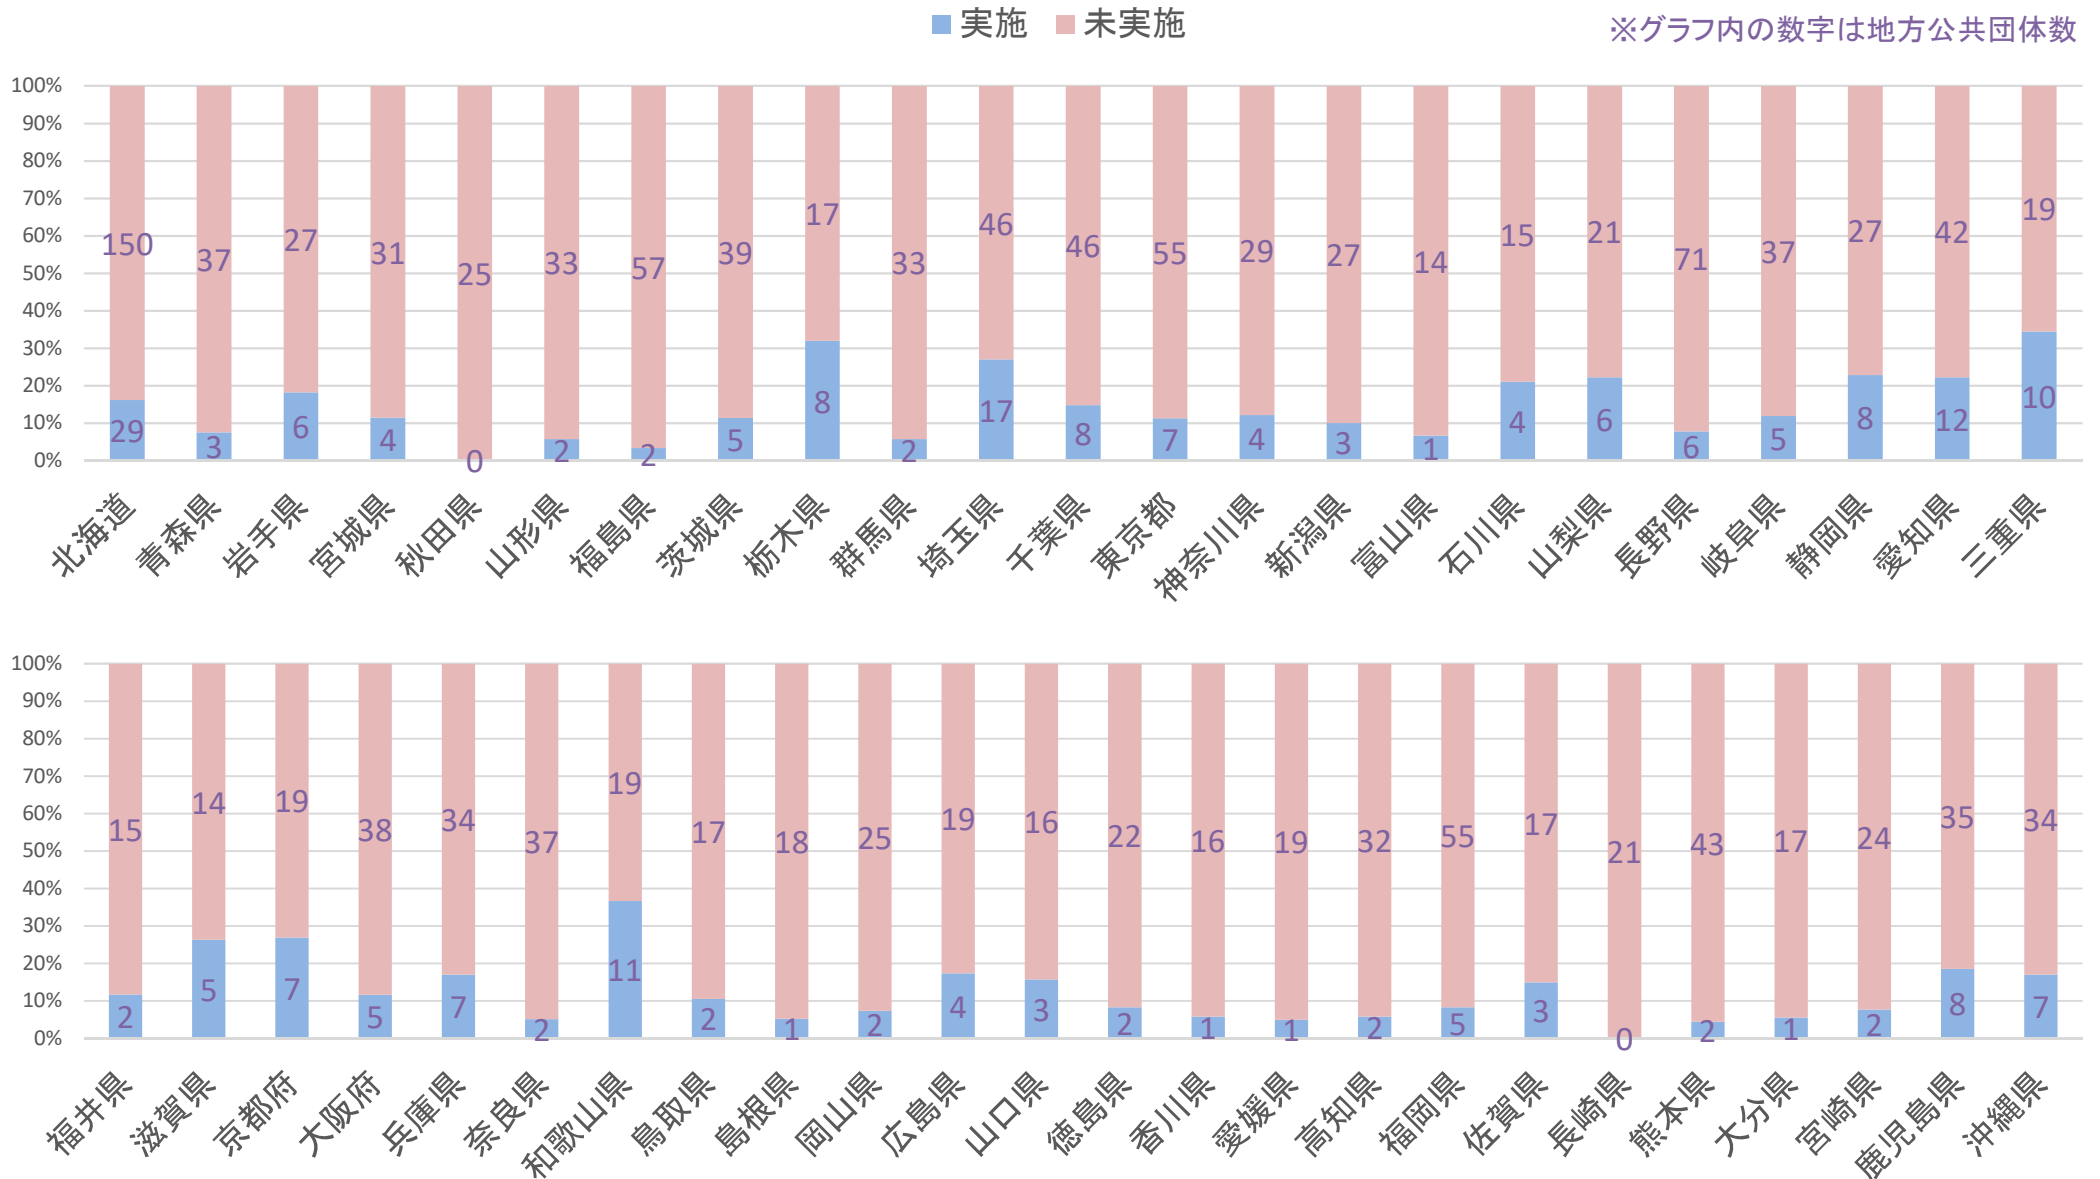

改正労働基準法(平成31年4月1日施行)

	現行規制	改正労働基準法(平成30年6月29日成立)
原則	<<労働基準法で法定>> (1) 1日8時間・1週間40時間 (2) 36協定を結んだ場合、協定で定めた時間まで時間外労働可能 (3) <u>災害その他、避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、労働時間の延長が可能</u> (労基法33条)	<<同左>>
36協定の限度	<<厚生労働大臣告示：強制力なし>> (1) ・原則、月45時間かつ年360時間 ・ただし、臨時的で特別な事情がある場合、延長に上限なし(年6か月まで)(特別条項) (2) ・ <u>建設の事業は、(1)の適用を除外</u>	<<労働基準法改正により法定：罰則付き>> (1) ・原則、月45時間かつ年360時間 ・・・第36条第4項 ・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定 ① <u>年720時間</u> (月平均60時間) ・・・第36条第5項 ② <u>年720時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも上回ることの出来ない上限を設定</u> a. 2～6ヶ月の平均でいずれも80時間以内(休日出勤を含む) ・・・第36条第5項第3号 b. 単月100時間未満(休日出勤を含む) ・・・第36条第6項第2号 c. 原則(月45時間)を上回る月は年6回を上限 ・・・第36条第5項 (2) 建設業の取り扱い ・施行後5年間 現行制度を適用 ・・・第139条第2項 ・施行後5年以降 <u>一般則を適用</u> 。ただし、 <u>災害からの復旧・復興については、上記(1)②a.bは適用しない(※)</u> が、 <u>将来的には一般則の適用を目指す</u> 。 ・・・第139条第1項 ※労基法33条は事前に予測できない災害などに限定されているため、復旧・復興の場合でも臨時の必要性がない場合は対象とならない

「働き方改革実行計画」※に記載された今後の取組 ※3月28日働き方改革実現会議決定


- 適正な工期設定、適切な賃金水準の確保、週休2日の推進等に向け、発注者を含めた関係者で構成する協議会を設置
- 制度的な対応を含め、時間外労働規制の適用に向けた必要な環境整備を進め、あわせて業界等の取組を支援
- 技術者・技能労働者の確保・育成やその活用を図るための、制度的な対応を含めた取組
- **施工時期の平準化**、全面的なICTの活用、書類の簡素化、中小建設企業への支援等による生産性の向上

技能者等の推移

- 建設業就業者： 685万人(H9) → 498万人(H22) → 503万人(H30)
- 技術者： 41万人(H9) → 31万人(H22) → 33万人(H30)
- 技能者： 455万人(H9) → 331万人(H22) → 328万人(H30)


建設業就業者の高齢化の進行

- 建設業就業者は、55歳以上が約35%、29歳以下が約11%と高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成29年と比較して55歳以上が約5万人増加、29歳以下は約1万人増加。

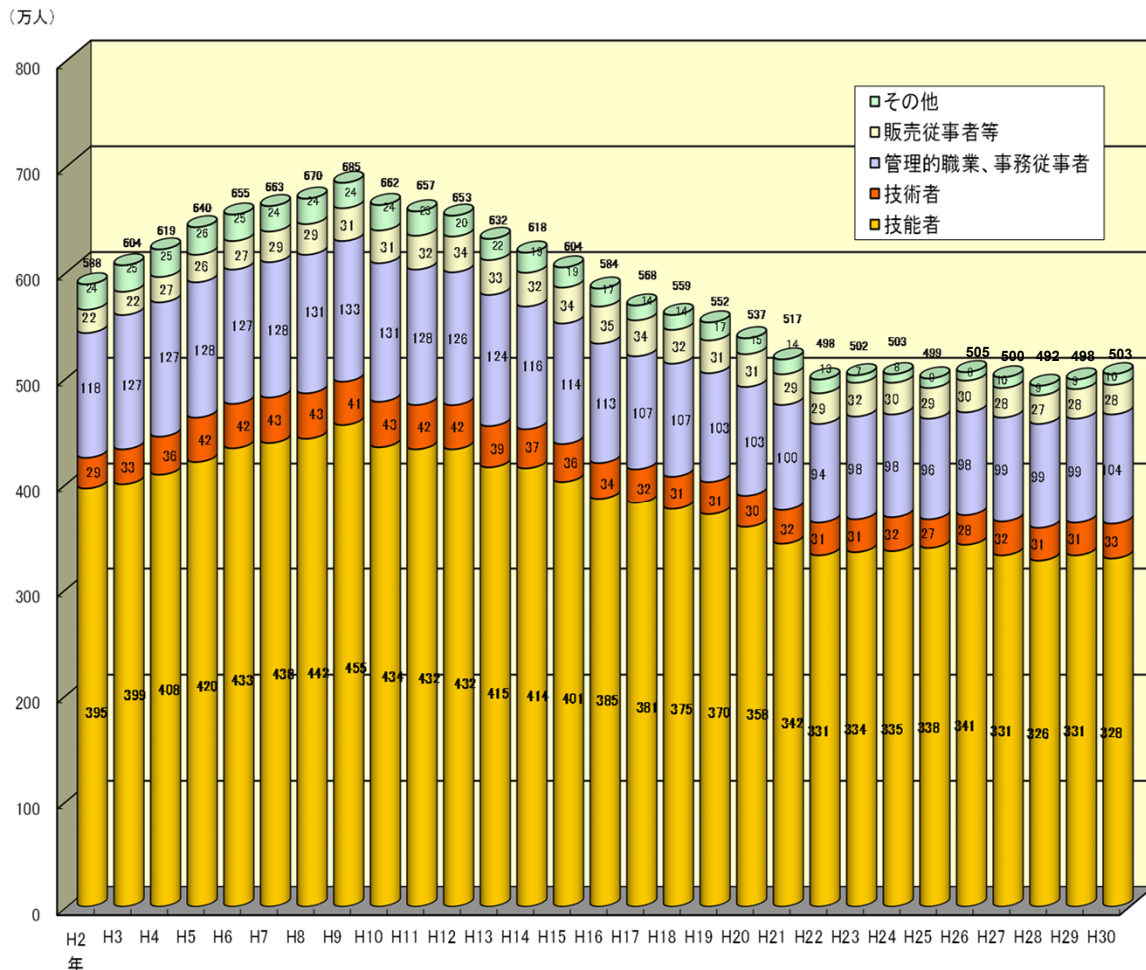

出典：総務省「労働力調査」(暦年平均)を基に国土交通省で算出

(※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値)

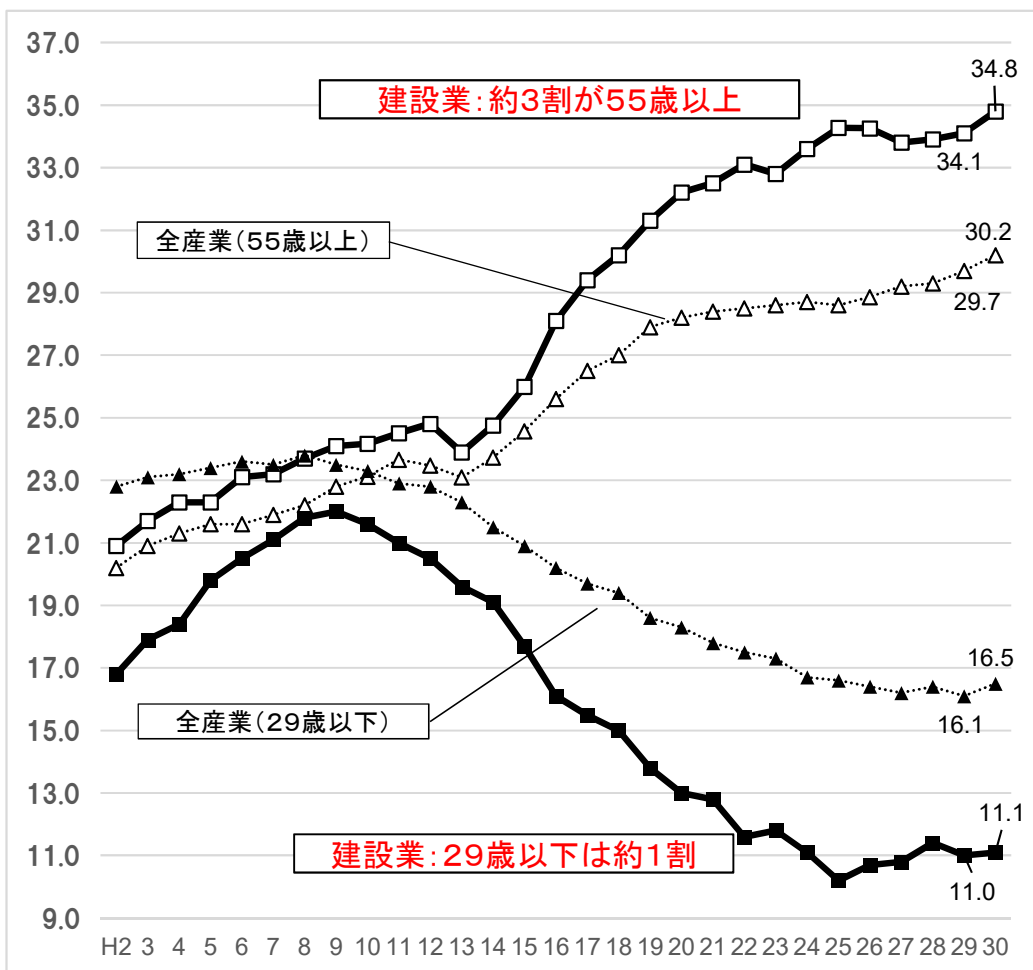


建設業：約3割が55歳以上


建設業：29歳以下は約1割

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出

- 60歳以上の技能者は全体の約4分の1を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれます。
- これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約10%程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題です。


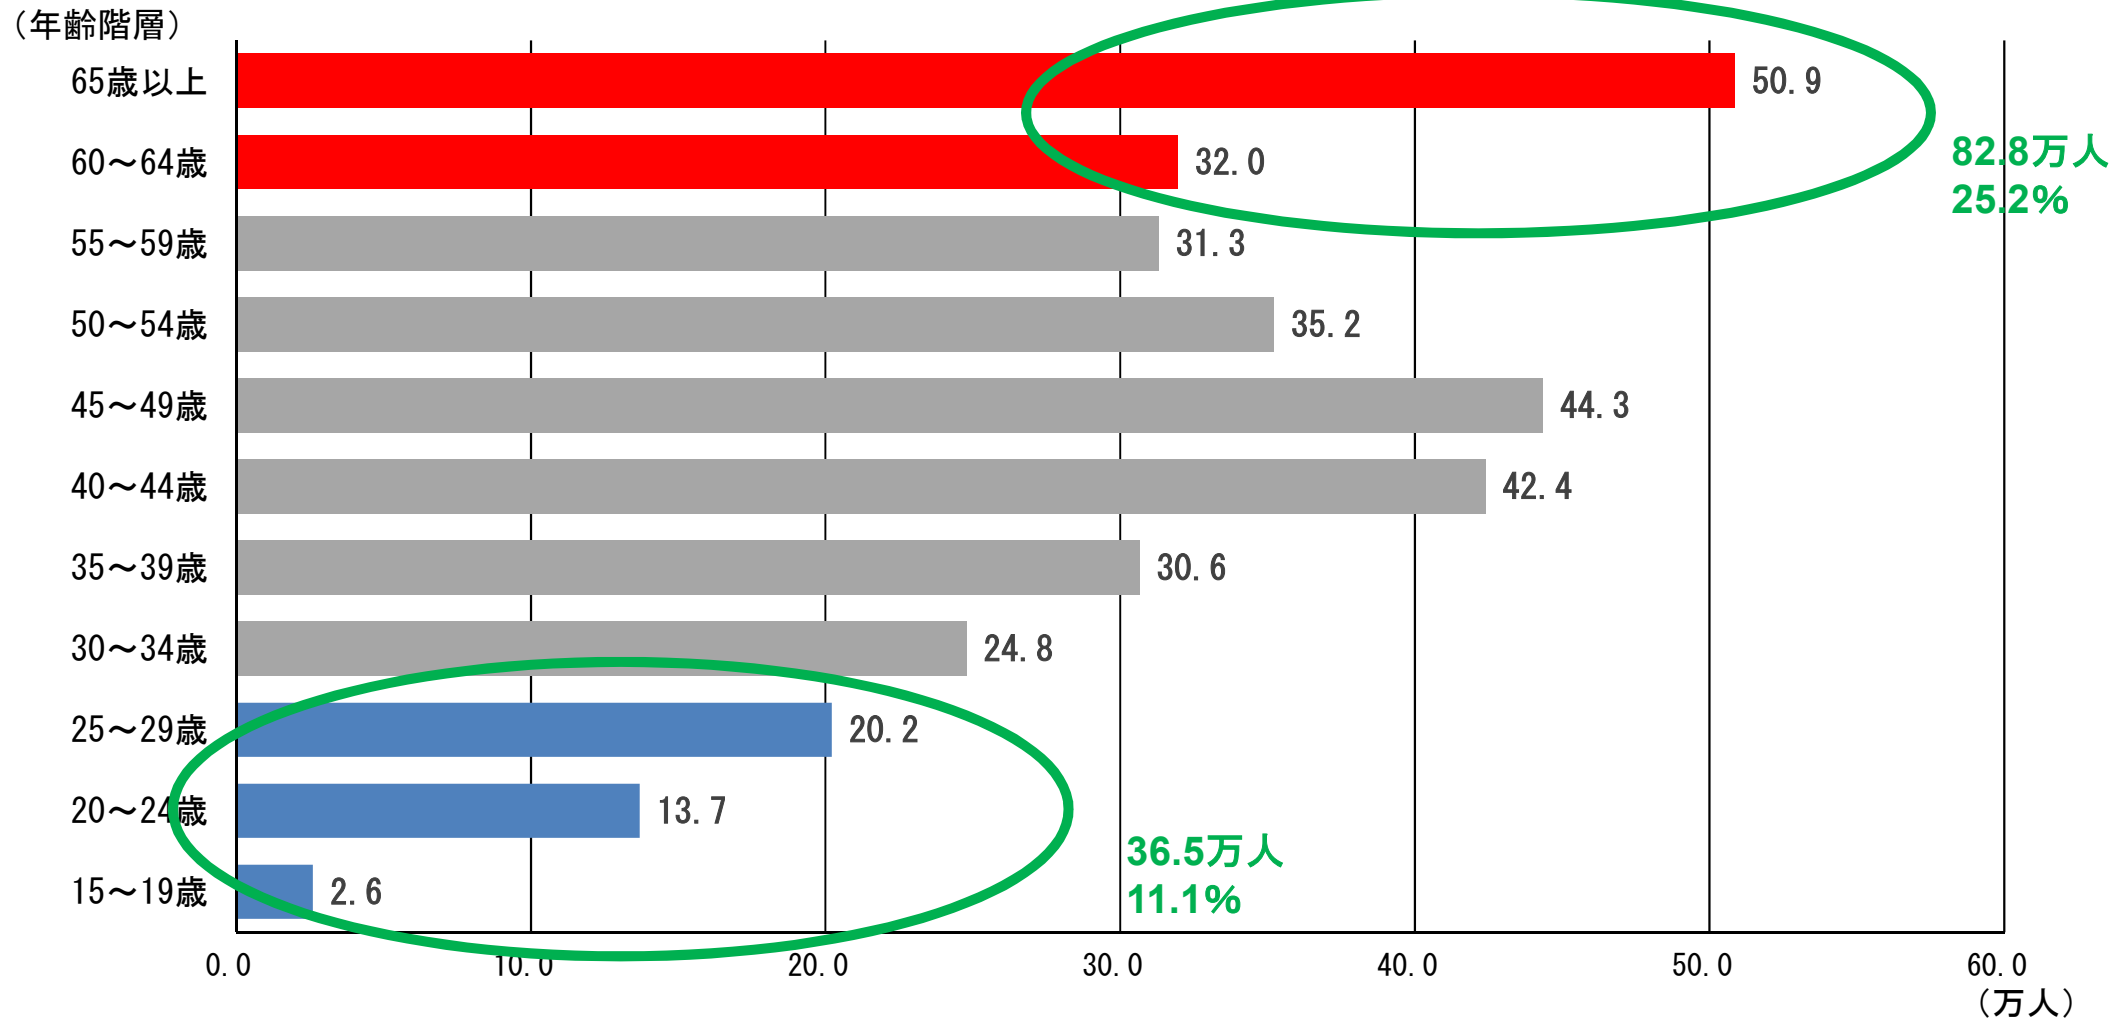


- 製造業の賃金のピークは50～54歳であることに対し、建設業の賃金ピークは45～49歳です。
- 賃金カーブのピーク時期が製造業よりも早く到来する傾向があり、現場の管理、後進の指導等のスキルが評価されていない可能性があります。

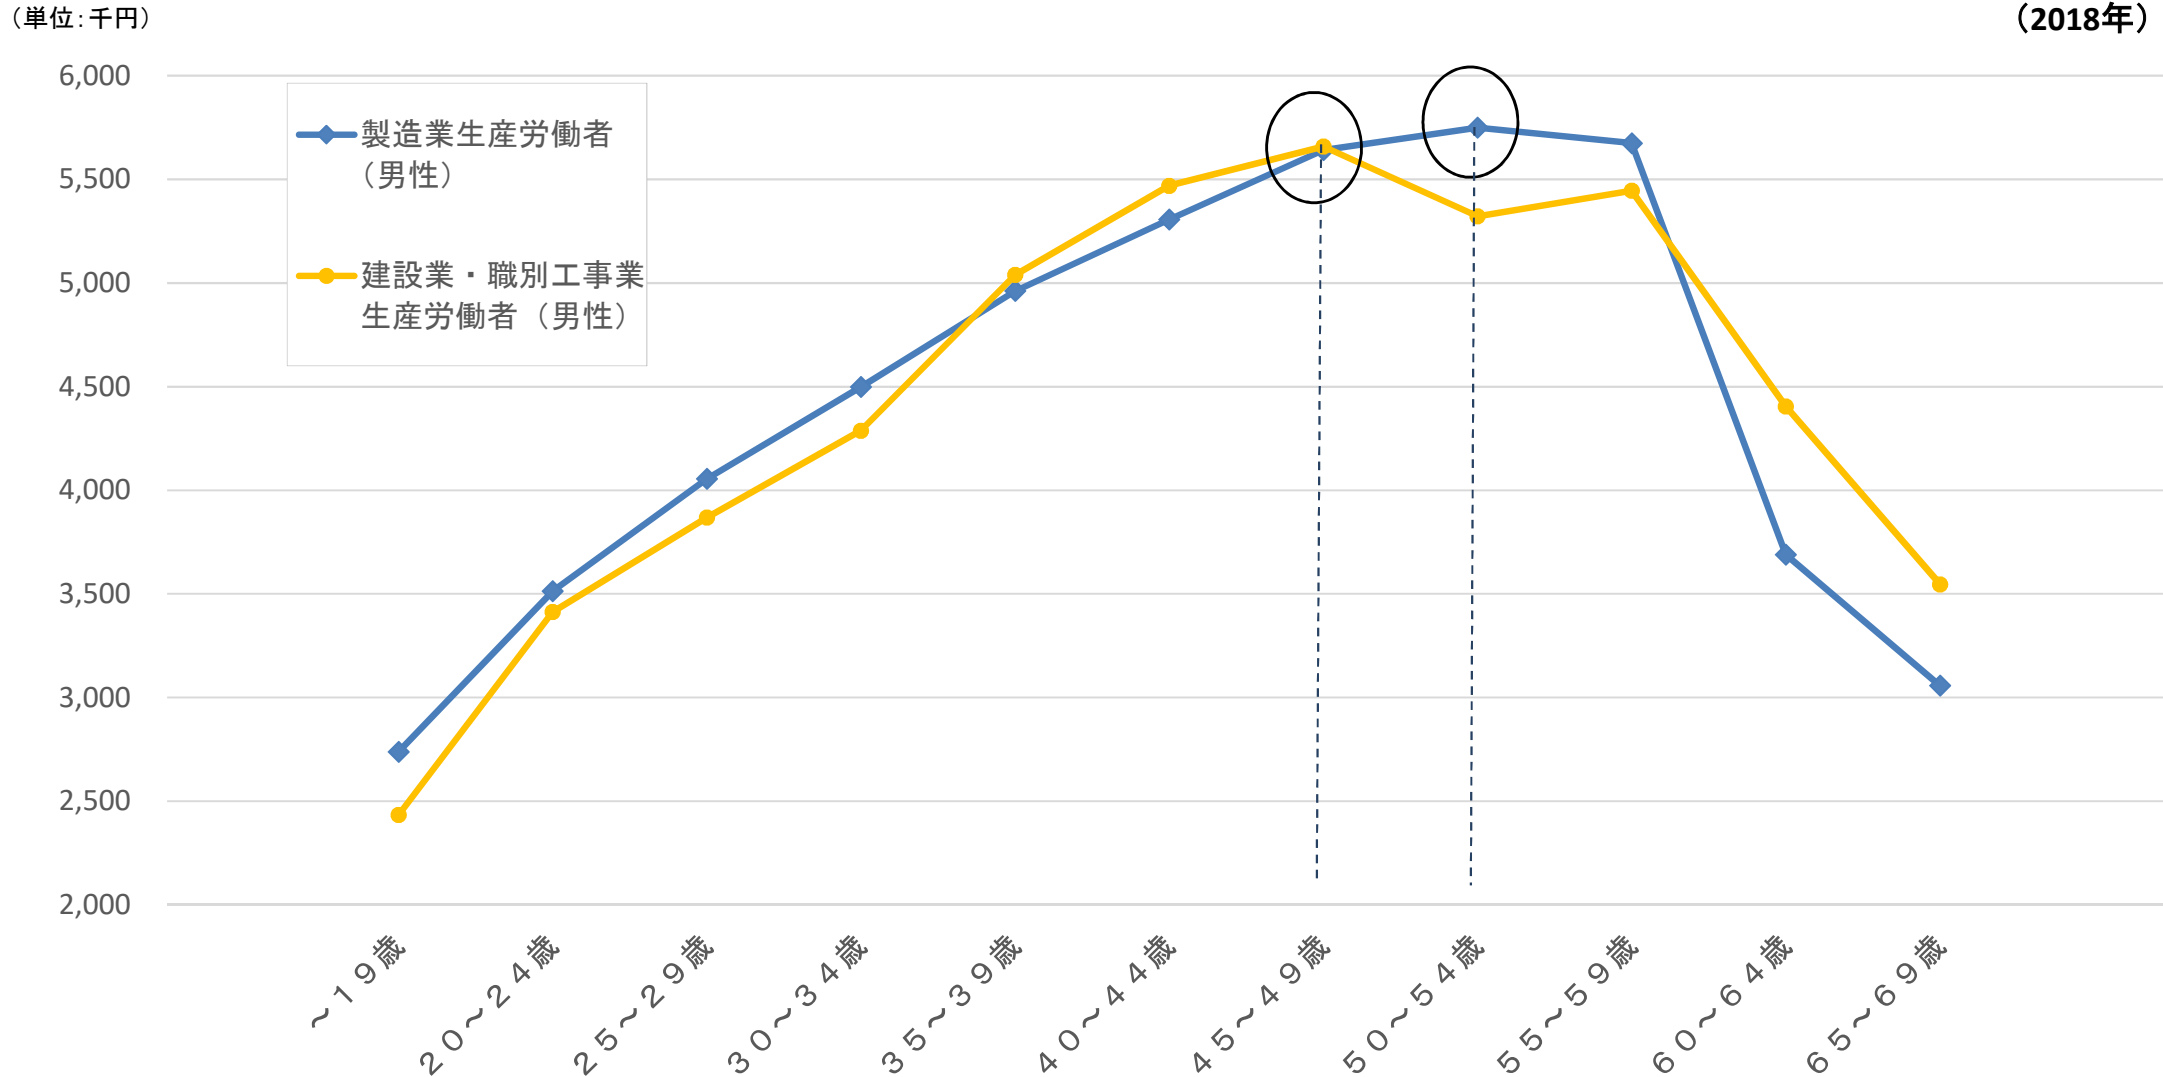

実労働時間及び出勤日数の推移（建設業と他産業の比較）

○年間の総実労働時間については、他産業と比べて300時間以上（約2割）長い状況です。また、10年程前と比べて、全産業では約110時間減少しているものの、建設業はほぼ横ばい（約29時間減少）で、大幅な改善は見られません。

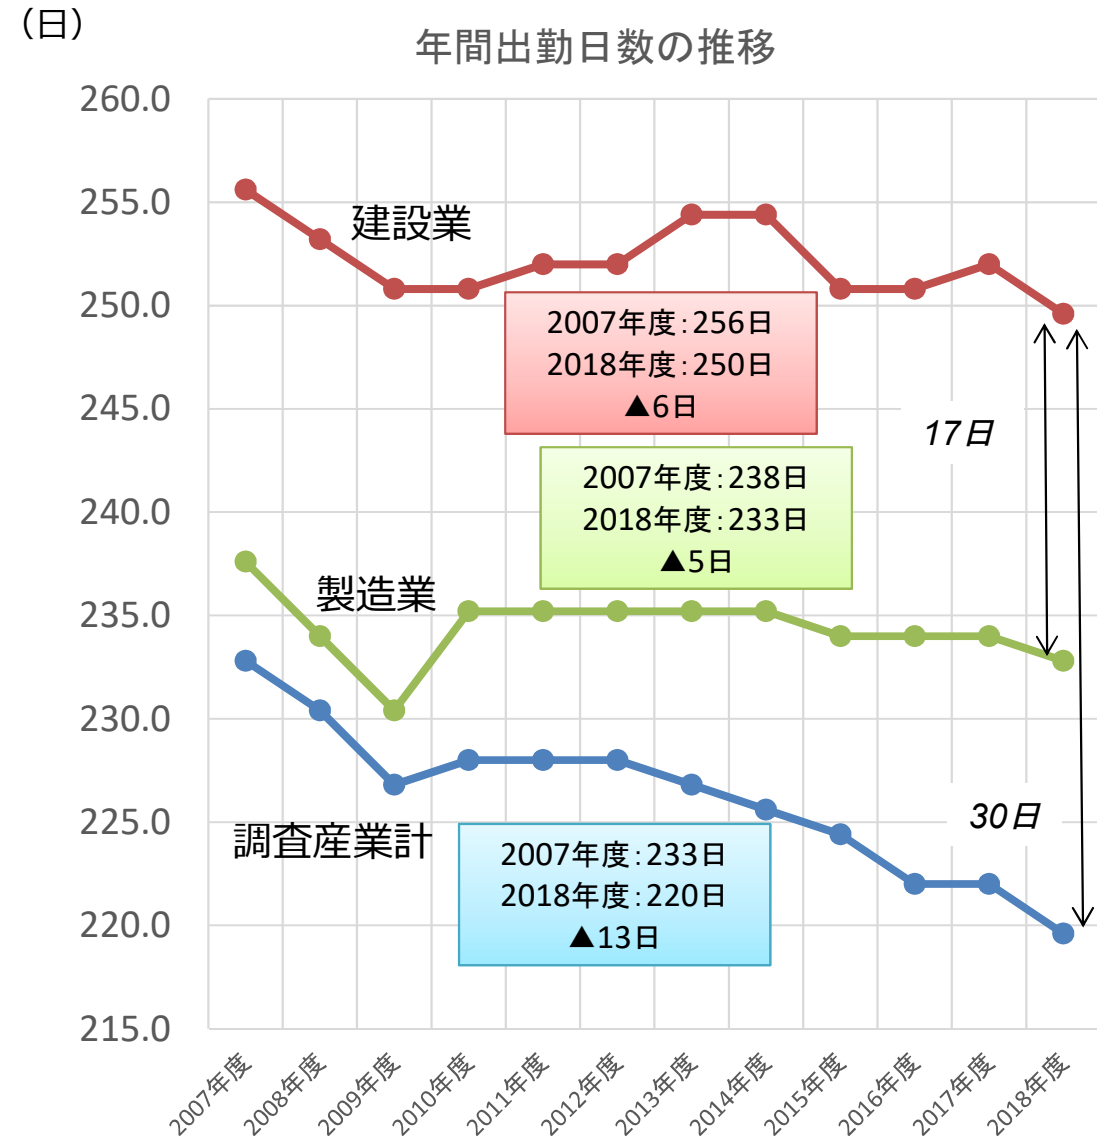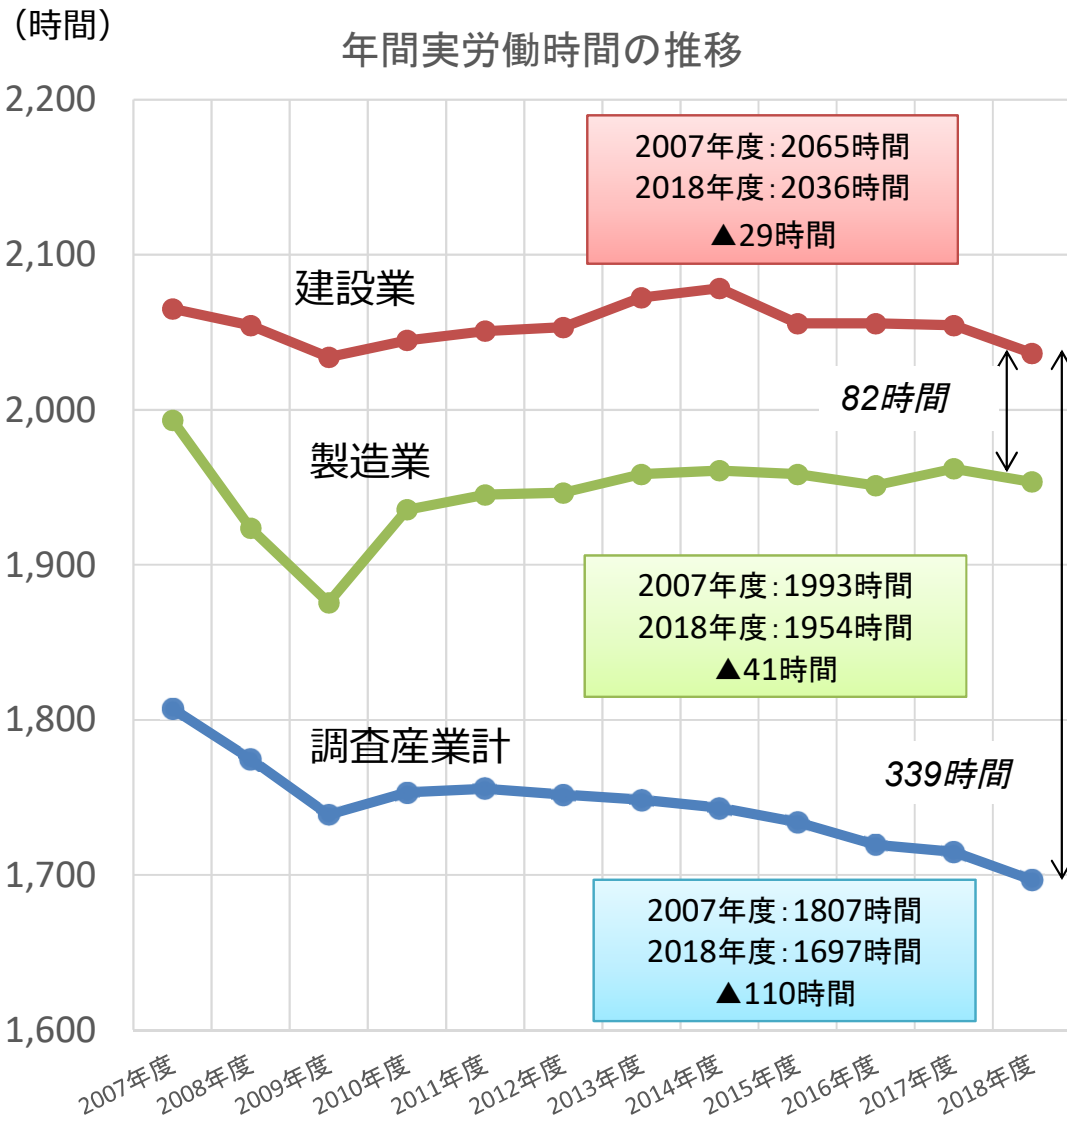


※ 厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成

- 建設工事全体では、技術者の約4割が4週4休以下で就業している状況です。
- 4週8休は1割程度に留まっており、休暇の取得が課題となっています。

現在4週8休は
1割程度

【建設業における休日の状況】

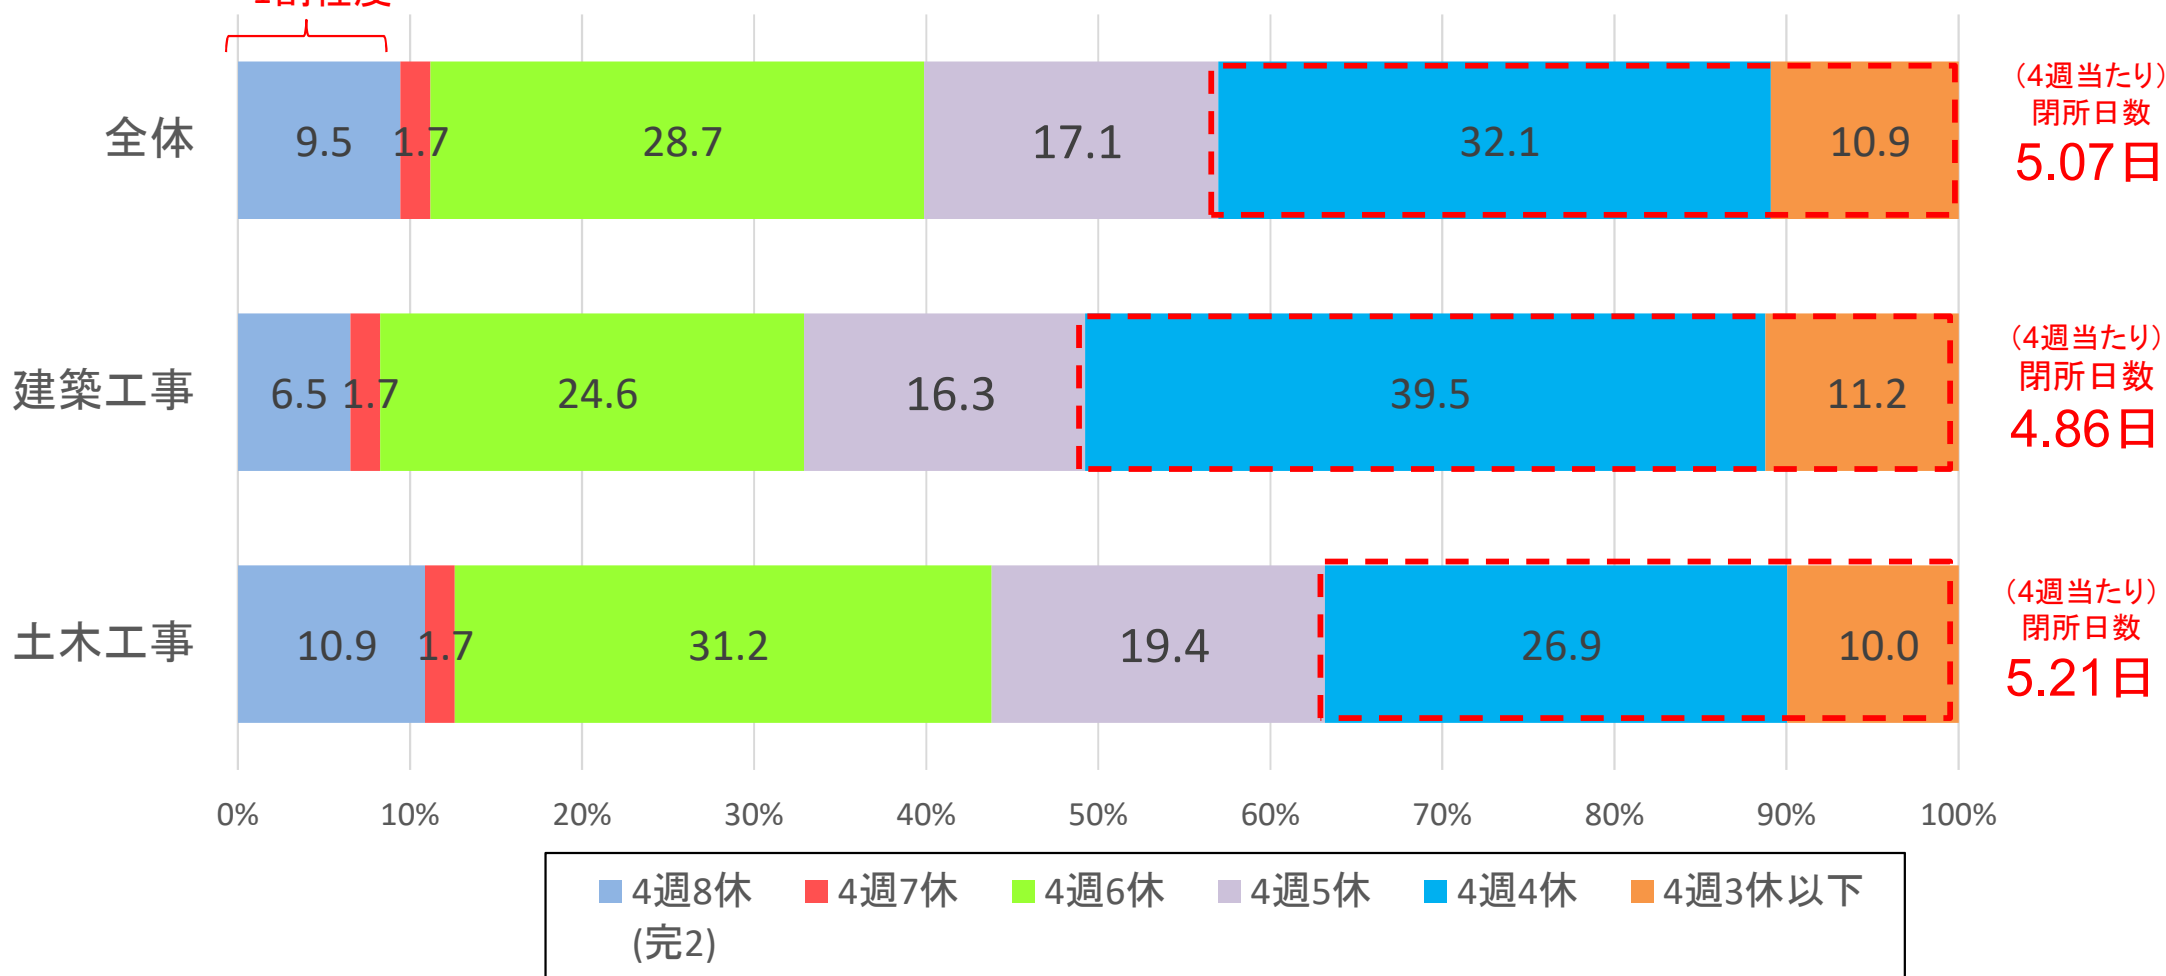

【注】
 ※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。
 ※日建協の組合員の技術者等を対象にアンケート調査。

平成26年に、公共工物品確法と建設業法・入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

※担い手3法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

新たな課題・引き続き取り組むべき課題

相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

**新たな課題に対応し、
5年間の成果をさらに充実する
新・担い手3法改正を検討**

担い手3法施行(H26)後5年間の成果

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め

品確法の改正 ～公共工事の発注者・受注者の基本的な責務～ <議員立法※>

○発注者の責務

- ・適正な工期設定（休日、準備期間等を考慮）
- ・**施工時期の平準化（債務負担行為や繰越明許費の活用等）**
- ・適切な設計変更（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

○受注者（下請含む）の責務

- ・適正な請負代金・工期での下請契約締結

働き方改革の推進

○工期の適正化

- ・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
- ・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
- ・**公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを努力義務化<入契法>**

○現場の処遇改善

- ・社会保険の加入を許可要件化
- ・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○発注者・受注者の責務

- ・情報通信技術の活用等による生産性向上

生産性向上への取組

○技術者に関する規制の合理化

- ・監理技術者：補佐する者(技士補)を配置する場合、兼任を容認
- ・主任技術者(下請)：一定の要件を満たす場合は配置不要

○発注者の責務

- ・緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等の適切な選択
- ・災害協定の締結、発注者間の連携
- ・労災補償に必要な費用の予定価格への反映や、見積り徴収の活用

**災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保**

○災害時における建設業者団体の責務の追加

- ・建設業者と地方公共団体等との連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保

- ・経営管理責任者に関する規制を合理化
- ・建設業の許可に係る承継に関する規定を整備

○調査・設計の品質確保

- ・「公共工事に関する測量、地質調査その他の調査及び設計」を、基本理念及び発注者・受注者の責務の各規定の対象に追加

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～ <政府提出法案>

【品確法】（発注者の責務として位置づけ）

- ・発注者の責務として、施工時期の平準化を図るため、繰越明許費・（国庫）債務負担行為の活用や中長期的な公共工事等の発注見通しの作成・公表を明示

○公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）（抄）

（発注者等の責務）

第七条 発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務（以下「発注関係事務」という。）を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない。

一～四 （略）

五 **地域における公共工事等の実施の時期の平準化を図るため**、計画的に発注を行うとともに、工期等が一年に満たない公共工事等についての**繰越明許費**（財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第十四条の三第二項に規定する繰越明許費又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百十三条第二項に規定する繰越明許費をいう。第七号において同じ。）又は財政法第十五条に規定する**国庫債務負担行為**若しくは地方自治法第二百十四条に規定する**債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定**、他の発注者との連携による**中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び公表**その他の必要な措置を講ずること。

六～九 （略）

2～5 （略）

【入契法】（入札契約適正化指針に従った取組の責務、要請）

- ・ 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の記載事項に平準化に関する事項を追加
- ・ 適正化指針に従った取組状況について報告を求め、公表
- ・ 取組を促進するため総務省と連名で自治体に対して要請

○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号）（抄）

（適正化指針の策定等）

第十七条（略）

2 適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。

一～四（略）

五 公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関する事

六・七（略）

3～7（略）

（適正化指針に基づく責務）

第十八条

各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（措置の状況の公表）

第十九条（略）

2 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。

3 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、毎年度、前2項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

（要請）

第二十条（略）

2 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。

○改正入契法の施行（令和元年9月1日）、改正入契法適正化指針の告示（令和元年10月21日）に合わせて、総務省と連名で通知を発出し、各地方公共団体において、施工時期の平準化を進めるよう要請しました。

入契法適正化指針（令和元年10月18日閣議決定）（抜粋）

公共工事の施工の時期の平準化が図られることは、年間を通じた工事量が安定することで公共工事に従事する者の処遇改善や、人材、資材、機材等の効率的な活用促進による建設業者の経営の健全化等に寄与し、ひいては公共工事の品質確保につながるものである。

このため、計画的に発注を行うとともに、他の発注者との連携による中長期的な公共工事の発注の見通しの作成及び公表のほか、工期が1年以上の公共工事のみならず工期が1年に満たない公共工事についての繰越明許費や債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期設定など次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずることにより、施工の時期の平準化を図るものとする。

- ①債務負担行為の活用
- ②柔軟な工期の設定（余裕期間制度の活用）
- ③速やかな繰越手続（繰越明許費の活用）
- ④積算の前倒し
- ⑤早期執行のための目標設定

入契法適正化指針施行通知（令和元年10月21日発出）（抜粋）

各地方公共団体におかれては、財政部局と発注部局が連携し議会の十分な理解及び支援の下、今後の予算編成において、施工時期の平準化を図るために必要な債務負担行為の限度額を設定するなど具体的な取組を進めること。

なお、今後、施工時期の平準化については、各地方公共団体における取組の「見える化」を通じて積極的な推進を図るため、平準化の進捗状況及び施策の取組状況について適時調査を行い、他の団体と比較できるよう公表するとともに、取組の進んでいない地方公共団体に対しては個別に詳細な調査や要因等の聴取を実施するなど、平準化に向けて積極的な取組を促進することとしているので留意されたい。
